

Professionelles Projektmanagement in der Praxis - Mit digitalen Unternehmensgründungsprojekten

Prof. Dr. Harald Wehnes

Veranstaltung 3 (27.04.2026)

- **Agiles Projektmanagement**
- **Scrum**
- **Sprint Planning**

Terminfindung (OSS-Tool) :
<https://dud-poll.inf.tu-dresden.de/>

Partner:

Servicezentrum
Forschung und
Technologietransfer
(SFT)


Innovations- & Gründerzentrum
WÜRZBURG

 **ZDI**
ZENTRUM
FÜR DIGITALE INNOVATIONEN
MAINFRANKEN

Information zu allen Vorlesungen

- **Wir starten jede Vorlesung auf die Minute pünktlich!**
- Bitte rechtzeitig einwählen.
- Videokamera bitte einschalten – Bei Gruppenarbeit immer einschalten!
- Mikrofone bitte stumm schalten, wenn vorgetragen wird
- Fragen / Anmerkungen / Rückmeldungen per Handzeichen-Symbol oder über den Chat
- **Die Vorlesung wird aufgezeichnet und auf WueCampus zur Verfügung gestellt (nur für Vorlesungsteilnehmer!)**
Die Aufzeichnungen beschränken sich in der Regel auf die Vorträge des Dozenten.
Studentische Vorträge werden für den Dozenten zur Benotung aufgezeichnet;
diese Vorträge werden nicht auf WueCampus gestellt.

Zeitplan

12:15 Organisatorisches

- Aufgabe 2: Ergebnisse der Teams 3 und 4
- Statusberichte (ca. 2 Minuten) der Projektmanager der restlichen Teams

12:45 Agiles Projektmanagement

13:00 Scrum

13:45 Pause



14:15 Sprint Planning

- Aufgabe 3

15:45 Ende

V2: Produkt/ IT-Dienstleistung wird aus der **Kunden- (Anwender-) Perspektive** betrachtet
*Wie nutzt ein potentieller Kunde (**Persona!**) Produkt bzw. Dienstleistung?*

Heute: Aus den Anwender-Anforderungen werden **Aufgaben für die Projektmitarbeiter** (Entwicklungsteam) abgeleitet: **Entwickler-Perspektive**
Wie werden diese Kundenanforderungen technisch realisiert?

Vortragstermine (Stand: 25.04.2026)



Name	Anzahl Mitglieder	20.04.	27.04.	04.05.	18.05. MVP1	01.06.	08.06.	15.06. MVP2	22.06.	29.06.	06.07.	13.07. Projektiade
1 - Mindocu	5	1			1			1		1		2
2 - Musikstadt Würzburg	5			1	1			1		1		2
3 - Mind League	7		1		1	1		1	1		1	2
4 - Patienten akte	6		1		1	1		1	1			2
5 - Funeral Compass	6			1	1		1	1			1	2
6 - Data Digitalization	6			1	1		1	1		1		2

Aufgabe 2: Lean Startup

Präsentationen der Lösung zur Aufgabe 2
durch den Product Owner von Team 3 und 4

1. Vervollständigen Sie Ihre **Persona(s)**
2. Vervollständigen Sie Ihre **User Story Map und MVP-Planung**
3. **Stimmen Sie die User Story Map und den MVP-Plan – möglichst noch in dieser Woche – mit Ihrem Auftraggeber ab und führen Sie ggf. Anpassungen durch**
4. Formulieren Sie **für die Persona von 1. alle User-Stories des MVP im User-Story-Format**
5. Führen Sie eine **Reflexion** der Prozesse und Ergebnisse durch
6. Erstellen Sie eine Präsentation **LSU-Team_x** (odp, pdf oder ppt) mit den wichtigsten Ergebnissen von 1.-5.

Upload auf WueCampus2 bis **25.04.2026/ 23:55: LSU-Team_x**

Projektmanager von Team 3 und 4 stellen die Ergebnisse am 27.04.2026 kompakt vor.
Gesamtdauer pro Vortrag: ca. **8 Minuten**

Statusberichte der anderen Teams

Aktuelle Projektmanager/Product Owner der anderen Teams geben kurzen Statusbericht (Reihenfolge: 1, 2, 5, 6)

- *Was hat das Team seit der letzten Vorlesung getan?*
- *Was plant das Team, bis zur nächsten Vorlesung zu tun?*
- *Was hat das Team bei der Arbeit behindert (Impediments)?*

Dauer: max. 2 Minuten



Quelle: <https://agilefellow.com/2016/06/30/daily-scrum-personas/>

Feedback zu den Lösungen von Aufgabe 2

😊 **User-Perspektive** kam in den User Story Maps meist gut heraus

😊 Gute Reflexionen

► Anmerkungen

- **Persona** wurden erstellt, um eine schlanke Lösung zu erarbeiten. Bitte diese **weitereverwenden**.
Für jede Zielgruppe nur eine Persona
- **User Story Map stellt die Lösung aus der Persona-Perspektive dar:** User Activities (EPICs) → User Tasks (Bedienung des Produktes) → User Stories (konkrete Anforderungen aus Nutzersicht)
- **MVP nicht zu umfangreich gestalten;** 1 – 3 User Stories (wichtigsten Features) des Produktes sollten grundsätzlich reichen.
- **Logische Verbindungen** zwischen User Activities und zugehörigen User Tasks sowie User Tasks und zugehörigen User Stories müssen erkennbar sein.
- User Stories des MVP im **User Story Format** beschreiben; die **Begründungen nicht vergessen**.
- Wichtig sind die **Diskussion und das gemeinsame Verständnis** – wie beim Project Canvas.
- **Wenn die User Story Map für alle klar ist, habt Ihr eine super Basis für den Start der Entwicklung**
- **User Story Map ist nicht der Plan für die technische Umsetzung!**

Unser Weg zum MVP

Projektdesign (mit Project Canvas)

PROJECT CANVAS

ESTELLT VON: _____

WO/ WANN: _____

ZWECK

Was ist das Ziel des Projekts (auch: Zweck, Intention)?
Wozu ist das Projekt wichtig und notwendig – und für wen?
Inwiefern wird das Projekt die Zukunft verändern – und für wen?

BUDGET

Wie viel Geld ist verfügbar?
Wie flexibel ist der Finanzrahmen?
Wie viel Geld wird benötigt für:
... das neue Produkt/Service?
... die notwendigen Ressourcen?

TEAM

Wer soll dabei sein?
Wer ist:
... im Kernteam?
... im erweiterten Team?
... externer Partner?
... Projektleiter?

UMFELD

Welche Faktoren schaffen (negatives, bedingungs, Menschen) wider auf das Projekt?
... die Konkurrenz?
... die Technologie?
... die Legalität?

ETAPPENZIELE

Welche Meilensteine werden Anzeichen zum Fortschritt?
Gibt es Termine für:
... Teil- und Zwischenabgabungen?
... sich- und messbare Erfolge?
... richtungsweisende Entscheidungen?

QUALITÄT

Was macht die Umsetzung wirklich glücklich/begleitend auf:
... das Wesen des Projekts?
... die Umsetzung, auf dem Weg dorthin?
Wie werden die Umsetzung im Projekt mitbestimmen und informieren werden?

ERGEBNIS

Was genau soll am Ende des Projekts an die Kunden geliefert werden?
Was ist es ein Ergebnis, ist es:
... ein neues Produkt?
... ein neues Service?
... neues Wissen (Informations)?

KUNDE

Wer ist Kunde des Projekts, d.h. wer sind die Menschen, die:
... das Projekt nutzen & bewerten (Sponsoring)?
... das Projekt/Produkt erhalten (Empfänger)?
... das Projekt/Produkt (Sponsoring)?
Bei mehreren Personen:
... die wichtigsten Personen?

RESSOURCEN

Was wird benötigt an:
... Arbeitskräften (inkl. Software)?
... Material?
... Hardware und Modulen?
... Projektkoordinatoren?
... Ansprechpartner (inkl. IT/Verwaltung)?

RISIKEN + CHANCEN

Welche unvorhersehbaren Ereignisse werden im Falle eines Scheiterns, das Projekt/Produkt:
... gefährden?
... befeuern?
Das Projekt/Produkt und benötigten Ressourcen sind die größten Herausforderungen im Projekt/Produkt.

ZEIT

Wann startet das Projekt und/oder wann wird das Produkt/Produkt/Service benötigt?
Wann ist das Projekt/Produkt/Service fertig?
Wie flexibel ist der Starttermin des Projekts? Wie flexibel ist der Starttermin des Produkts?


13.04.2026

Über die Lizenz: <https://www.projectcanvas.com/de>
(Das Projekt/Produkt/Service ist ein Copyright © 2024 der Uni WU)


This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. View a copy of this license at <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

MVP Design (über LSU / Story Map)

Basic structure of a Story Map

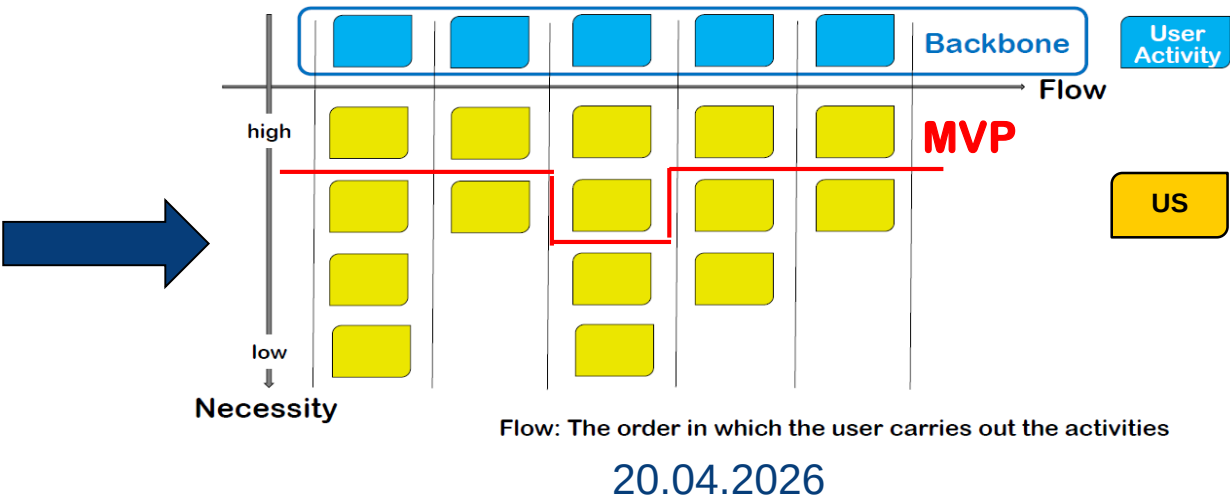

MVP Umsetzung (mit Scrum)

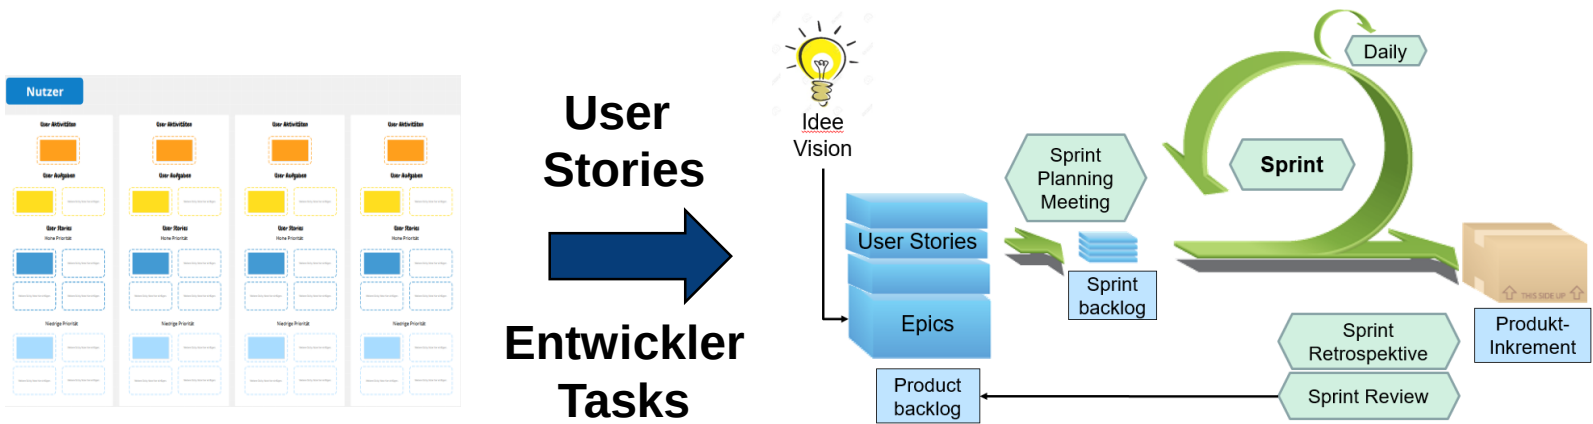

MVP
Sprint Review
Sprint Retrospektive
18.05.2026

AGILES PROJEKTMANAGEMENT

Manifesto for Agile Software Development

Agiles Manifest (<http://agilemanifesto.org>)

We are uncovering better ways of developing software by doing it and helping others do it.
Through this work we have come to value:

Individuals and interactions over processes and tools
Working software over comprehensive documentation
Customer collaboration over contract negotiation
Responding to change over following a plan

That is, while there is value in the items on the right, we value the items on the left more.

Kent Beck
Mike Beedle
Arie van Bennekum
Alistair Cockburn
Ward Cunningham
Martin Fowler

James Grenning
Jim Highsmith
Andrew Hunt
Ron Jeffries
Jon Kern
Brian Marick

Robert C. Martin
Steve Mellor
Ken Schwaber
Jeff Sutherland
Dave Thomas
2001

Agile Rap



<https://www.youtube.com/watch?v=xYKialLCQXI>

Agiles Manifest (2001): 4 Werte



Kent Beck, Mike Beedle, Arie van Bennekum, Alistair Cockburn, Ward Cunningham, Martin Fowler, James Grenning, Jim Highsmith, Andrew Hunt, Ron Jeffries, Jon Kern, Brian Marick, Robert C. Martin, Steve Mellor, Ken Schwaber, Jeff Sutherland, Dave Thomas

Quelle: www.agilemanifesto.org

12 Agile Prinzipien konkretisieren die Werte in Bezug auf die tägliche Arbeit

1. Zufriedenstellung des Kunden durch **frühe und kontinuierliche Auslieferung**
2. Agile Prozesse **nutzen Veränderungen** (selbst spät in der Entwicklung) zum Wettbewerbsvorteil des Kunden.
3. Lieferung von **fertigen Ergebnissen** in regelmäßigen, bevorzugt kurzen Zeitspannen (wenige Wochen oder Monate).
4. Nahezu tägliche **Zusammenarbeit von fachlichen Experten und Entwicklern** während des Projektes.
5. Bereitstellung des Umfeldes und der **Unterstützung**, welche von motivierten Individuen für die Aufgabenerfüllung benötigt wird.
6. Informationsübermittlung nach Möglichkeit im **Gespräch** von Angesicht zu Angesicht.

Quelle: www.agilemanifesto.org

12 Agile Prinzipien konkretisieren die Werte in Bezug auf die tägliche Arbeit

7. Als wichtigstes Fortschrittsmaß gilt die **Funktionsfähigkeit des Produkts**.
8. Einhalten eines **gleichmäßigen Arbeitstempos** von Auftraggebern, Entwicklern und Benutzern für eine nachhaltige Entwicklung.
9. Ständiges Augenmerk auf **technische Exzellenz und gutes Design**.
10. **Einfachheit** ist essenziell (KISS-Prinzip).
11. **Selbstorganisation** der Teams bei Planung und Umsetzung.
12. **Selbstreflexion** des eigenen Teamverhaltens zur Anpassung mit dem Ziel der Effizienzsteigerung.

Quelle: www.agilemanifesto.org

Irrtümer zu agilem Projektmanagement



Quelle: <http://dilbert.com/strip/2007-11-26>

- **(Keine) Planung:** Es werden **wiederholt Planungen** durchgeführt (nach jedem Iterationsschritt). Dabei fließen die bereits erzielten Erkenntnisse ein
- **(Keine) Dokumentation:** Auch im agilen Projektmanagement muss dokumentiert werden; Umfang und Menge konzentrieren sich dabei auf das absolut Notwendige

Überblick: Agile Vorgehensmodelle

Agile Werte und Prinzipien

Agiles Manifest:

4 Werte

12 Prinzipien

Agile Methoden


**Scrum, Kanban,
ScrumBan,
Lean Startup,
Design Thinking,
DevOps, XP, Crystal,
Lean PM**

**Agile Skalierung
(SAFe, LeSS etc.)**

Agile Praktiken

**Product Backlog,
User Stories, Epics,
Story Points,
Planning Poker, Time
Boxing, Kanban
Board, Daily,
Sprints, Persona,
Selbstorganisation,
WiP-Limit, ...**


Agiler Baum

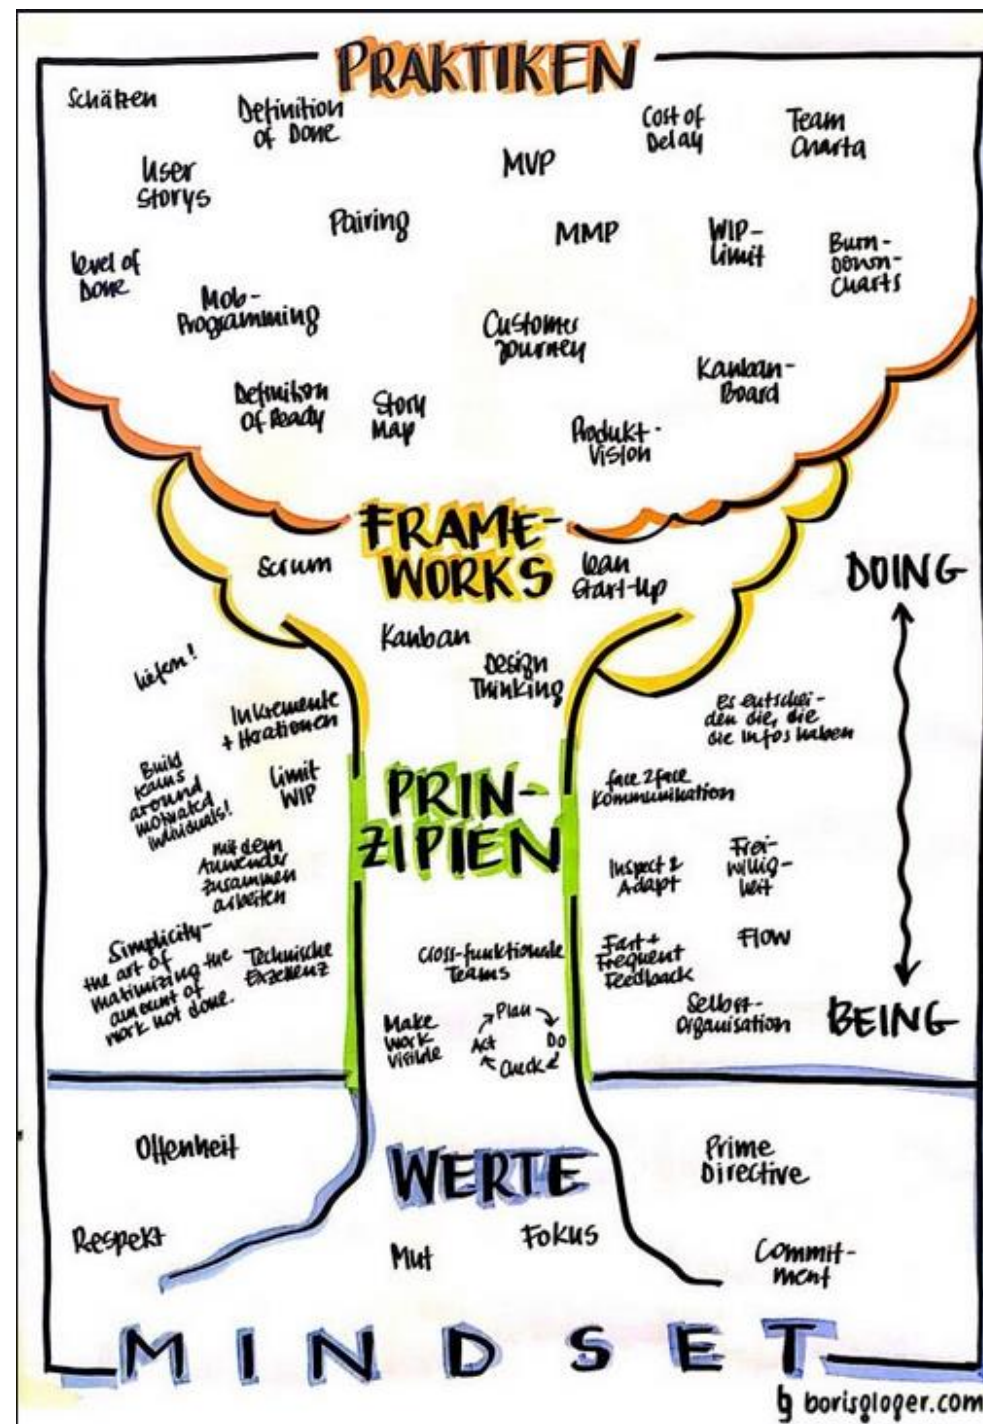

Bedeutung agiler Methoden in der Praxis

Bedeutung einzelner agiler Ansätze auf Teamebene

Bedeutung agiler Ansätze im eigenen Tätigkeitsbereich für agile Anwender (1/2)

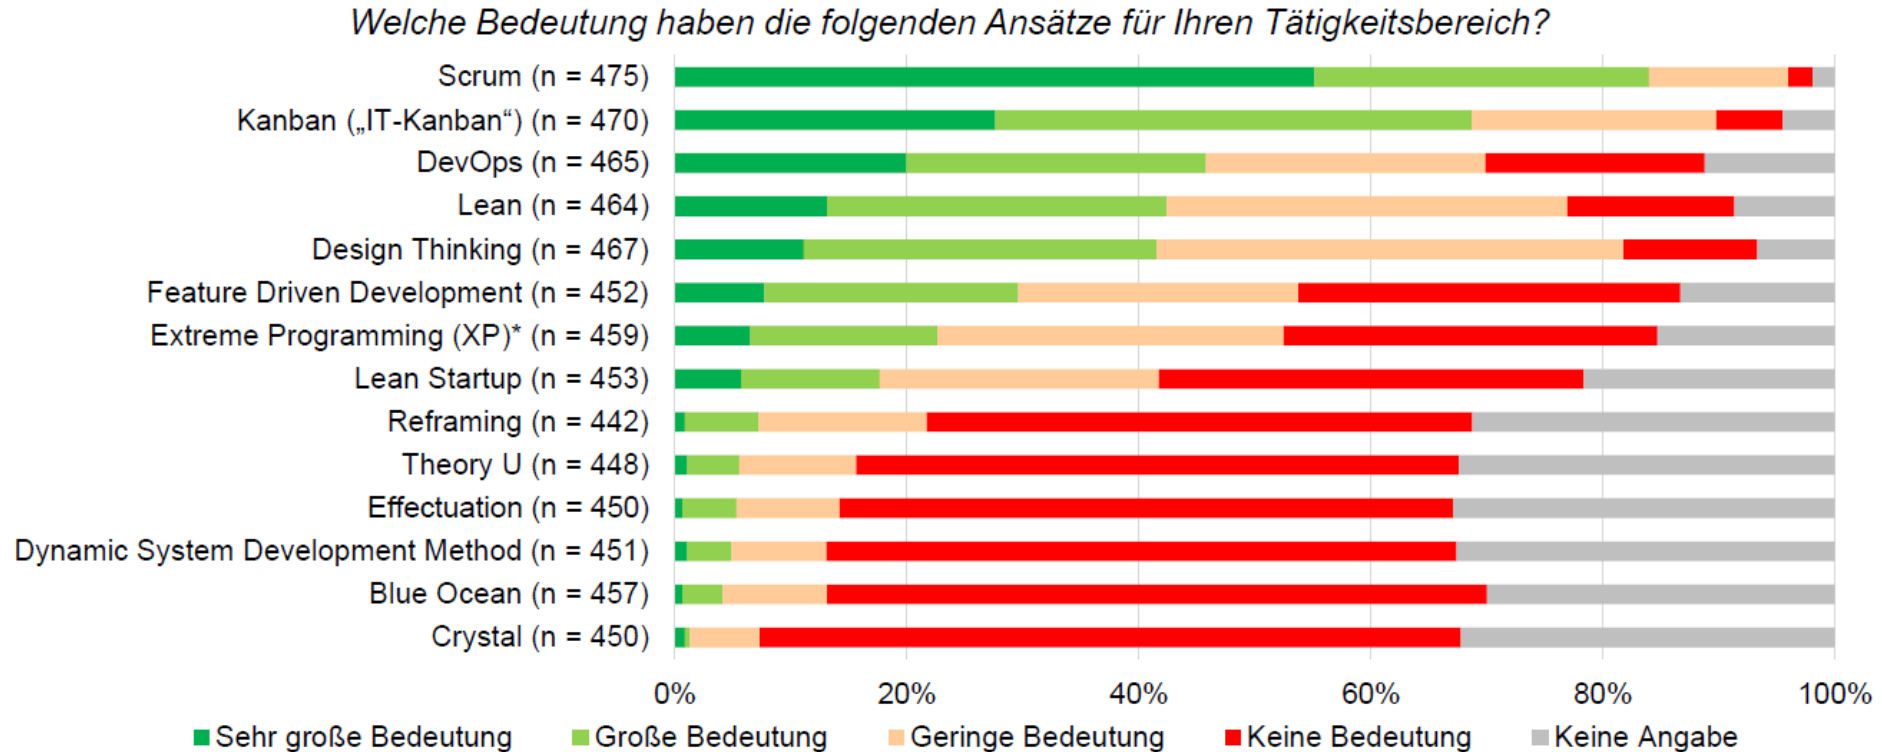

* (inkl. Test Driven Development und Pair Programming)

** Die Ansätze wurden nach den Bewertungen „Sehr große Bedeutung“ und „Große Bedeutung“ sortiert.

Single Choice

Antworten aus den Gruppen „Durchgängig agil“, „Hybrid“ und „Selektiv“


Nutzungsgrad agiler Praktiken

Anwendungsformen

Nutzung agiler Praktiken



Welche agilen Praktiken wenden Sie an?

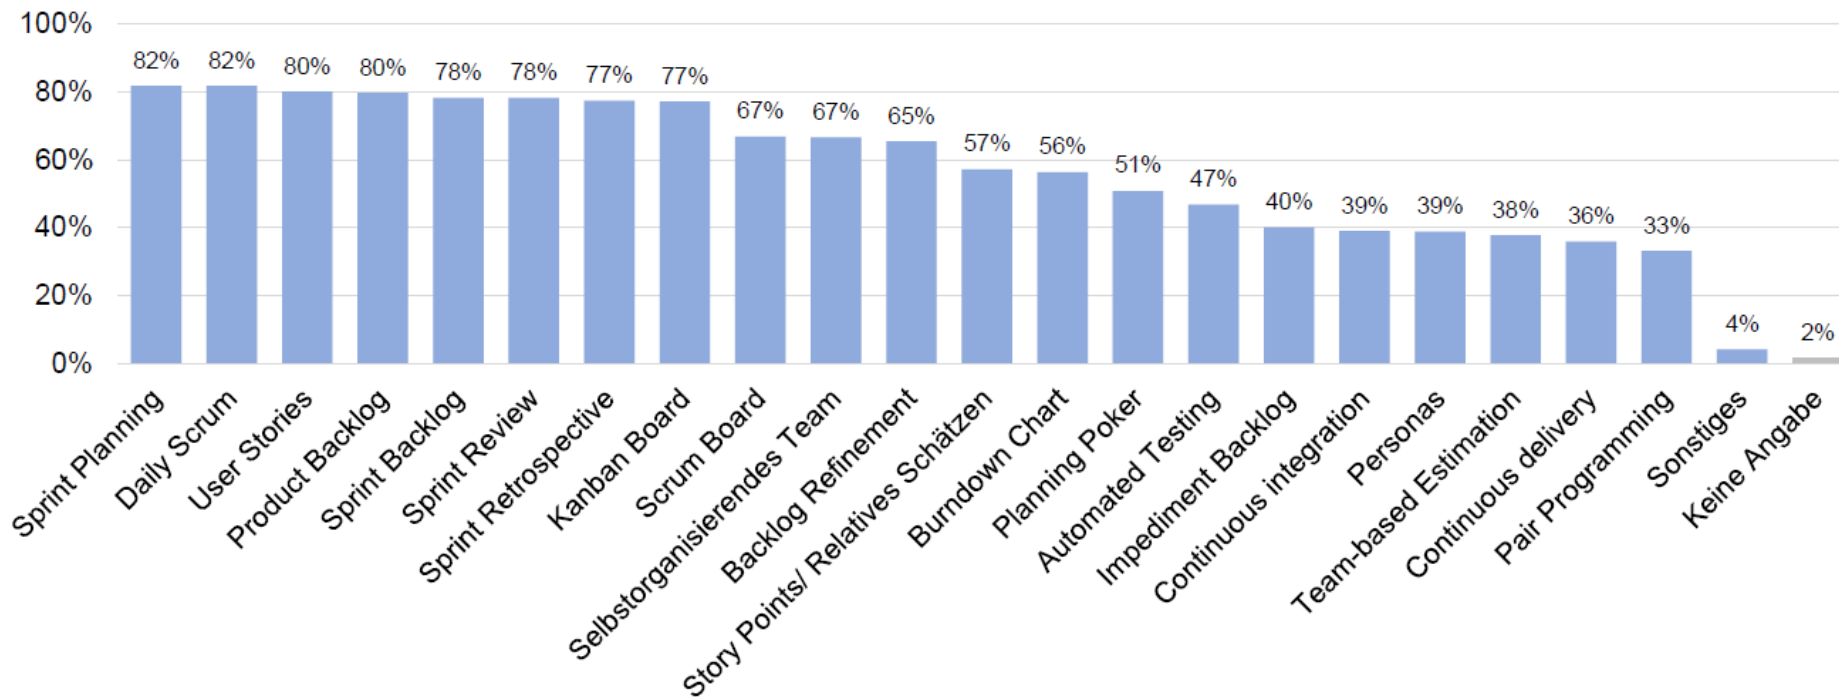

Multiple Choice, n = 476

Antworten aus den Gruppen „Durchgängig agil“, „Hybrid“ und „Selektiv“

Scrum im Überblick





Gedränge = Enge Zusammenarbeit im Team

Referenzdokumente



Schwaber, Ken; Sutherland, Jeff: Scrum Guide von 11/2020

Free Download: <https://scrumguides.org/download.html>

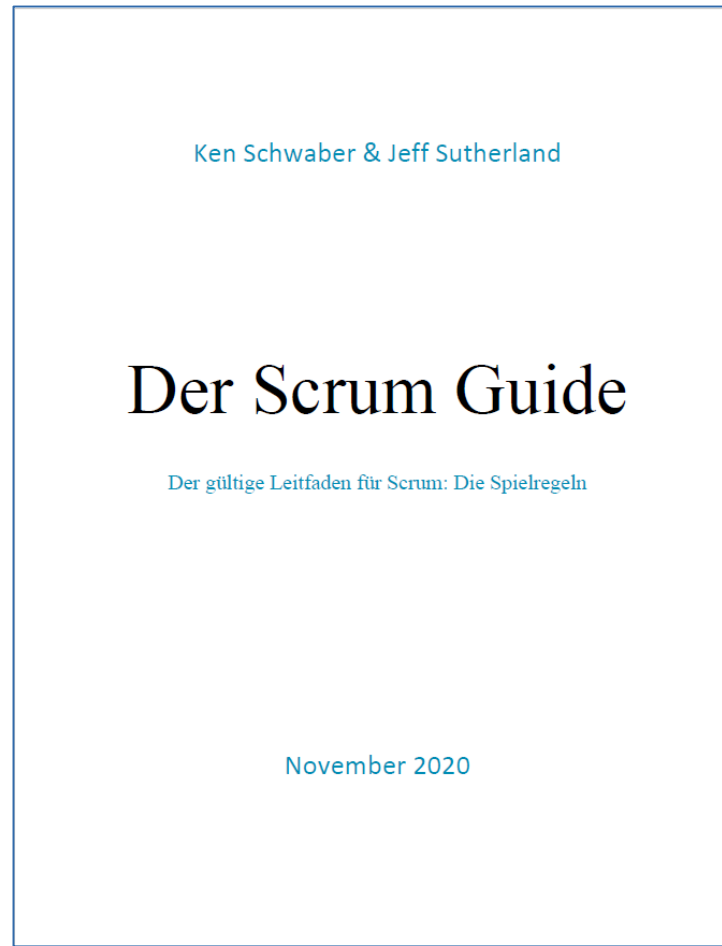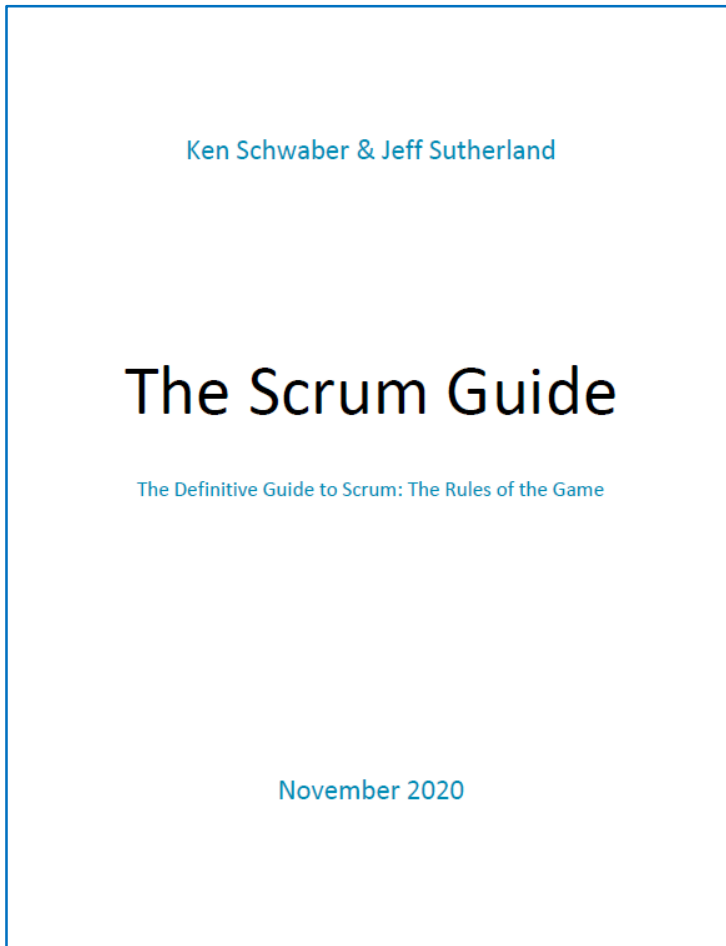

Erläuterung der englischen Begriffe → Glossar des deutschen Scrum Guides


Grundprinzip von Scrum passt auf einen Bierdeckel

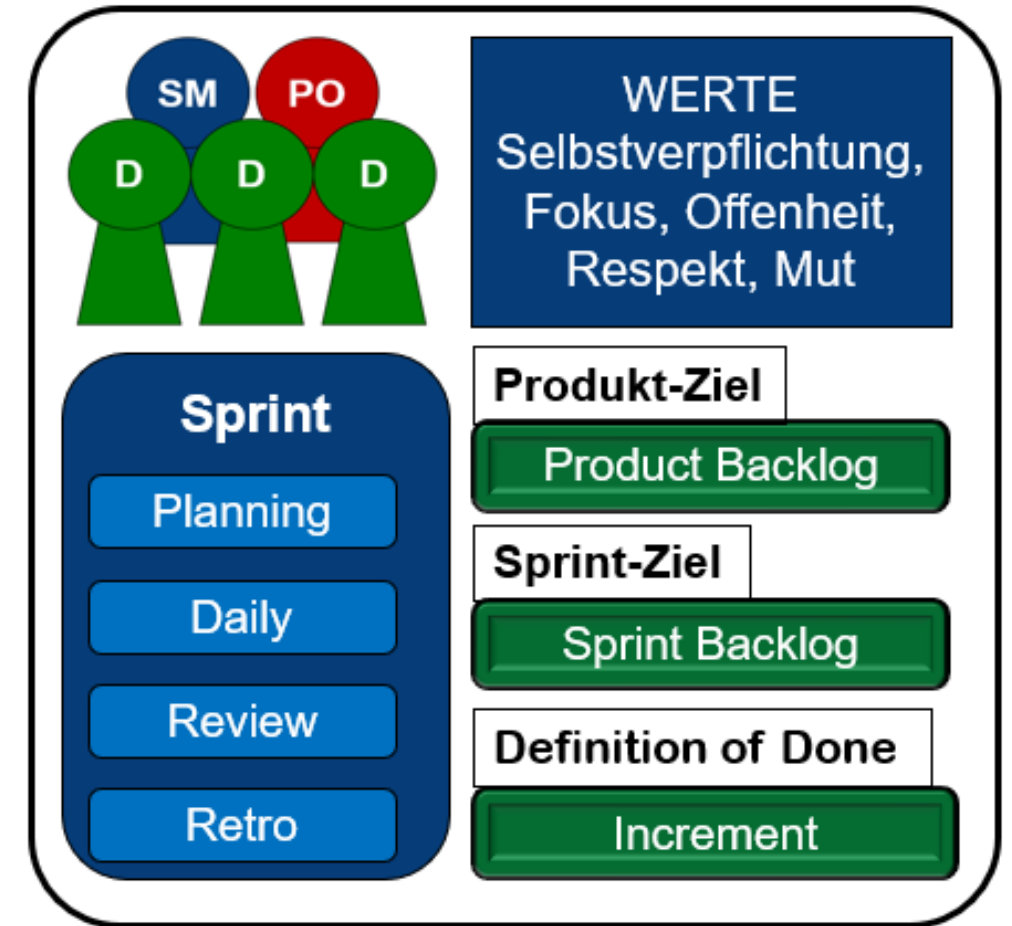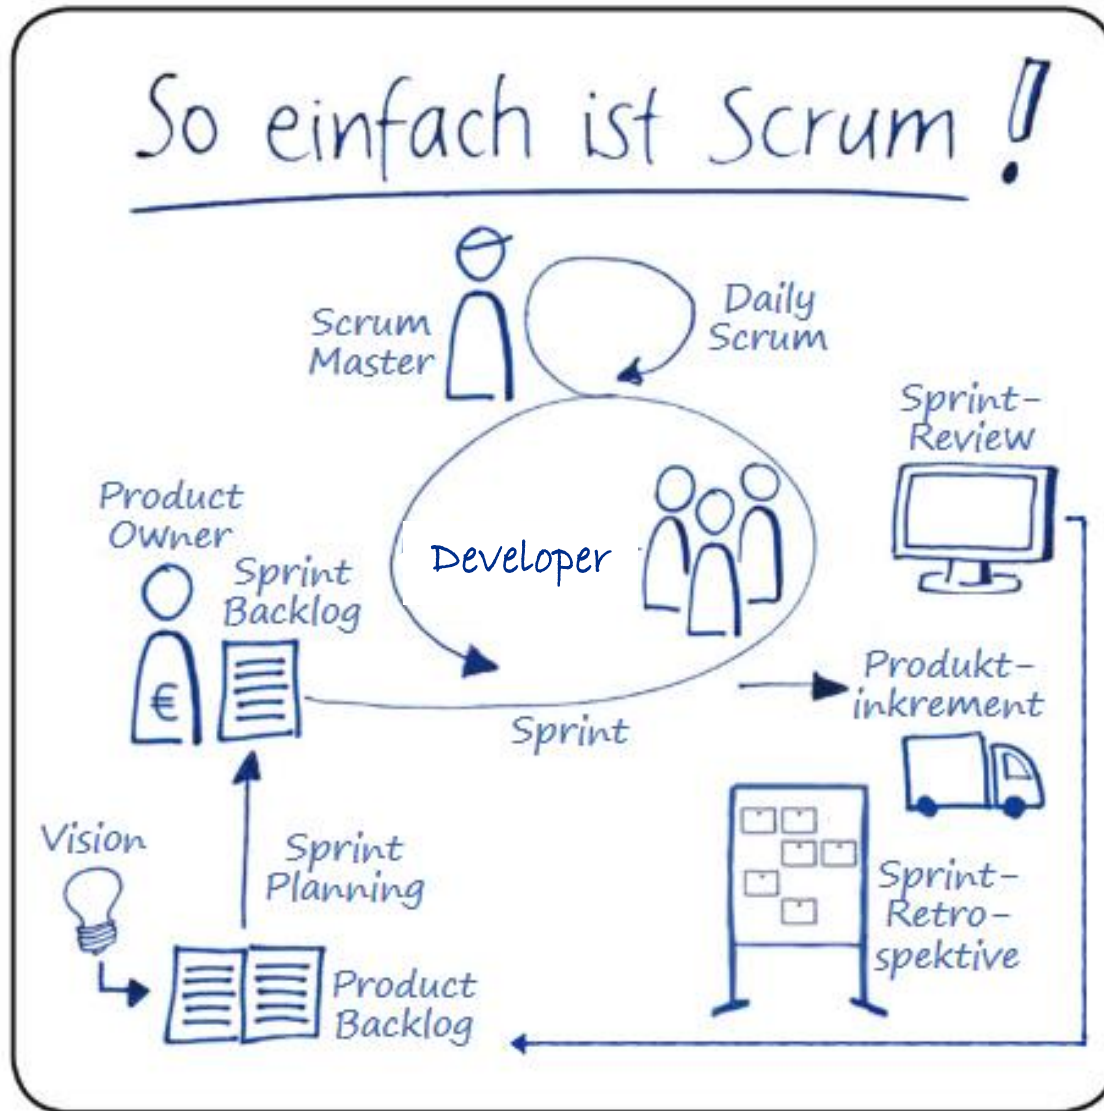

Quelle: <https://www.dpunkt.de/buecher/12551/-scrum-auf-dem-bierdeckel-erkl%C3%A4rt.html>


Scrum: Leichtgewichtiges, kostenloses Rahmenwerk

- ▶ **Intention:** Das Rahmenwerk soll Menschen, Teams und Organisationen helfen, durch adaptive Lösungen für komplexe Probleme Wert zu generieren
- ▶ **Einsatzbereich:** Geht über die Software-Entwicklung hinaus. Komplexe Arbeit wird von Entwicklern, Forschern, Analysten, Wissenschaftlern und anderen Spezialisten getan. Wer vom Einsatz von Scrum profitiert, soll sich angesprochen fühlen. (EduScrum)
- ▶ Ein **Scrum Master**  sorgt dafür, dass
 1. ein **Product Owner**  die Anwender-Anforderungen in ein Product Backlog einordnet
 2. das **Scrum-Team** eine Auswahl der Arbeit vornimmt und während eines Sprints ein wertvolles Increment erzeugt
 3. das **Scrum-Team** und seine Stakeholder die Ergebnisse begutachten und die Arbeit für den nächsten Sprint vorbereiten.
 4. Weiter mit 1.
- ▶ Umfang des Scrum-Regelwerks
 - 14 Seiten im Original
 - 19 Seiten dt. Version mit Glossar




Scrum-Theorie

- ▶ **Empirie:** Wissen wird aus Erfahrungen gewonnen und Entscheidungen werden auf der Grundlage von Beobachtungen getroffen
- ▶ **Lean Thinking:** Reduktion von Verschwendung, Fokussierung auf das Wesentliche
- ▶ **Iteratives und inkrementelles Vorgehen**
- ▶ **Scrum-Teams** müssen über alle Fähigkeiten und Fachkenntnisse verfügen, um die Arbeiten erledigen zu können
- ▶ Innerhalb eines umfassenden **Events (Sprint)** finden vier **Events (Sprint Planning, Daily Scrum, Sprint Review, Sprint Retrospective)** zur Überprüfung und Anpassung statt

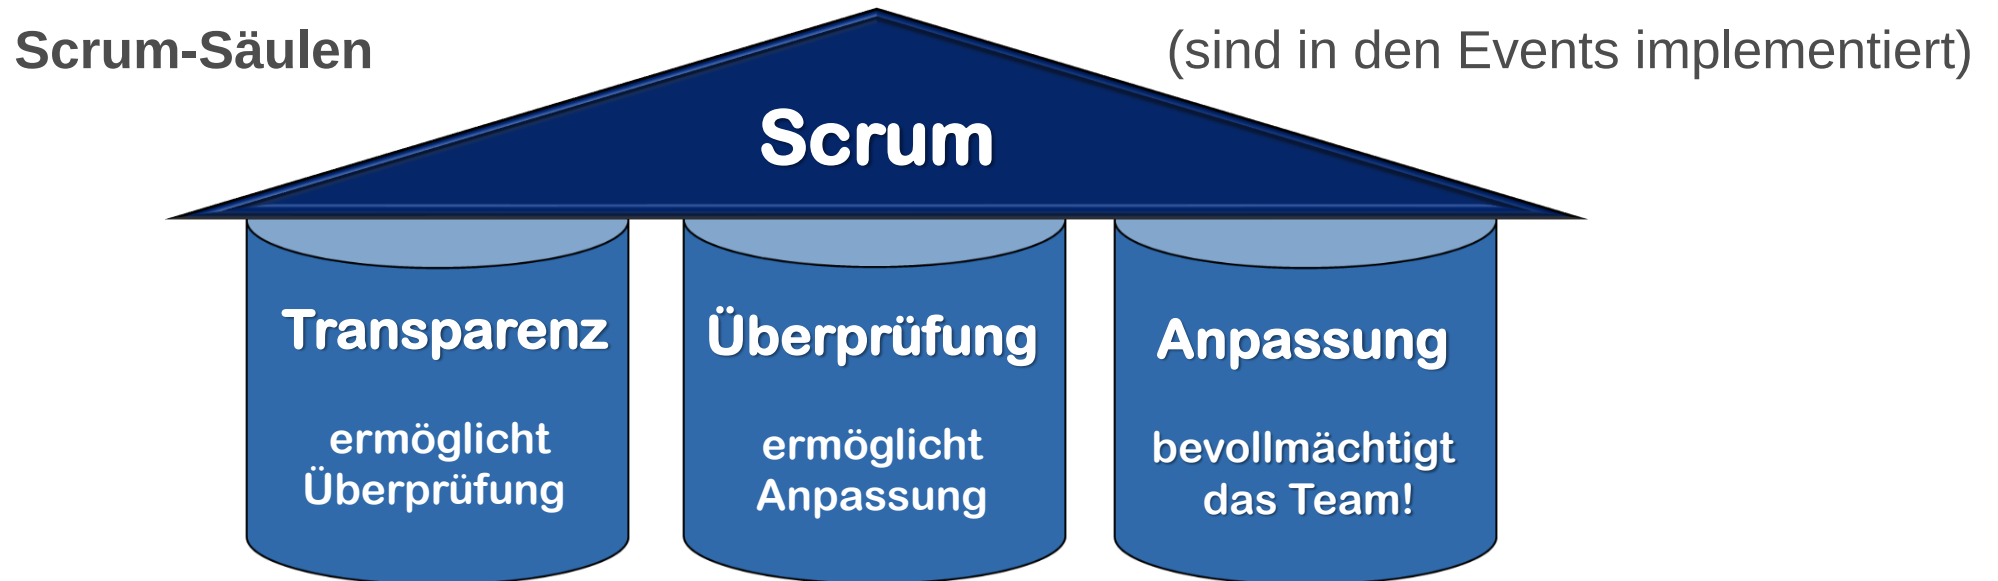

Scrum-Werte

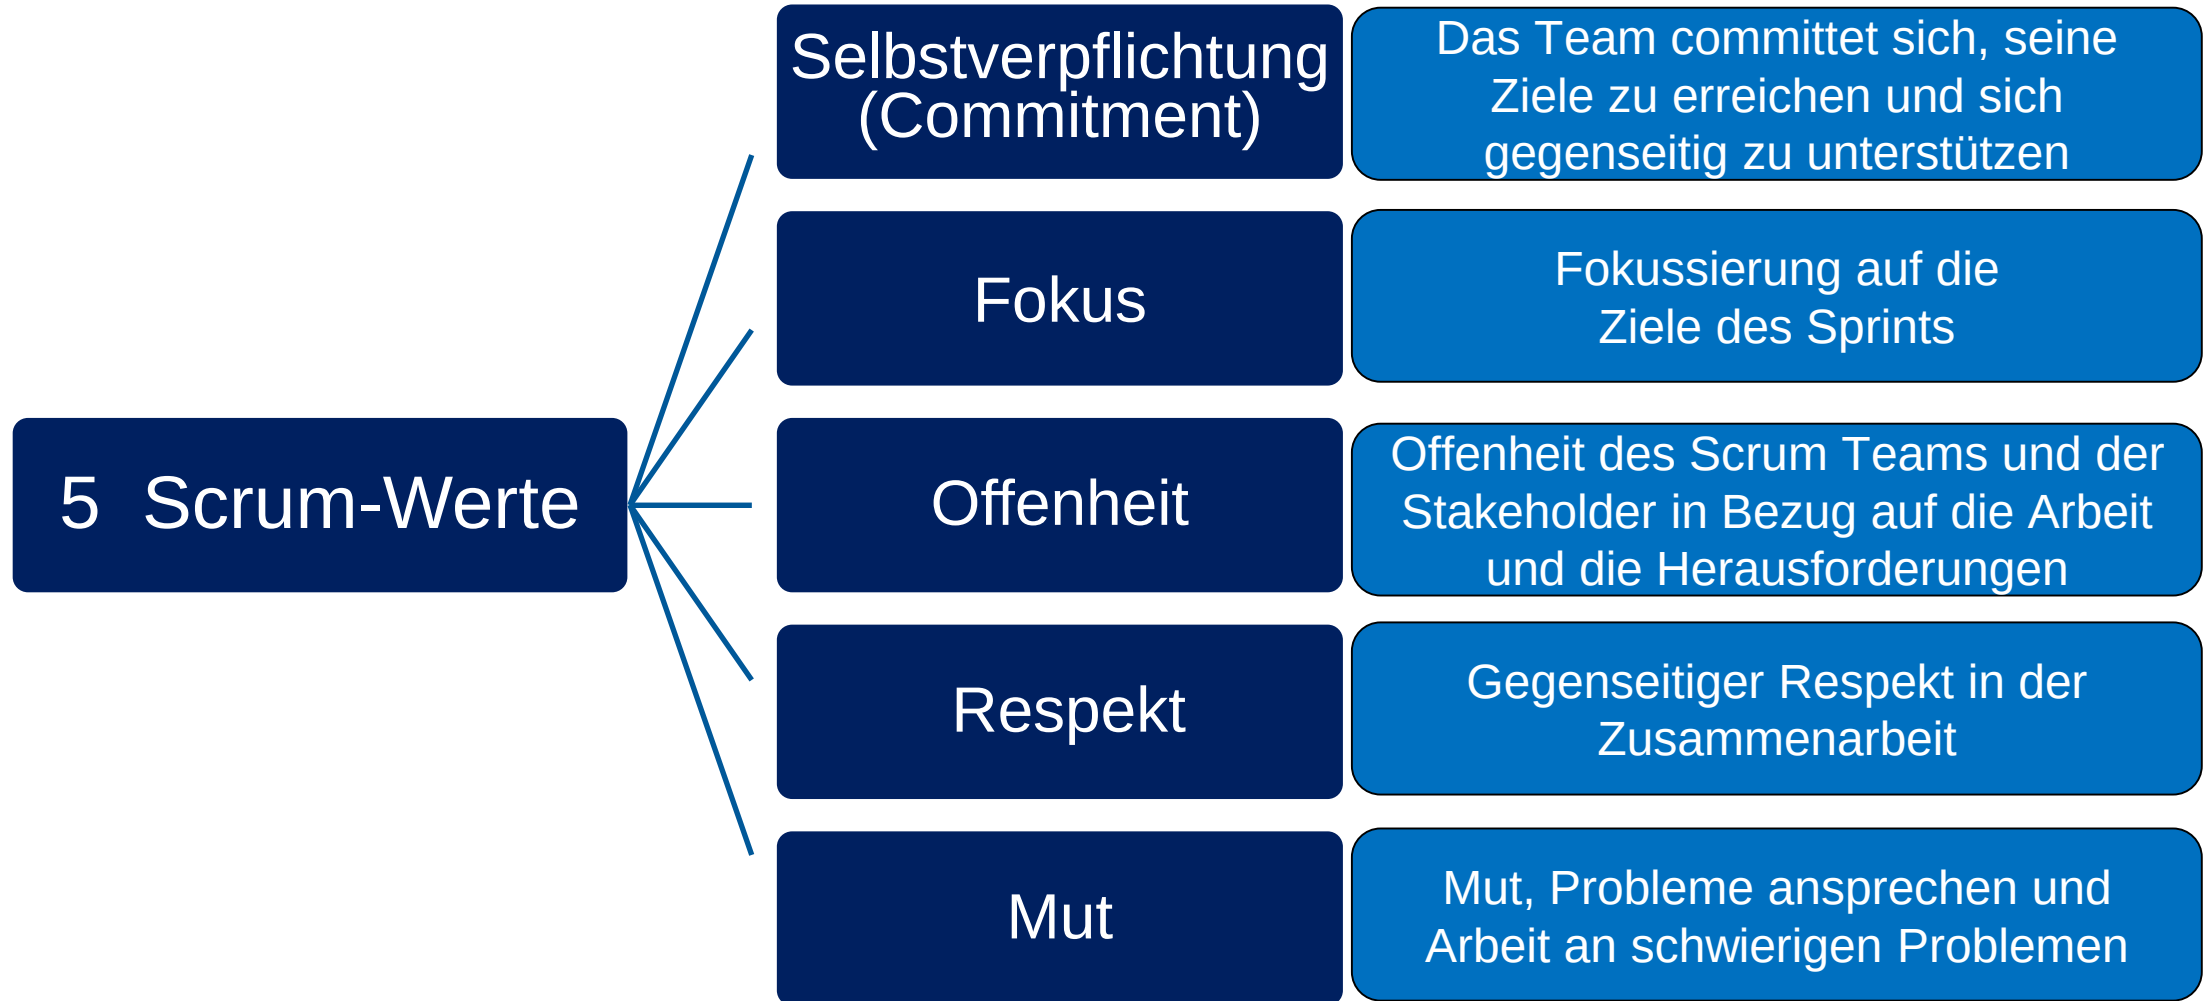


Smells Like Scrum Spirit



https://www.youtube.com/watch?v=gRWBw_p6-kQ

Scrum Team

- ▶ **Kleines, interdisziplinäres Team** – 10 oder weniger Personen
- ▶ Teammitglieder: **Scrum Master, Product Owner und Developer**
- ▶ Es konzentriert sich auf das **Produktziel**
- ▶ **Es managt sich selbst**, d.h. es entscheidet intern, wer was wann und wie macht
- ▶ Wenn Scrum Teams, die sich auf dasselbe Produkt beziehen, zu groß werden, findet eine Reorganisation in mehrere Teams statt. Sie haben einen **gemeinsamen Product Owner, ein gemeinsames Produktziel und ein gemeinsames Product Backlog**
- ▶ Das Scrum Team ist **umsetzungsverantwortlich** (responsible) für alle produktbezogenen Aktivitäten: Zusammenarbeit mit Stakeholdern, Verifikation, Wartung, Betrieb, Experimente, Forschung und Entwicklung u.ä.
- ▶ Das Scrum Team ist **ergebnisverantwortlich** (accountable), in jedem Sprint ein wertvolles, nützliches Increment zu schaffen. Dabei gibt es drei spezifische Ergebnisverantwortlichkeiten innerhalb des Scrum Teams.



Ergebnisverantwortlichkeiten

► **Product Owner** (Einzelperson)

- Maximierung des Wertes des Produktes aus der Arbeit des Scrum Teams
- Effektives Product Backlog Management (Management der Anforderungen)



► **Scrum Master** (Diener, Führungskraft, Coach)


- Einführung und korrekter Einsatz von Scrum
- Effektivität des Scrum Teams.

Das Scrum Team wird in die Lage versetzt, seine Praktiken innerhalb des Scrum Rahmenwerks zu verbessern




► **Developer**

- Plan für den Sprint erstellen, das Sprint Backlog
- Qualität durch die Einhaltung einer Definition of Done (DoD) sicherstellen
- Täglich den Plan zur Erreichung des Sprint-Ziels anpassen
- Sich wechselseitig als Experten zur Verantwortung ziehen



► **Scrum Team**

- Schaffung eines wertvollen, nützlichen Increments – in jedem Sprint



Besondere Aufgaben des Scrum Masters



- ▶ **Scrum Master dient dem Scrum Team** durch
 - **Coachen** der Teammitglieder in Selbstmanagement und interdisziplinärer Zusammenarbeit
 - Unterstützung bei der **Fokussierung** auf die Schaffung von hochwertigen Increments, die der Definition of Done entsprechen
 - **Beseitigung von Hindernissen** (impediments) für den Arbeitsfortschritt
 - **Sicherzustellen, dass alle Events von Scrum stattfinden**, positiv und produktiv sind und innerhalb der Timebox bleiben
- ▶ **Scrum Master dient dem Product Owner.** Er hilft u.a.
 - Bei der Suche nach Techniken zur effektiven Definition des Produkt-Ziels und beim Product-Backlog-Management
 - Dem Scrum Team, die Notwendigkeit klarer und präziser Product-Backlog-Einträge zu verstehen
 - Bei der Etablierung einer empirischen Produktplanung für ein komplexes Umfeld und
 - Fördert (facilitate) die Zusammenarbeit mit Stakeholdern nach Wunsch oder Bedarf
- ▶ **Scrum Master dient der Organisation**, u.a. durch
 - **Führen, beraten, schulen und coachen der Organisation beim Einsatz von Scrum**
 - Unterstützung von Mitarbeitenden und Stakeholdern, den Ansatz zu verstehen und anzuwenden
 - Barrieren zwischen Stakeholdern und Scrum Teams beseitigen

Hey, Scrum Master




<https://www.youtube.com/watch?v=9okokfMVvZc>

Rollenwechsel in den Teams:


Projektmanager → Product Owner & Scrum Master

- ▶ Bisherige Rollen gemäß traditionellem PM: Projektmanager, Teammitglieder
- ▶ Agile Vorgehensmodelle haben keine Rolle „Projektmanager“, da Selbstorganisation/Selbstmanagement der Teams

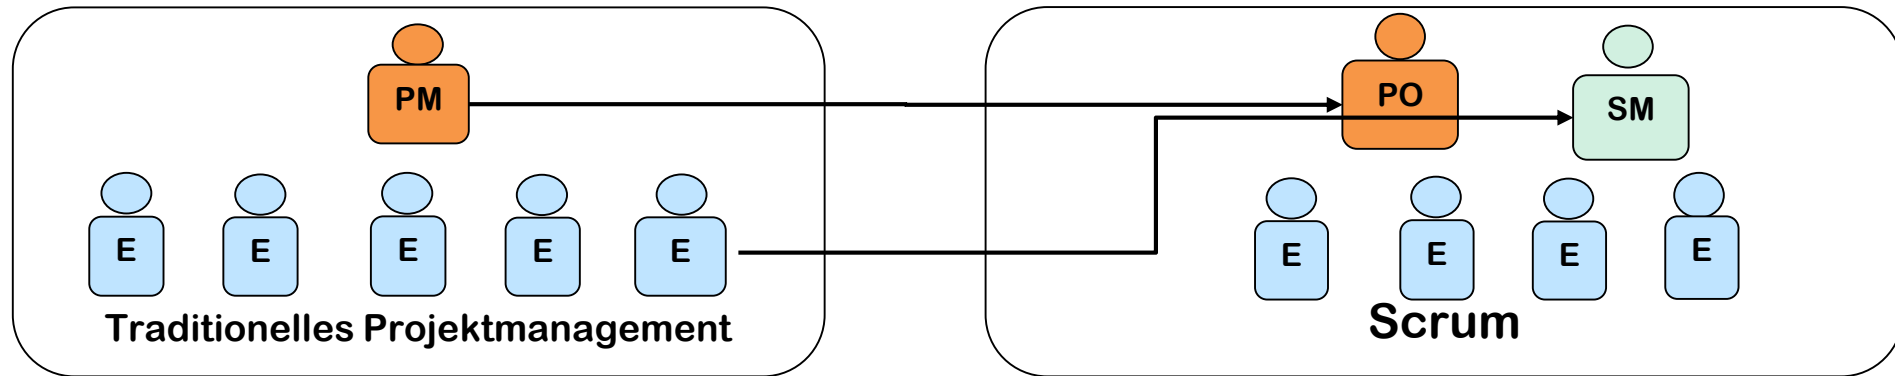

- ▶ **Neu: Scrum Rollen – werden weiterhin wechselnd besetzt**
 - **Product Owner:** verantwortlich für termingerechte Aufgabenerledigung und ggf. Präsentation von Projektergebnissen
 - **Scrum Master:** verantwortlich, dass im Rahmen der Projektarbeit die Scrum Prozesse und Regeln eingehalten werden
 - **Scrum-Team:** Alle arbeiten am Projekt, auch PO und SM

Scrum Prozess im Überblick

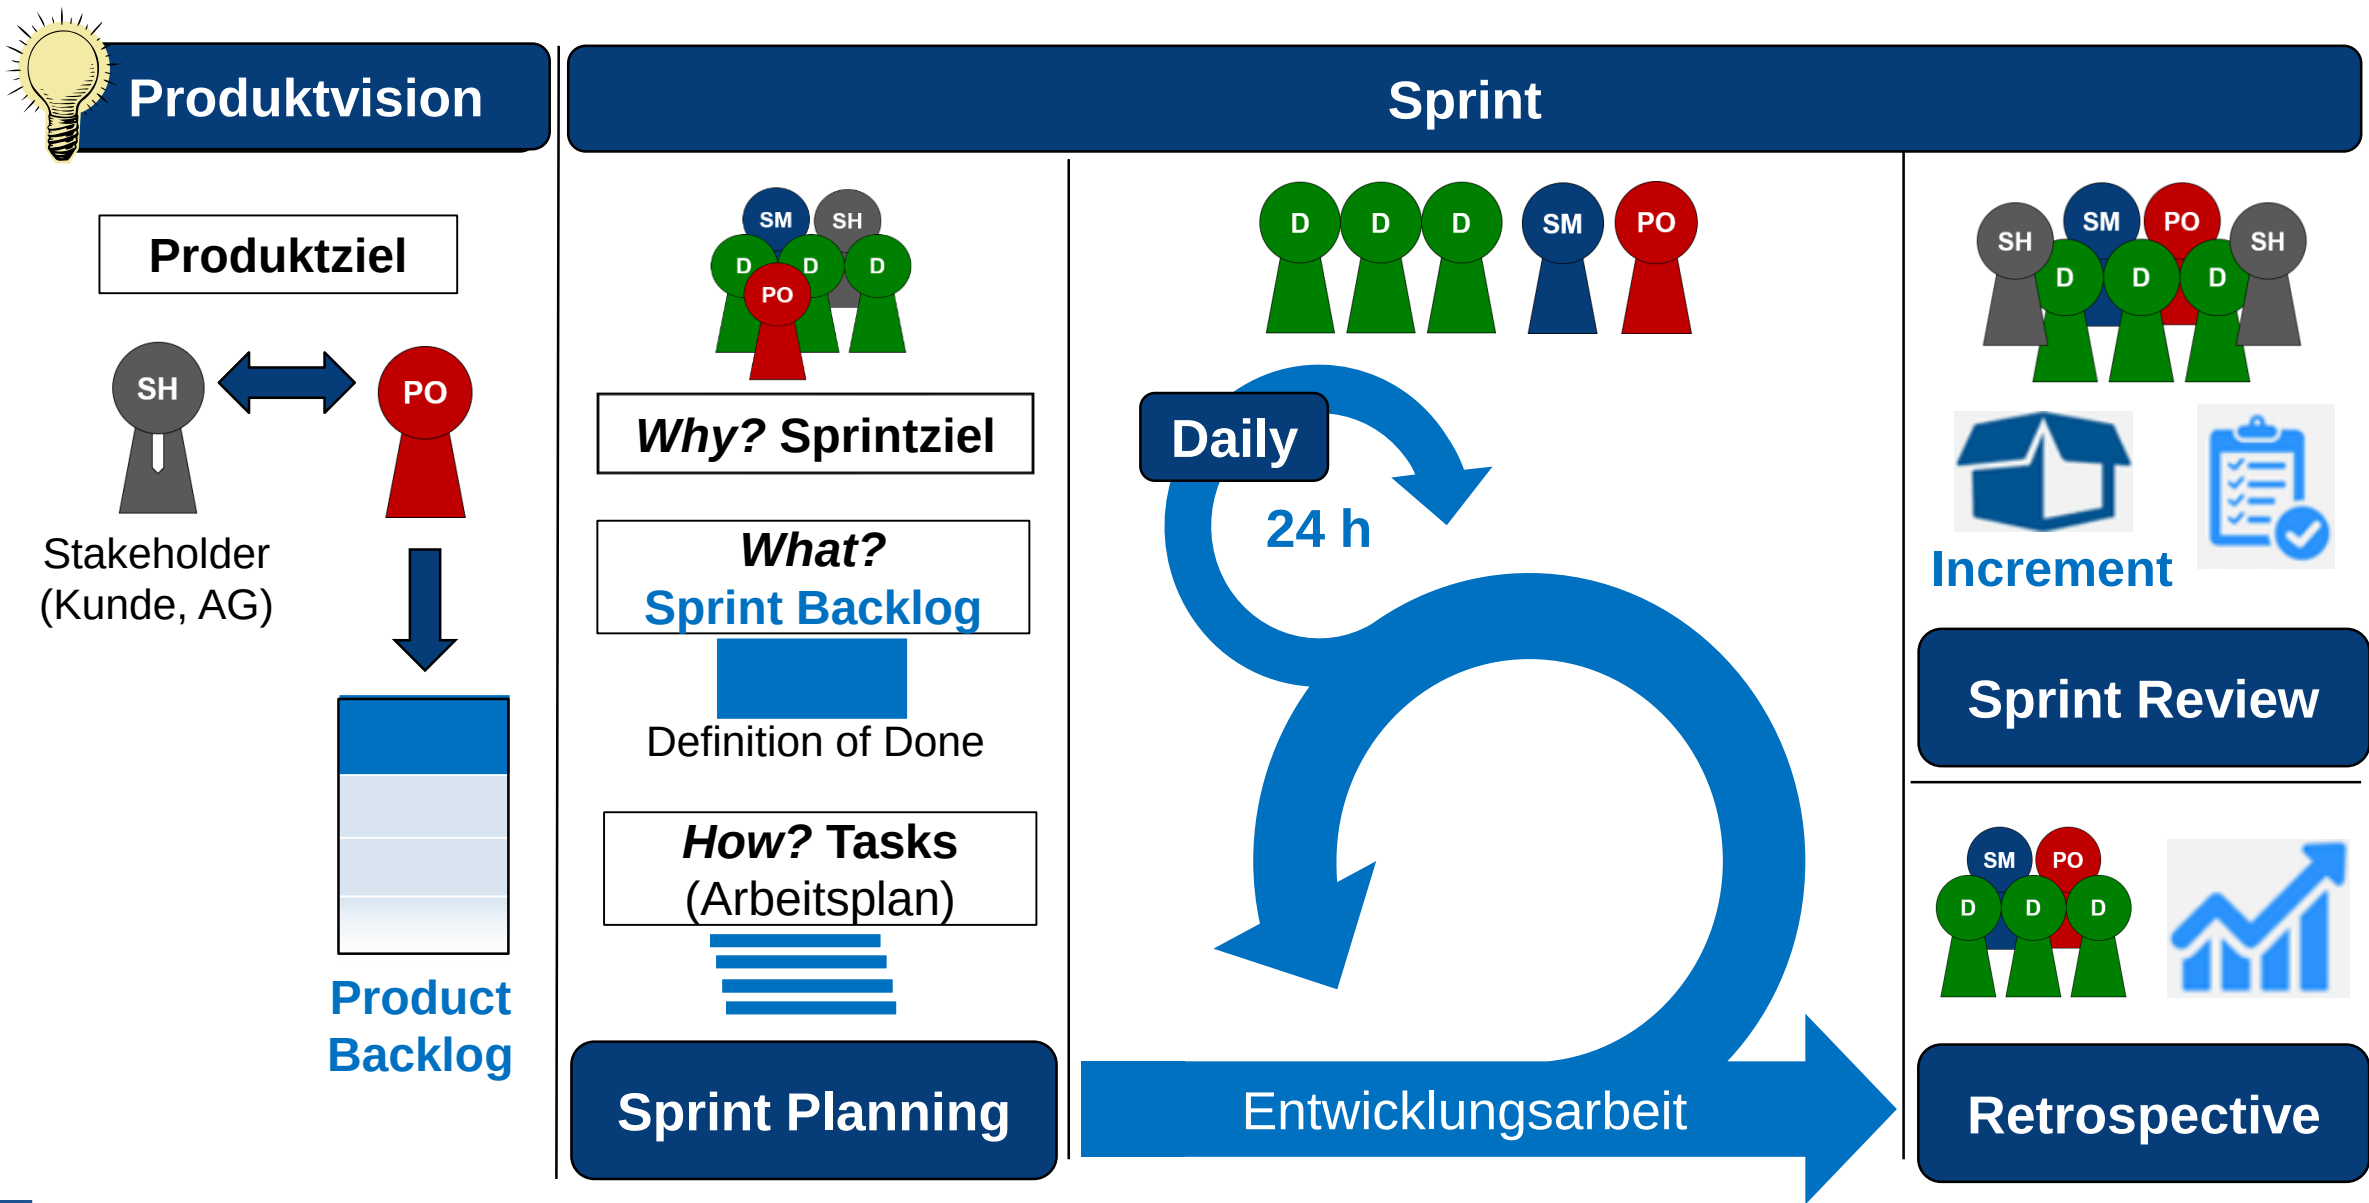


Product Backlog

Product Backlog (PB)

- Liste der Anforderungen (PB-Einträge) an das Produkt
- **Product Owner ist verantwortlich** für das PB (erzeugen, kommunizieren, priorisieren von transparenten, sichtbaren und verstandenen PB-Einträgen)
- Einzige Quelle von Arbeit für das Scrum Team
- PB-Einträge, die vom Scrum Team innerhalb eines Sprints abgeschlossen werden können, werden als „bereit“ bezeichnet
- Mit **PB-Refinement** wird die Zerlegung von PB-Einträgen in kleinere präzisere Elemente bezeichnet – dies ist eine fortlaufende Aktivität
- Die Developer sind für die Größenbestimmung umsetzungsverantwortlich

Product Backlog Items (BPI)

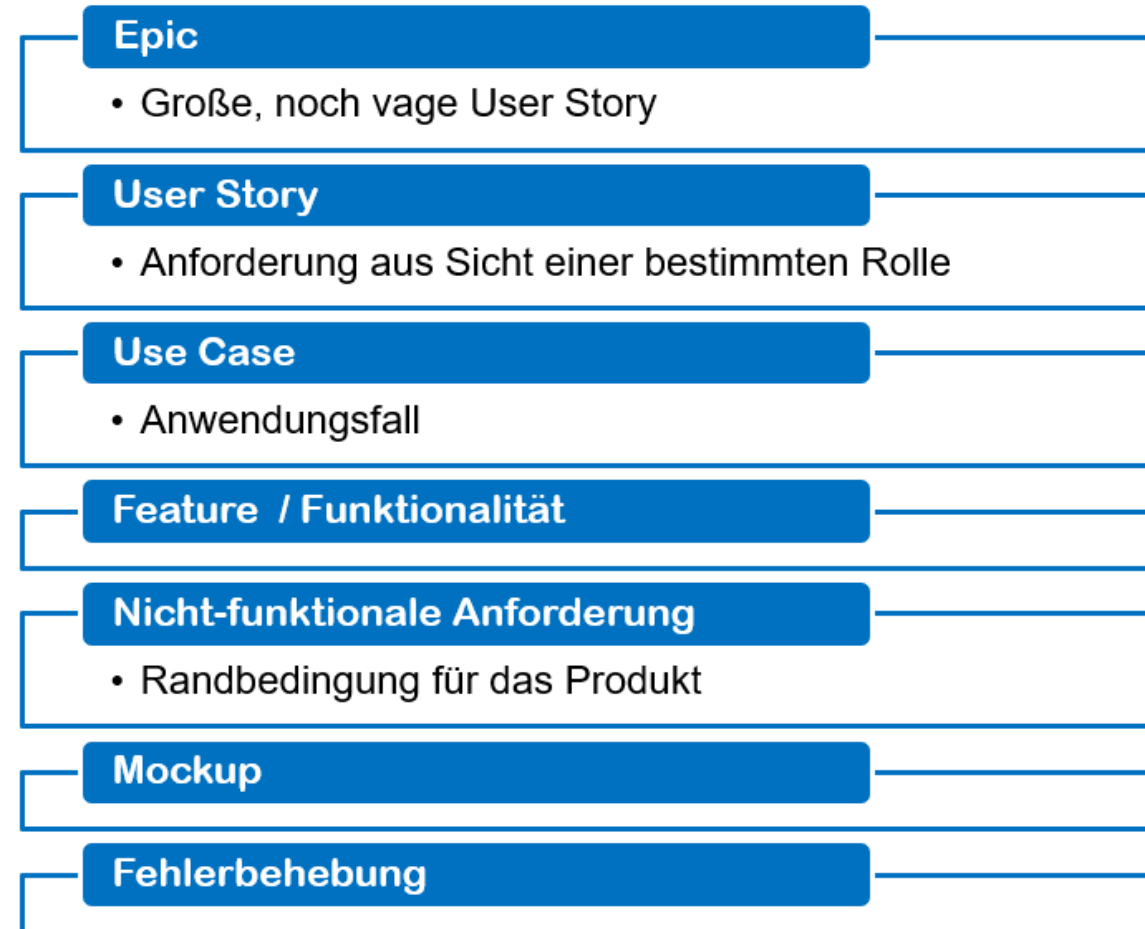

Kriterium „Small“


- ▶ Eine User Story muss klein genug für einen Sprint sein!
- ▶ Häufig sind User Stories zu groß
- ▶ Sie müssen dann verfeinert, d.h. in mehrere kleinere User Stories zerlegt werden

Beispiel

- User Story *"Als Benutzer möchte ich meine Profildaten bearbeiten und aktualisieren können, um sicherzustellen, dass meine Daten korrekt sind."*
- **Abgeleitete kleinere User Stories:**
 - *Als Benutzer möchte ich mein Profilbild ändern können, um ein aktuelles Bild zu verwenden.*
 - *Als Benutzer möchte ich meinen Vor- und Nachnamen ändern können, um meine korrekten Namen anzuzeigen.*
 - *Als Benutzer möchte ich meine E-Mail-Adresse ändern können, um sicherzustellen, dass meine Kontaktdaten auf dem neuesten Stand sind.*
 - *Als Benutzer möchte ich meine Profildaten löschen können, um meine Daten vollständig zu entfernen.*


Sprint: „Herzschlag“ von Scrum (1/2)

- ▶ **Alle Sprints haben die gleiche Dauer**
(max. 1 Monat; üblich auch 1-, 2-, 3- oder 4-Wochen)
- ▶ Ein neuer Sprint beginnt unmittelbar nach Abschluss des vorangegangenen Sprints
- ▶ Während eines Sprints kann der Scope (Inhalt und Umfang) geklärt und mit dem Product Owner neu vereinbart werden, sobald mehr Erkenntnisse vorliegen
- ▶ **Vorteile kürzerer Sprints**
 - Mehr Lernzyklen
 - Risiko von Kosten und Aufwand kann auf einen kleineren Zeitrahmen begrenzt werden
- ▶ Jeder Sprint kann als kleines Projekt betrachtet werden
 - ▶ Projektziel = Sprintziel
 - ▶ Projektdauer = Sprintdauer
 - ▶ Projektkosten = Sprintkosten

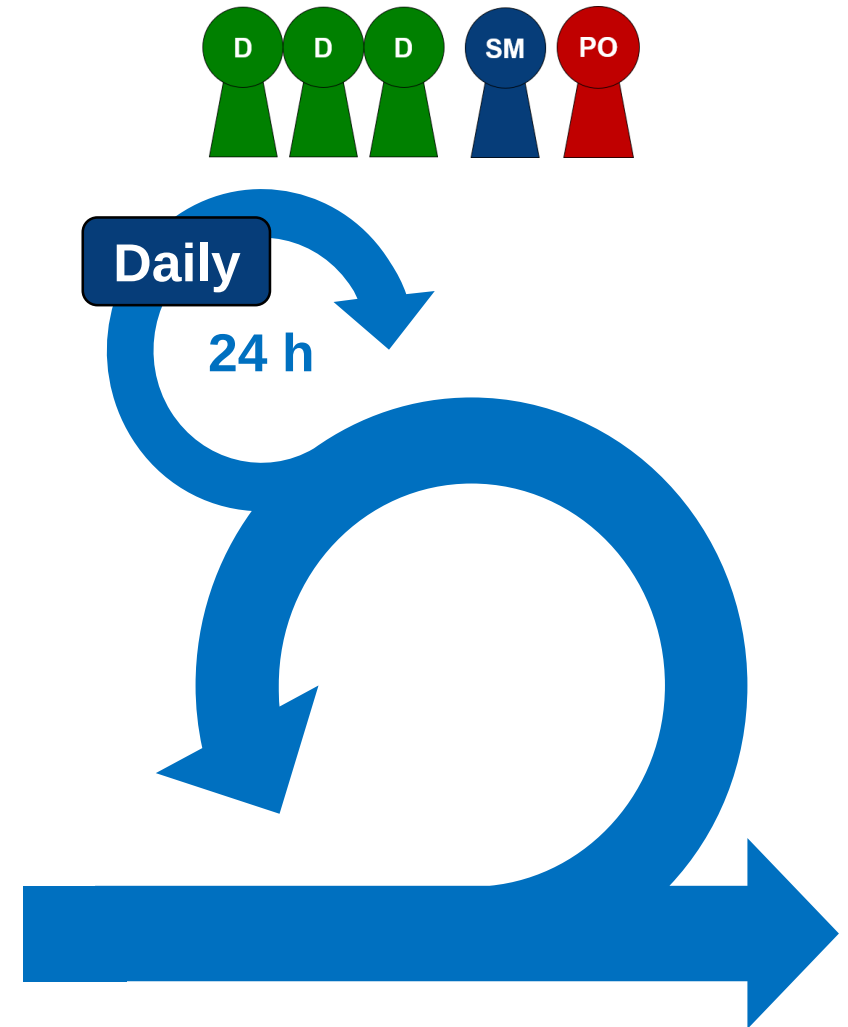

Sprint: „Herzschlag“ von Scrum (2/2)

- ▶ Grundregel: Keine Änderungen während eines Sprints, die das Sprintziel gefährden können
- ▶ Über neue Anforderungen entscheidet allein der Product Owner
- ▶ Ein Sprint kann abgebrochen werden, wenn das Sprintziel obsolete wird
- ▶ Nur der Product Owner ist berechtigt, den Sprint abubrechen

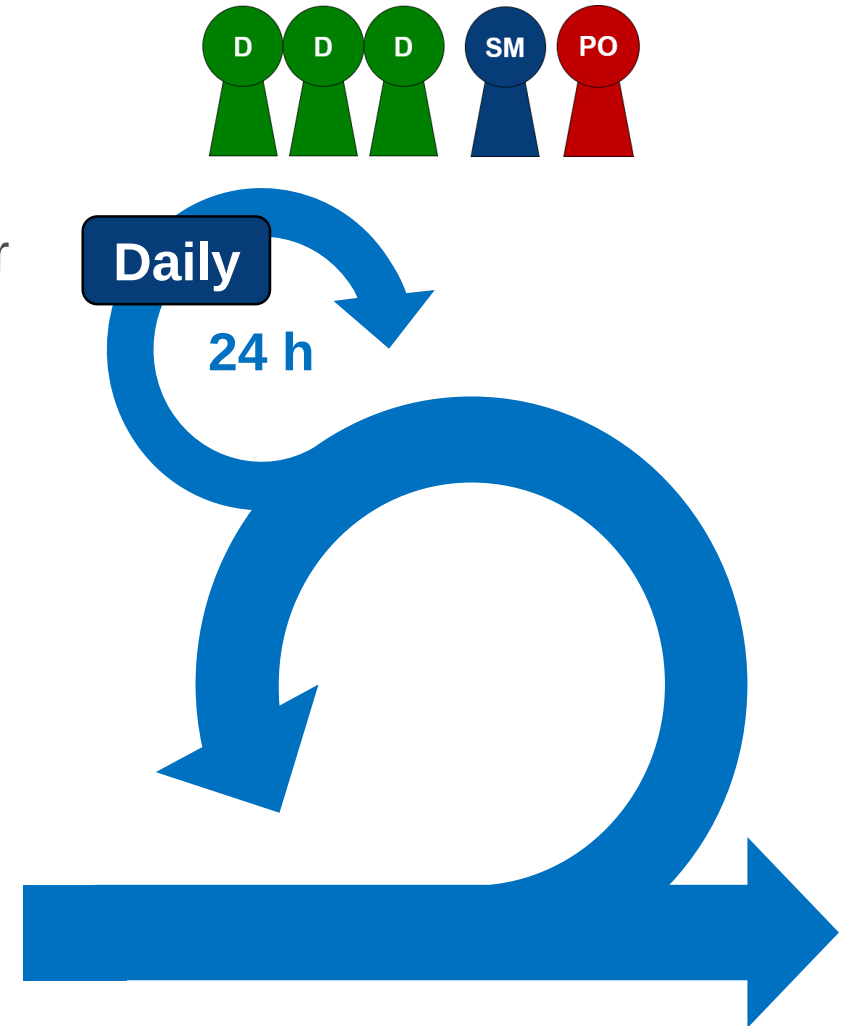


SPRINT PLANNING

Sprint Planning: Den Sprint planen

1. Warum ist dieser Sprint wertvoll?

- Product Owner macht einen Vorschlag
- Scrum Team erarbeitet ein **Sprintziel**



2. Was kann in diesem Sprint abgeschlossen werden?

- Aus dem Product Backlog wählen die Developer im Gespräch mit dem PO Einträge (US) aus, die in den aktuellen Sprint aufgenommen werden sollen.

3. Wie wird die ausgewählte Arbeit erledigt?

- Zu jedem ausgewählten Product Backlog-Eintrag planen die Entwickler die notwendige Arbeit, um ein Increment zu erstellen
 - Die Product Backlog-Einträge werden in **Entwickler-Tasks** zerlegt; diese sollten klein genug sein, um **innerhalb eines Tages abgeschlossen** zu werden, um sicherzustellen, dass das Entwicklungsteam kontinuierlich Fortschritte erzielt
- ▶ **Das Sprint-Backlog** besteht aus **Sprintziel, ausgewählten Product Backlog-Einträgen und dem Umsetzungsplan**
 - ▶ **Timebox:** 8 h für 1-monatigen Sprint; bei kürzeren Sprints in der Regel kürzer
 - ▶ **Teilnehmer:** Scrum Team, ggf. weitere Personen

Sprintziel

- ▶ Das Sprintziel beantwortete die Frage nach dem Sinn des Produkt-Inkrementes, das im Rahmen des Sprints erstellt wird. Warum ist dieser Sprint für die Stakeholder wertvoll?
 - Es gibt dem Scrum Team Orientierung
 - Es sollte spezifisch und messbar sein
- ▶ Vorgehen
 - Product Owner macht einen Vorschlag
 - Scrum Team erarbeitet gemeinsam das Sprintziel
- ▶ Beispiele
 - „Bereitstellung von Basisfunktionalitäten, um Geschäftspartner und Ansprechpartner zu verwalten“
 - „Die Archivierungsfunktionalität ist soweit rund, dass wir sie ausliefern können“
 - „Wir können das neue UI dem Vorstand präsentieren“
 - „Die Funktionen zur Barrierefreiheit des UIs sind implementiert“

SPRINTZIEL Warum führen wir diesen Sprint durch? - z.B. Auslieferung eines Features, Optimierung, Adressierung eines Risikos, Validierung einer Annahme	PRODUKTNAME Wie heißt das Produkt? 
	SPRINT Sprintname oder Nummer des Sprints, ggfs. Von/Bis-Datum 
HERANGEHENSWEISE Wie wollen wir das Sprintziel erreichen? Welche Artefakte werden erstellt? z.B. Click-Dummy, Produkt-Inkrement, Usability-Test, A/B-Test, User-Test (interne Stakeholder, Testkunden), etc.	 ÜBERPRÜFUNG Wie überprüfen wir, ob wir das Sprintziel erreicht haben? z.B. Performance-Messungen, 3 von 5 Test-Usern haben den Workflow komplett durchlaufen, etc. 

Workshop: Formulieren Sie ein Sprintziel für den 1. Sprints / Chat Storm

- ▶ **Jede/r** formuliert ein mögliches Sprintziel für den 1. Sprint seines Projektes und schreibt dieses in den Chat
- ▶ Absenden „an alle“ auf Kommando des Referenten

Sprintziele aus Chat

- ✓ MVP, der vom Probekunden getestet werden kann
- ✓ Einlesen der Gutachterdaten als PDF
- ✓ Interaktiver Prototyp
- ✓ Tech-Stack fertig + KI Modelle stehen.
- ✓ Erste Implementierung
- ✓ Web-Anwendung mit 2-3 Audiodateien zum Anhören
- ✓ Eine webseite als ein klickbarer prototyp mit der ersten Funktion
- ✓ Implementierung vom Zusammenfassungsfeature mit backend+frontend
- ✓ Recherche vervollständigen und App-Funktionen dementsprechend anpassen
- ✓ Eine Website mit grundlegenden Funktionen
- ✓ Erste Usability-Tests mit Athlet*Innen und darauf basierende Anpassungen
- ✓ Klickbarer MVP der gesamte Bestattungsplanung umfasst
- ✓ Project Front End
- ✓ Klick Dummy
- ☹ Project UI/UX
- ☹ Project flow and Architecture
- ☹ Design bestimmen
- ☹ Tech-Stack festlegen
- ☹ Anforderungsanalyse abschließen (mvp erarbeiten)

Unsere Ausgangssituation

✓ Bereits rudimentär vorhanden

- **Produktziel des Projektes:** aus Project Canvas (Ergebnisziel)
- **Product Backlog:** Alle User Stories der Story Map
- **Sprint Backlog:** Alle User Stories des MVP

► Im Sprint Planning noch zu erarbeiten

- **Sprintziel**
- **Planung für die Umsetzung des Sprint Backlogs**
 - Ermittlung der Entwickler-Tasks, die erforderlich sind, um die User Stories zu realisieren
 - Darstellung der User-Stories und Tasks auf einem **Task Board**

Hinweis: Es gibt noch weitere Scrum-(nahe) Elemente, die wichtig für Sprint Planning sind: Akzeptanzkriterien, Definition of Done, Backlog-Refinement, Story Points, Velocity etc. Diese werden in der nächsten Veranstaltung vorgestellt.

Template „Sprintziel“

SPRINTZIEL Warum führen wir diesen Sprint durch? - z.B. Auslieferung eines Features, Optimierung, Adressierung eines Risikos, Validierung einer Annahme	 PRODUKTNAME Wie heißt das Produkt? 
	SPRINT Sprintname oder Nummer des Sprints, ggfs. Von/Bis-Datum 
HERANGEHENSWEISE Wie wollen wir das Sprintziel erreichen? Welche Artefakte werden erstellt? z.B. Click-Dummy, Produkt-Inkrement, Usability-Test, A/B-Test, User-Test (interne Stakeholder, Testkunden), etc. 	ÜBERPRÜFUNG Wie überprüfen wir, ob wir das Sprintziel erreicht haben? z.B. Performance-Messungen, 3 von 5 Test-Usern haben den Workflow komplett durchlaufen, etc. 

- Die Definition des Sprintzieles schafft für das gesamte Team ein Bewusstsein für das gemeinsame Ziel im vorliegenden Sprint
- Arbeiten im Sprint können parallel und unabhängig voneinander durchgeführt werden

Template „Sprint goal“

SPRINT GOAL Why are we doing this sprint? - e.g. delivery of a feature, optimization, addressing a risk, validation of an assumption		PRODUCT NAME
		SPRINT Sprint name or number, From/to date, if applicable
APPROACH How do we plan to achieve the sprint goal? What artifacts will be created? E.g. click dummy, product increment, usability test, A/B test, User test (internal stakeholders, test customers), etc.	REVIEW How do we check if we have reached the sprint target? E.g. performance measurements, 3 out of 5 test users have completely gone through the workflow, etc.	

Sprintziel – mit Beispiel

SPRINTZIEL Warum führen wir diesen Sprint durch? - z.B. Auslieferung eines Features, Optimierung, Adressierung eines Risikos, Validierung einer Annahme Aufbau des MVPs: • Ein simpler, funktionstüchtiger End-to-End Chatbot • Aufrufbarkeit des Chatbots in Telegram • Digitalisierung der vorhandenen Fragen aus den Einführungsveranstaltungen und Implementierung im Chatbot	 PRODUKTNAME Wie heißt das Produkt? WueBuddy 
	SPRINT Sprintname oder Nummer des Sprints, ggfs. Von/Bis-Datum  26.04.2021 - 17.05.2021
HERANGEHENSWEISE Wie wollen wir das Sprintziel erreichen? Welche Artefakte werden erstellt? z.B. Click-Dummy, Produkt-Inkrement, Usability-Test, A/B-Test, User-Test (interne Stakeholder, Testkunden), etc.  • Aufbau des Rasa-Frameworks • Regeldefinition für den Chatbot • Manuelle Implementierung der Datengrundlage • Einrichtung einer Output-Schnittstelle zu Telegram	ÜBERPRÜFUNG Wie überprüfen wir, ob wir das Sprintziel erreicht haben? z.B. Performance-Messungen, 3 von 5 Test-Usern haben den Workflow komplett durchlaufen, etc.  Usability Test des End-to-End Szenarios: • Der Bot ist über Telegram erreichbar • Der Bot antwortet erwartungsgemäß

Workshop: Sprintziel erstellen

Schreiben Sie Ihr Sprintziel in das Template und ergänzen Sie die Felder

- ▶ Produktname: = Ihr Projektname
- ▶ Sprint: Sprint 1 vom 27.04. – 18.05.2026
- ▶ Herangehensweise
- ▶ Überprüfung

Dauer: 10 Minuten

SPRINTZIEL Warum führen wir diesen Sprint durch? - z.B. Auslieferung eines Features, Optimierung, Adressierung eines Risikos, Validierung einer Annahme	 PRODUKTNAME Wie heißt das Produkt? 
	SPRINT Sprintname oder Nummer des Sprints, ggfs. Von/Bis-Datum 
HERANGEHENSWEISE Wie wollen wir das Sprintziel erreichen? Welche Artefakte werden erstellt? z.B. Click-Dummy, Produkt-Inkrement, Usability-Test, A/B-Test, User-Test (interne Stakeholder, Testkunden), etc. 	ÜBERPRÜFUNG Wie überprüfen wir, ob wir das Sprintziel erreicht haben? z.B. Performance-Messungen, 3 von 5 Test-Usern haben den Workflow komplett durchlaufen, etc. 

Sprintziel muss konkret auf das angestrebte Ergebnis des Sprints ausgerichtet sein.
Auf der Grundlage des Ziels nur solche User Stories auswählen, die dieses Ziel unterstützen

Workshop


Teams stellen sich gegenseitig ihre Sprintziele vor

► Runde 1 (5 Minuten)

- 1 → 2
- 3 → 4
- 5 → 6

Erstellung des Sprint Backlogs

- ▶ Die Entwickler allein bestimmen die ausgewählten User Stories des Sprints
- ▶ Aus den User Stories des Sprints werden die zu erledigenden Entwickler-Tasks (Aufgaben zur Umsetzung) abgeleitet
- ▶ **Sprint Backlog = Sammlung der im aktuellen Sprint anstehenden Aufgaben, die aus den User Stories abgeleitet wurden – Darstellung mittels Task Board**

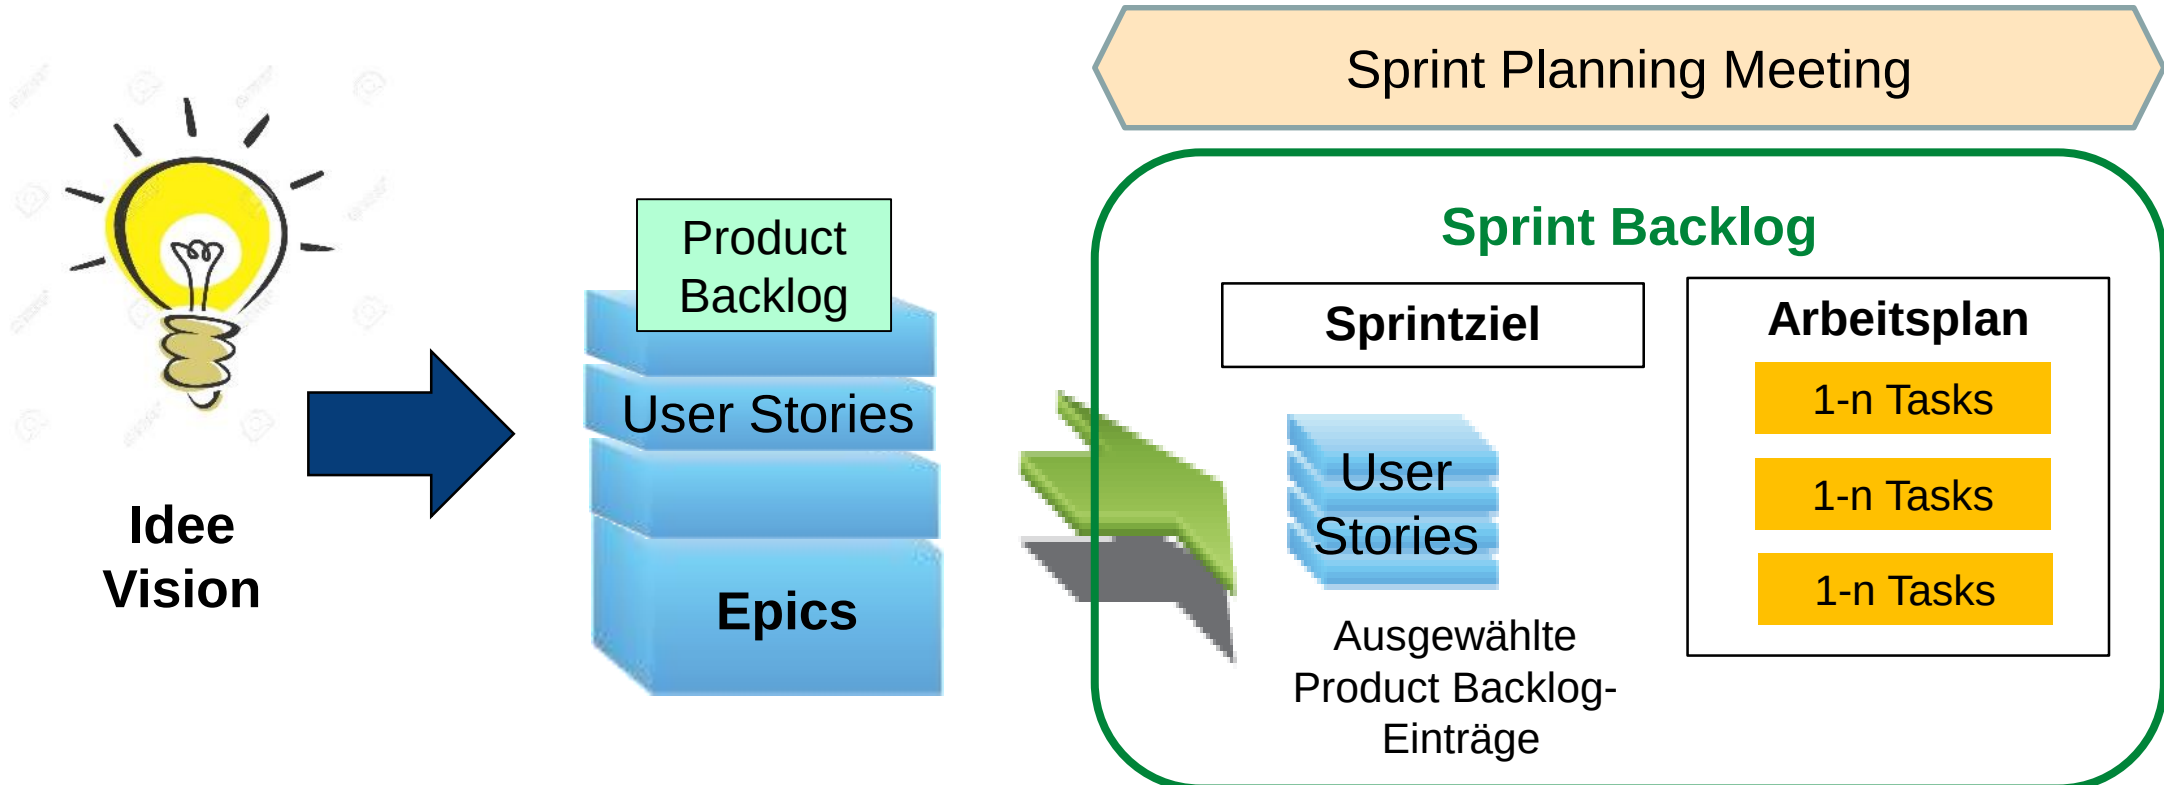

Sprint Planning: Umsetzungsplan (auf Taskboard; z.B. Trello, Jira u.ä.)

Perspektive: User	Perspektive: Developer		
User Stories WER? WAS? WARUM?	ToDo WIE?	In Progress	Done
US 1	Task 1.1 Task 1.2 Task 1.3 Task 1.4		
US 2	Task 2.1 Task 2.2 Task 2.3 Task 2.4 Task 2.5		
US 3	Task 3.1 Task 3.2 Task 3.3		

- Eine User Story muss grundsätzlich in einem Sprint umsetzbar sein
- Ansonsten ist ein **Refinement** durchzuführen, d.h. die User Story ist in kleinere User Stories aufzuteilen, die innerhalb eines Sprints umgesetzt werden können

Beispiel: User Stories in Tasks zerlegen

User Story 1 – Fragenkatalog anlegen

Als Studienanfänger möchte ich, dass ein Katalog an Fragen von WueBuddy beantwortet werden kann, damit ich mithilfe dieses Bots problemlos in das Studentenleben starten kann.

Task 1: Anlegen einer Datenbankgrundlage in Excel

Task 2: Sammlung von Fragen und Antworten

Task 3: Schreiben der Daten in Excel

Task 4: Katalog um Trainingsdaten erweitern

Task 5: Tool zur automatischen Integration der Daten in die Rasa-Umgebung

Quelle: Projekt „WueBuddy“, SS2021

Beispiel: User Stories in Tasks zerlegen

User Story 2 – Allgemeines zum Chatbot

Als Studienanfänger möchte ich, dass das Auftreten von WueBuddy ansprechend ist, damit ich Spaß an der Benutzung des Angebotes habe.

Task 1: Charaktereigenschaften des Bots definieren

Task 2: Logo designen

Task 3: Griffige Beschreibung des Produktes

Quelle: Projekt „WueBuddy“, SS2021

Beispiel: User Stories in Tasks zerlegen

User Story 3 – Rasa Umgebung aufsetzen

Als Developer möchte ich, dass eine initiale Rasa Umgebung auf GitHub liegt, damit die Arbeit an dem Projekt via Git begonnen werden kann.

Task 1: Git Repository auf GitHub anlegen

Task 2: Python-Umgebung mit dem initialen Rasa-Framework anlegen

Task 3: Umgebung strukturieren

Task 4: Konversations-Elemente anlegen

Task 5: Erste Frage implementieren

Quelle: Projekt „WueBuddy“, SS2021

Beispiel: Tasks

US1: Meet anlegen 6 

- ✓ 1.1 Map zur Homepage einfügen
- ✓ 1.2 User Location nutzen
- ✓ 1.3 Button zum hinzufügen neuer Meets
- ✓ 1.4 Anlegen des Meets mit entsprechenden Infos
- ✓ 1.5 Abspeichern von Meets in Datenbank
- ✓ 1.6 Anzeigen der Meets an der Map

US2: Titel, Beschreibung und Datum festlegen

- ✓ 2.1 Textfelder hinzufügen
- ✓ 2.2 Infos bei Meets abspeichern

US3: Profil anlegen 1 

- ✓ 3.1 Registrierung

US4: "Meet"-Marker auf der Karte sehen 2 

- ✓ 4.1 Koordinaten aus Datenbank auslesen
- ✓ 4.2 Ausgelesenen Koordianten als Marker auf Karte anzeigen

US5 "Meet"-Beschreibung anzeigen 2 

- ✓ 5.1 Meet-Infos aus Datenbank auslesen
- ✓ 5.2 Meet-Infos in neuem Popup Fenster anzeigen

Workshop 2: Eine User Story des MVP in Tasks zerlegen

Wählen Sie **eine besonders wichtige User Story** Ihres MVP aus.


Zerlegen Sie diese in alle **Tasks**, die zur Realisierung erforderlich sind!

Break-out

Dauer: 10 Minuten

Task Board

- ▶ Physisches oder digitales Board zur **Verfolgung des Fortschritts in der Abarbeitung der Tasks**
- ▶ Spalten
 - **ToDo**: alle Aufgaben, die noch nicht begonnen wurden
 - **In Progress** (in Arbeit): alle Aufgaben, die gerade bearbeitet werden
 - **Done** (Fertig): alle Aufgaben, die abgeschlossen sind
 - Weitere Spalten möglich, z.B. Aufgaben, die sich im Test befinden
- ▶ **Tools (bevorzugt Open Source Produkte)**
 - **Open Source**: Open Project, Zenkit, Wekan, Vikunja, Taiga -Template „Sprint Planning“ / Conceptboard
 - Sonstiges: Trello, Confluence

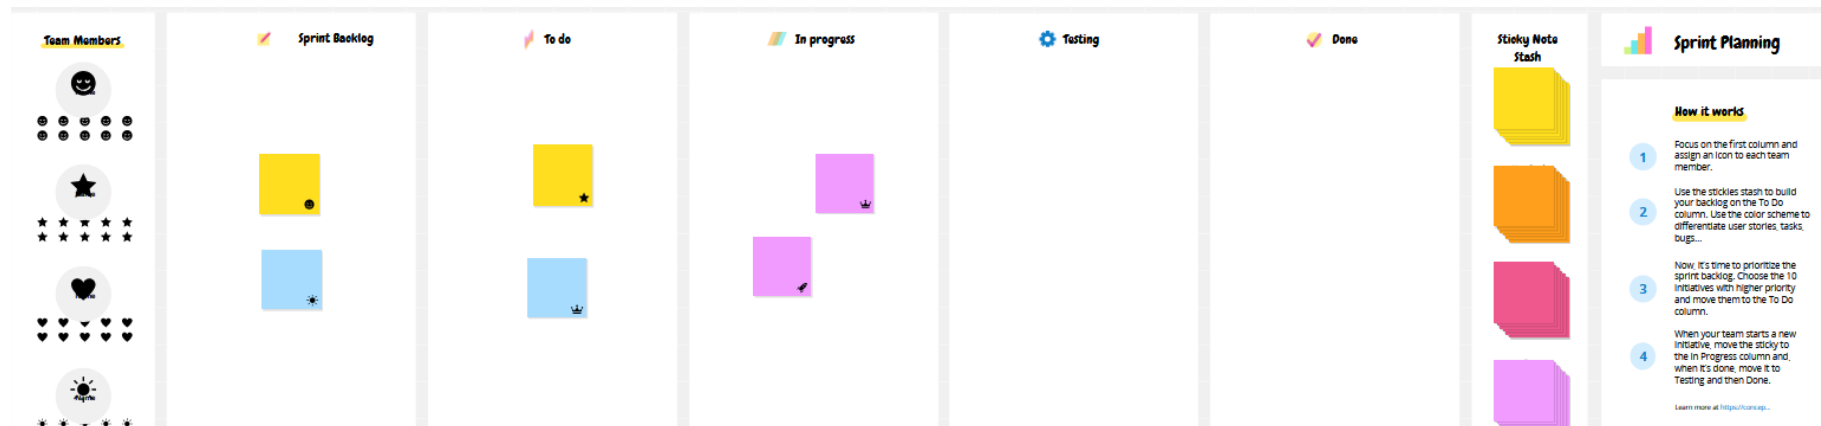

Empfehlung: US und zugehörige Tasks in gleicher Farben plus Nummerierung: US 1 → Task 1.1 ...

Conceptboard

Template einfügen

Conceptboard Templ...

Team-Templates

Bausteine

KATEGORIE

Projekte & Strategie

Marketing & Kommuni...

Board Games

Bildung

Icebreakers

Template einfügen

Abbrechen

🔍 sprint



Sprint Planing



Sprint Planung

Sprint-Planung

So funktioniert's

- Beginne damit, alle projektrelevanten Aufgaben innerhalb von Stunden im Backlog-Bereich zu erfassen. Lege jede relevante Aktivität fest – auch kleine – um einen vollständigen Überblick über den Arbeitsaufwand zu erhalten.
- Ordne die Aufgaben nach Priorität, damit die wichtigsten Punkte zuerst geplant und bearbeitet werden.
- Weise im Sprint-Bereich den Verantwortlichen zu, um Verantwortlichkeiten klar festzulegen. Zerteile dann jede Sticky Note in den Abschnitten 'To do' der entsprechenden Team-Sektionen. So hat jede Aufgabe eine klare Zuweisung und einen sichtbaren Fortschritt.
- Sobald Teammitglieder mit einer Aufgabe beginnen, verschieben sie die entsprechende Sticky Note in den Bereich 'In Bearbeitung'. Diese Aktionsüberführung sorgt für Transparenz und zeigt, wann genau gearbeitet wird.
- Verschiebe Sticky Notes bei Fortschritt in die Abschnitte 'Testen' oder 'Fertig', um den Workflow sichtbar zu machen und nachvollziehbar zu halten.

Mehr finden

Beachte dabei

Teile Dein Board und gestelle dir volle Conceptboard-Eindrücke, sende einfach die URL an Dein Team und starte die Zusammenarbeit!

Verwandte Templates

Entdecke eine Vielzahl an Vorlagen in der Kategorie Agile Methodik – zur Unterstützung Deiner Team-Zusammenkünfte wie dem Kanban Board oder dem Daily Stand-up. Gestalte auch spannende Events mit Vorlagen wie Meet, Stand, Meet, Stand, Glad.

Expertentipps

- Mehr Sticky Notes! Bausteine aufrufen.
- Lerne, wie Du Links zu Objekten hinzufügst.
- Lerne, wie Du Abschnitte erstellst.

Sprint Planning

How it works

- Begin by filling all project-related tasks using the sticky notes available on the backlog panel. Capture every relevant activity, no matter how small, to ensure a comprehensive overview of the project's workload.
- Organize the tasks by priority, ensuring the most critical items are addressed first during planning and execution.
- Assign team names to the swimlanes on the sprint panel to establish clear responsibility. Then, drag each sticky note into the 'To do' section under the appropriate team lane. This step ensures every task has an owner and a visible starting point.
- As team members begin work on a task, they should move the corresponding sticky to the 'In progress' section. This real-time update ensures transparency and keeps everyone informed about what's actively being worked on.
- As tasks progress to finishing phase, update their position accordingly by moving the sticky to these sections. This maintains workflow transparency and keeps progress clear to all.

Find more

Keep in mind

Share your board and enjoy the full Conceptboard experience. Just send the URL to your teammates and start collaborating!

Related templates


Explore a range of templates under the Agile Methodology category to support your team processes, such as the Kanban Board or Daily Stand-up. You can also design engaging retrospectives with templates like Meet, Stand, Glad.

Expert tips

- More sticky notes! Access the Building Blocks.
- Learn how to add links to objects.
- Learn how to create sections.

Backlog

List all the tasks related to this project



Backlog

List all the tasks related to this project



Zu tun

Aufgaben, die geplant werden müssen.

(Teammitglied-Name)

(Teammitglied-Name)

(Teammitglied-Name)

(Teammitglied-Name)

(Teammitglied-Name)

(Teammitglied-Name)

(Teammitglied-Name)

(Teammitglied-Name)

In Bearbeitung

Aufgaben in Bearbeitung

(Teammitglied-Name)

(Teammitglied-Name)

(Teammitglied-Name)

(Teammitglied-Name)

(Teammitglied-Name)

(Teammitglied-Name)

(Teammitglied-Name)

(Teammitglied-Name)

Testen

Aufgaben in der Testphase

(Teammitglied-Name)

(Teammitglied-Name)

(Teammitglied-Name)

(Teammitglied-Name)

(Teammitglied-Name)

(Teammitglied-Name)

(Teammitglied-Name)

(Teammitglied-Name)

Fertig

Bereits abgeschlossene Aufgaben

(Teammitglied-Name)

(Teammitglied-Name)

(Teammitglied-Name)

(Teammitglied-Name)

(Teammitglied-Name)

(Teammitglied-Name)

(Teammitglied-Name)

(Teammitglied-Name)

To do

Tasks to be started

(Team member name)

(Team member name)

(Team member name)

(Team member name)

(Team member name)

(Team member name)

(Team member name)

(Team member name)

Doing

Tasks under development

(Team member name)

(Team member name)

(Team member name)

(Team member name)

(Team member name)

(Team member name)

(Team member name)

(Team member name)

Testing

Tasks under testing

(Team member name)

(Team member name)

(Team member name)

(Team member name)

(Team member name)

(Team member name)

(Team member name)

(Team member name)

Done

Tasks already completed

(Team member name)

(Team member name)

(Team member name)

(Team member name)

(Team member name)

(Team member name)

(Team member name)

(Team member name)

Beispiel: Taskboard (US X → Tasks X.1, X.2, ...)

The taskboard is organized into five columns, each representing a stage in the workflow. Each column has a header with the column name and a count of items. Below the header, tasks are listed as cards. Each card includes a checkmark, a description, a person icon, a status icon, and a progress indicator (a bar with a right-pointing arrow).

Product Backlog 4	Sprint 1 Backlog 5	To-do 12	In Bearbeitung 5	Erledigt 11
✓ US6: "Meet" beitreten [Person Icon]	✓ US1: Meet anlegen [Red Tag] [DR] 6	✓ 1.4 Anlegen des Meets mit entsprechenden Infos [Red Tag] [Person Icon]	✓ Online-Umfrage finanzieren [Ko] [Morgen]	✓ Informieren über Datenbanken für Flutter [DR]
✓ US7: ggf. Teilnahme zurückziehen [Person Icon]	✓ US2: Titel, Beschreibung und Datum festlegen [Orange Tag] [Person Icon] 2	✓ 1.5 Abspeichern von Meets in Datenbank [Red Tag] [Person Icon]	✓ Straßenumfrage erstellen [Ko] [Freitag]	✓ Maps API anschauen und ggf. Anbinden [DR]
✓ US8: Challenge annehmen [Person Icon]	✓ US3: Profil anlegen [Green Tag] [JS] 1	✓ 1.6 Anzeigen der Meets an der Map [Red Tag] [Person Icon]	✓ Straßenumfrage erstellen [LK] [Freitag]	✓ 1.1 Map zur Homepage einfügen [Red Tag] [DR]
✓ US9: Progress zeigen [Person Icon]	✓ US4: "Meet"-Marker auf der Karte sehen [Blue Tag] [Person Icon] 2	✓ 2.1 Textfelder hinzufügen [Orange Tag] [Person Icon]	✓ Profile-Page gestalten [CD] 2	✓ 1.2 User Location nutzen [Red Tag] [DR]
+ Aufgabe hinzufügen	✓ US5 "Meet"-Beschreibung anzeigen [Pink Tag] [Person Icon] 2	✓ 2.2 Infos bei Meets abspeichern [Orange Tag] [Person Icon]	✓ 3.1 Registrierung [Green Tag] [JS]	✓ 1.3 Button zum hinzufügen neuer Meets [Red Tag] [DR]
			+ Aufgabe hinzufügen	

Beispiel

Hinterbliebenen- Helfer

Projektteam 1 (Annalena, Andreas, Christian, Edi, Jule, Oliver, Yanice)

19.05.2025



Übersicht

- Hinterbliebenen-Helfer
- AG: Mainpost, C. J. Papay
- Team: Annalena Brand, Edi Cehajic, Yanice Harich, Jule Leistner, Andreas Sirlinger, Oliver Wizemann, Christian Wolz.
- Projektzeitraum: 28.04.2025 bis 21.07.2025

Sprintziel Gruppe 1 (Ohne IT-Kenntnisse)

Abfrage-Klick-Dummy (Figma)

SPRINTZIEL

Warum führen wir diesen Sprint durch?
- z.B. Auslieferung eines Features, Optimierung, Adressierung eines Risikos, Validierung einer Annahme



Aufbau eines ersten Click-Dummys (Figma)

- Grobes Konstrukt als erstes User-Interface erstellen
- Erste Hilfestellung für den User anbieten:
- Schritt für Schritt Anleitung, um Email Zugang zu erhalten

PRODUKTNAME

Wie heißt das Produkt?



Hinterbliebenen-Helfer

SPRINT

Sprintname oder Nummer des Sprints,
ggfs. Von/Bis-Datum



Sprint 1: 13.05 - 26.05

HERANGEHENSWEISE

Wie wollen wir das Sprintziel erreichen? Welche Artefakte werden erstellt?
z.B. Click-Dummy, Produkt-Inkrement, Usability-Test, A/B-Test, User-Test (interne Stakeholder, Testkunden), etc.



Decision-Tree erstellen (Was sind notwendige Schritte, die zur Eingabe der Email Adresse führen?)

- Recherche: (Wie kann Zugang zu einem Email Postfach gewährt werden? Was ist dafür nötig? Wie können Email-Postfächer von verstorbenen identifiziert werden, falls kaum Informationen darüber vorliegen? --> Allgemeine Tipps?)
- Fragenkatalog, bzw. Schritt für Schritt Anleitung ausformulieren, um Email und Zugang zu bekommen.
- Erstes Design einer sinnvollen und einfachen Darstellung/ Layout der Figma Folien
- Einzelne Schritte auf Figma Folien übertragen.
- Schaltung/ Programmierung der Figma Folien, damit man von einer Folie auf die nächste kommt.
- Ablauf intern Testen.

ÜBERPRÜFUNG

Wie überprüfen wir, ob wir das Sprintziel erreicht haben?
z.B. Performance-Messungen, 3 von 5 Test-Usern haben den Workflow komplett durchlaufen, etc.



Überprüfung durch die Team-Mitglieder.

- 1) Überprüfung, ob unsere Figma Folien wirklich alle Schritte/ Fälle auch abdecken, um Zugangsdaten zu erlangen. Verschiedene Email Provider dafür verwenden. Versuch die eigenen Zugangsdaten mit Hilfe der Schritte zu erlangen.
- 2) Funktionalität der Figma Folien testen. Wird nach dem ersten Schritt auch der zweite Schritt angezeigt. Kann man auch problemlos zurück gehen.

Sprintziel Gruppe 2 (Mit IT-Kenntnissen)

KI-Auslese/Erkennung

SPRINTZIEL

Warum führen wir diesen Sprint durch?

- z.B. Auslieferung eines Features, Optimierung, Adressierung eines Risikos, Validierung einer Annahme



Aufbau des Grundgerüst der Anwendung:

- Backend: Rest-API Grundgerüst [Optional Einlesen der Emails]
- Frontend: Seiten Gerüst (Header, Footer, Navigation), Email Page mit Dummies [Optional Email von API darstellen]
- Entwicklungs-Mail-Server, inkl. Mail einsicht (Client)
- Einarbeitung in Prompting für spätere KI Anfragen

Dev-Umgebung Orchestriert startbar aufsetzen

PRODUKTNAME

Wie heißt das Produkt?



Hinterbliebenen-Helfer

SPRINT

Sprintname oder Nummer des Sprints,
ggfs. Von/Bis-Datum



Sprint 1: 13.05 - 26.05

HERANGEHENSWEISE

Backend:
z.B.
Us

- Python Backend mit FastAPI
- Container Build Pipeline
- Optional: Email auslese Mechanik und API Endpunkte

Frontend:

- Repo mit REACT aufsetzen
- Seitengerüst erstellen: Header, Footer, Email Listing Page (Optional Login)

Entwicklungs-Mail-Server aufsetzen:

- Mail Server für die Entwicklung aufsetzen mit einigen Mail Adressen für Testzwecke
- Mail Client (z.B. Roundcube), SSL-Zertifikate, IMAP-/SMTP-Konfiguration

Dev-Umgebung:

- Einheitliches Repo mit Startscripts für die Komponenten so das unabhängig Entwickelt werden kann.



ÜBERPRÜFUNG



- Frontend kann eingesehen werden, es ist eine Liste von Mail Dummies zu sehen
- Ein Mail Server kann genutzt (senden/empfangen) und vorhandene Mails eingesehen werden
- Das Backend kann gestartet werden und testweise benutzt werden
- Die Dev-Umgebung kann einheitlich gestartet werden.



User Stories im User Story Format

US1: Ich, Elisabeth, möchte eine Übersicht über die Unterlagen erhalten, die ich brauche, um Zugang zum Emailpostfach zu erhalten, damit ich alle Informationen bereitstellen kann, um den Service effizient nutzen zu können.

US2: Ich, Elisabeth, möchte Hinweise bekommen, wie ich mir Log-In Daten beschaffe, um nicht selbst recherchieren zu müssen und um schneller Zugriff zu erhalten.

US3: Ich, Elisabeth, möchte Mail Accounts hinterlegen können durch Eingabe von Zugangsdaten, welche für die Analyse herangezogen werden sollen, um sie nach relevanten Daten zu durchsuchen

User Stories im User Story Format

Gruppe 1

US1: Ich, Elisabeth, möchte eine Übersicht über die Unterlagen erhalten, die ich brauche, um Zugang zum Emailpostfach zu erhalten, damit ich alle Informationen bereitstellen kann, um den Service effizient nutzen zu können.

US2: Ich, Elisabeth, möchte Hinweise bekommen, wie ich mir Log-In Daten beschaffe, um nicht selbst recherchieren zu müssen und um schneller Zugriff zu erhalten.

Gruppe 2

US3: Ich, Elisabeth, möchte Mail Accounts hinterlegen können durch Eingabe von Zugangsdaten, welche für die Analyse herangezogen werden sollen, um sie nach relevanten Daten zu durchsuchen

Unterteilung der User Stories in Tasks

► Tasks für User Story 1:

- 1.1 Einarbeitung und Erstellung von Figma Folien [Abfrage/ Klick-Dummy] (**Jule**)
- 1.2 Übertragung der Anleitung auf Figma Folien (**Jule**)
- 1.3 Design der Folien gestalten [Zweitrangig! Funktionalität hat Priorität] (**Yanice**) (**Andreas**)


► Tasks für User Story 2:

- 2.1 Recherche: Welche Unterlagen sind nötig, um Zugang zum Emailpostfach zu bekommen (**Annalena**) (**Andreas**)
- 2.2 Sinnvolle Schritt für Schritt Anleitung verfassen (**Annalena**) (**Yanice**)

► Tasks für User Story 3:


- 3.1 Aufbau der Backend DEV Umgebung (**Oli**)
- 3.2 Backend: Erste API Endpunkte erstellen (**Oli**)
- 3.3 Aufbau der Frontend DEV Umgebung (**Christian**)
- 3.4 Frontend: Grundgerüst mit Mailauflistungsseite erstellen (**Christian**)
- 3.5 Einarbeitung in Prompting für Dokumenten/ Mail Verarbeitung (**Edi**)

Übersicht für den ersten Sprint

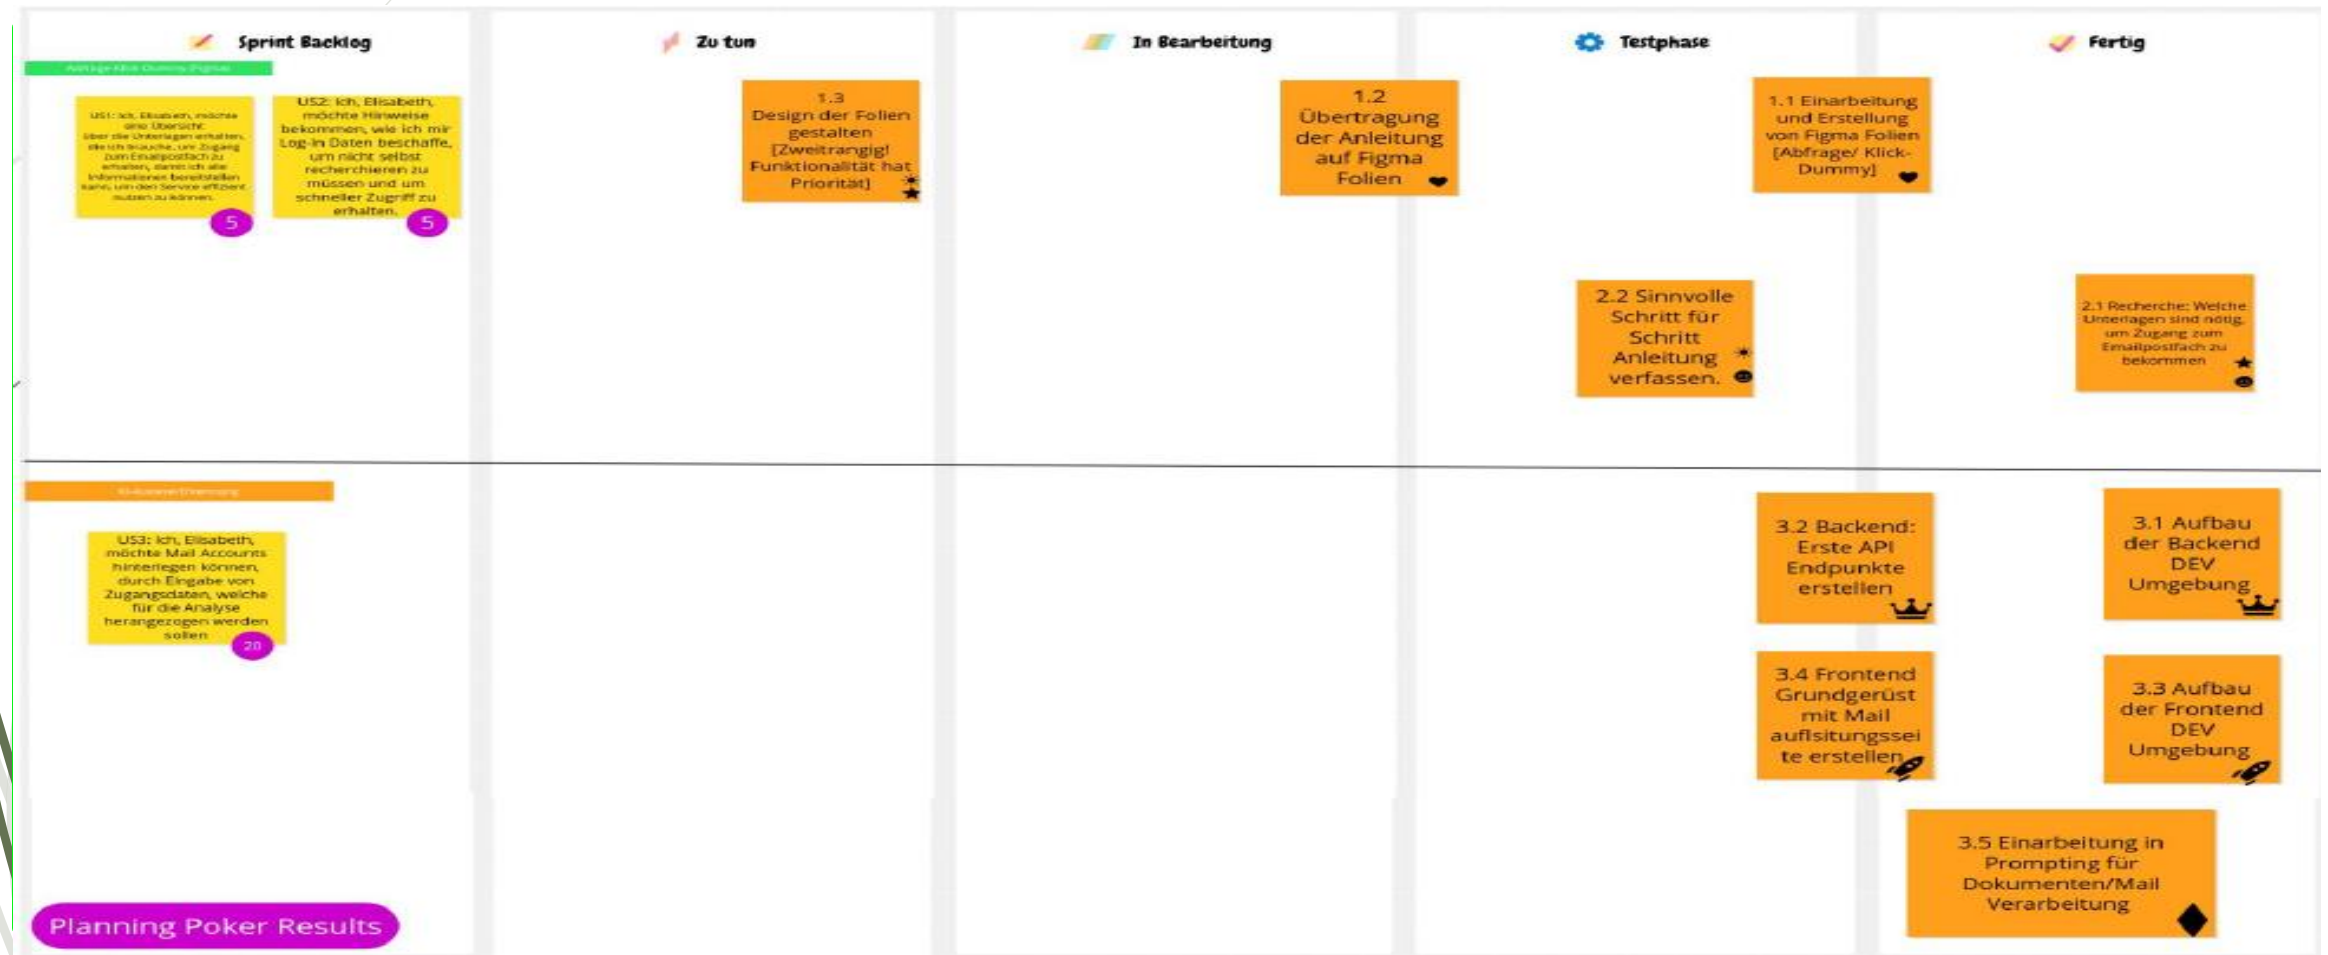



Reflexion - Prozess

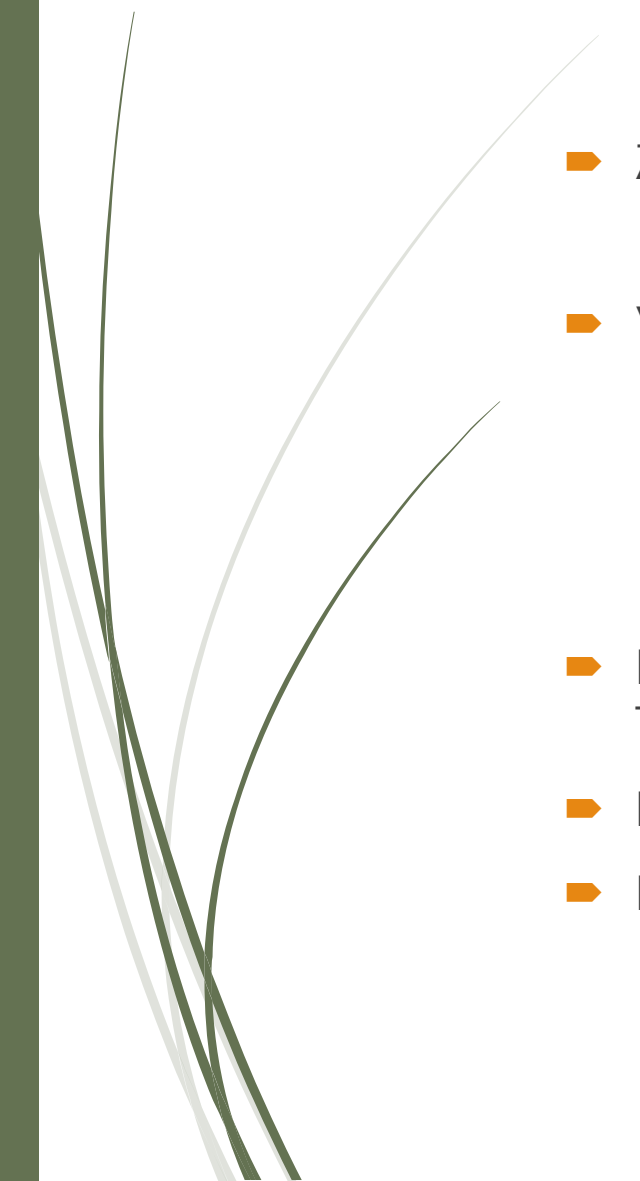

- Zielsetzung für den ersten Sprint vereinbart
 - Auswahl von 3 User Stories --> 2 User Stories für Team 1 und eine für Team 2
- Verteilung der einzelnen Tasks im Team
 - Selbstständige Eintragung für die Übernahme der Tasks, je nach Teamzugehörigkeit, Fähigkeiten und Interessen
 - Termine selbstständig innerhalb der einzelnen Gruppen für die Erledigung der Tasks vereinbart
- Besprechung innerhalb der Gruppe, ob die Zielsetzung und die dazugehörigen Tasks auch innerhalb der vorgegebenen Zeit umsetzbar sind
- Protokollführung des Jour Fixe, da manche nicht teilnehmen konnten
- Beginn der Ausführungen der einzelnen Tasks



Reflexion - Ergebnis



- Zweifel innerhalb der Gruppe, ob die Zielsetzung für den ersten Sprint zu umfangreich ist. Nach Rücksprache und Erläuterungen innerhalb der Gruppe, wurde eingestimmt, dass das Ziel innerhalb der vorgegebenen Zeit realistisch und umsetzbar ist
- Weiterhin reibungsloser und effizienter Kontakt, durch Nutzung der WhatsApp-Gruppe, zusätzliche Vernetzung der einzelnen Teams (mit und ohne IT-Kenntnissen)
 - Außerplanmäßige Teamsitzung diese Woche, da dritte Aufgabe (Vorlesung) erst nach vereinbartem Jour Fixe (Montags) erteilt wurde. Daher geringere Teilnahme als gewöhnlich
 - Kommunikationslücke geschlossen durch Einführung der Protokollierung der Teamsitzung (Jour Fixe)
- Hohe Eigenverantwortung innerhalb der Gruppen sichtbar. Selbstständige Planung und Durchführung der einzelnen Aufgaben
 - Tasks sind schon in Bearbeitung



Weitere Schritte



- ▶ Ausführung der einzelnen Tasks in Teams/ individuell
 - ▶ Recherche zur User-Vorgehensweise für die Benutzung des MVPs
 - ▶ Erstellung des digitalen Grundgerüsts unseres MVPs
- ▶ Fortschritte des ersten Sprints besprechen
 - ▶ Präsentation der (Zwischen-) Ergebnisse innerhalb des gesamten Teams beim nächsten Jour Fixe
 - ▶ Offene Aufgaben, zeitliche Einhaltung und Kapazitäten besprechen
 - ▶ Fortschrittsbericht an C. Papay (Auftraggeber), falls dieser am Jour Fixe nicht teilnimmt
- ▶ Beginn Projektberichterstellung

AUFGABE 3

Aufgabe 3: Sprint Planning

1. Vervollständigen Sie Ihr **Sprintziel** für den **1. Sprint**
2. Erstellen Sie eine **Liste mit allen User Stories des 1. Sprints** – im User Story Format
3. Ermitteln Sie zu den User Stories des Sprints alle zur Erledigung notwendigen **Tasks** für das Team und stellen Sie diese in einem **Taskboard** dar
4. Führen Sie eine **Reflexion der Prozesse und Ergebnisse** durch
5. Ermitteln Sie die **nächsten Schritte**
6. *Starten Sie mit der Bearbeitung der Tasks*

Erstellen Sie eine **Präsentation** mit den Ergebnissen von 1. - 5.

Upload auf WueCampus2 bis 02.05.2026 / 23:55: **Sprint-Planning-Team_x**

Die Product Owner der Teams 2, 5 und 6 stellen die Ergebnisse am 04.05.2026 kompakt vor.

Gesamtdauer pro Vortrag: ca. 8 Minuten
