

# Professionelles Projektmanagement in der Praxis - Mit digitalen Unternehmensgründungsprojekten

**Prof. Dr. Harald Wehnes**

Veranstaltung 5 (18.05.2026):

- MVP-Präsentationen (Sprint Review)
- Sprint Retrospektive
- Sprint Planning 2

**Partner:**

Servicezentrum  
Forschung und  
Technologietransfer  
(SFT)

  
Innovations- & Gründerzentrum  
**WÜRZBURG**

 **ZDI**  
ZENTRUM  
FÜR DIGITALE INNOVATIONEN  
MAINFRANKEN

# Information zu allen Vorlesungen

---

- **Wir starten jede Vorlesung auf die Minute pünktlich!**
- Bitte rechtzeitig einwählen.
- Videokamera bitte einschalten – Bei Gruppenarbeit immer einschalten!
- Mikrofone bitte stumm schalten, wenn vorgetragen wird
- Fragen / Anmerkungen / Rückmeldungen per Handzeichen-Symbol oder über den Chat
- Die Vorlesung wird aufgezeichnet und auf WueCampus zur Verfügung gestellt (nur für Vorlesungsteilnehmer!)  
Die Aufzeichnungen beschränken sich in der Regel auf die Vorträge des Dozenten.  
Studentische Vorträge werden für den Dozenten zur Benotung aufgezeichnet;  
diese Vorträge werden nicht auf WueCampus gestellt.
- Bitte Bescheid geben, wenn jemand verhindert ist
- Themen der Workshops haben hohe Relevanz für die Klausur

# Zeitplan

## 12:15 – 13:30 MVP Präsentationen (Sprint Review)

| Zeit          | Team | Projekt             |
|---------------|------|---------------------|
| 12:20 – 12:30 | 1    | Mindocu             |
| 12:30 – 12:40 | 2    | Musikstadt Würzburg |
| 12:45 – 12:55 | 3    | MindLeague          |
| 12:55 – 13:05 | 4    | Patientenakte       |
| 13:10 – 13:20 | 5    | Funeral Compass     |
| 13:20 – 13:30 | 6    | Data Digitalization |

**Wissenstransfer**  
*Präsentationen aller Teams bitte  
**aktiv begleiten:**  
Jeder Teilnehmer soll mindestens  
ein „Element“ bei einem anderen  
Team identifizieren, das er für  
geeignet findet, um es im eigenen  
Projekt zu übernehmen*

## 13:30 Sprint Retrospektive

13:45 Pause




## 14:15 Sprint Planning 2

- Aufgabe 5

15.45 Ende

# Vortragstermine (Stand: 17.05.2026)




| Name                       | Anzahl Mitglieder | 20.04. | 27.04. | 04.05. | 18.05.<br>MVP1 | 01.06. | 08.06. | 15.06.<br>MVP2 | 22.06. | 29.06. | 06.07. | 13.07.<br>Projektiade |
|----------------------------|-------------------|--------|--------|--------|----------------|--------|--------|----------------|--------|--------|--------|-----------------------|
| 1 - Mindocu                | 5                 | 1      |        |        | 1              |        |        | 1              |        | 1      |        | 2                     |
| 2 - Musikstadt<br>Würzburg | 5                 |        |        | 1      | 1              |        |        | 1              |        | 1      |        | 2                     |
| 3 - Mind<br>League         | 7                 |        | 1      |        | 1              | 1      |        | 1              | 1      |        | 1      | 2                     |
| 4 - Patienten<br>akte      | 6                 |        | 1      |        | 1              | 1      |        | 1              | 1      |        |        | 2                     |
| 5 - Funeral<br>Compass     | 6                 |        |        | 1      | 1              |        | 1      | 1              |        |        | 1      | 2                     |
| 6 - Data<br>Digitalization | 6                 |        |        | 1      | 1              |        | 1      | 1              |        | 1      |        | 2                     |

Jedes Team mit n Teammitgliedern hat n+1 Vorträge

# Sprint Review: Überprüfung der Sprint-Ergebnisse und Festlegung künftiger Anpassungen

1. Scrum Team stellt den wichtigsten Stakeholdern die Ergebnisse seiner Arbeit vor – möglichst nicht auf eine Präsentation beschränken
  2. Die Fortschritte in Richtung des Produktziels werden diskutiert
  3. Scrum Team und die Stakeholder überprüfen, was im Sprint erreicht wurde und was sich im Umfeld verändert hat
  4. Alle Teilnehmer arbeiten daran, was als nächstes zu tun ist, ggf. Anpassung des Product Backlog
- **Timebox:** 4 h für 1-monatigen Sprint; bei kürzeren Sprints in der Regel kürzer
- **Teilnehmer:** Scrum Team plus wichtige Stakeholder



18.05.2026: 1. Sprint Review mit Vorstellung der MVPs

# Vorstellung der MVPs

| Zeit          | Team | Projekt             | <b>Wissenstransfer</b><br><i>Präsentationen aller Teams aktiv begleiten:<br/>Jeder Teilnehmer soll mindestens ein<br/>„Element“<br/>bei einem anderen Team identifizieren,<br/>das er für geeignet findet,<br/>um es im eigenen Projekt zu übernehmen</i> |
|---------------|------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12:20 – 12:30 | 1    | Mindocu             |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 12:30 – 12:40 | 2    | Musikstadt Würzburg |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 12:45 – 12:55 | 3    | MindLeague          |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 12:55 – 13:05 | 4    | Patientenakte       |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 13:10 – 13:20 | 5    | Funeral Compass     |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 13:20 – 13:30 | 6    | Data Digitalization |                                                                                                                                                                                                                                                           |

# Chat Storm: „Cherry Picking“ (Wissenstransfer)

*Was fanden Sie bei anderen Teams besonders gut und könnte für Ihr Projekt übernommen werden?*

## Ergebnisse

- test device plugin im browser
- Kontinuierliche Absprache mit den Ideengeber:innen
- Testing row in taskboard
- Von Beginn an/möglichst frühe Einbindung von Nutzer\*innenerfahrungen
- Nutzererfahrungen
- Kommunikation mit Auftraggeber:innen
- Datenschutz früh bedenken.
- Externes Feedback
- Meeting Häufigkeit wichtig
- user survey und Strukturiertheit
- User Testing/Feedback
- Realisierbare Sprintziele
- Nutzermeinungen möglichst früh einholen
- Realistische Sprintziele

Coffee  
Break






# SPRINT ABSCHLUSS

# Inhalte

- ▶ **Increment:** Ergebnis des Sprints
- ▶ **Sprint Review:** Überprüfung der Sprint-Ergebnisse und Festlegung künftiger Anpassungen
- ▶ **Sprint Retrospektive:** Steigerung von Qualität und Effektivität
- ▶ **Velocity:** Planungsgrundlage für Folgesprints
  
- ▶ **Impediments:** Hindernisse bei der Arbeit

Elemente des Scrum-Guides in blauer Schrift

# Scrum Prozess im Überblick

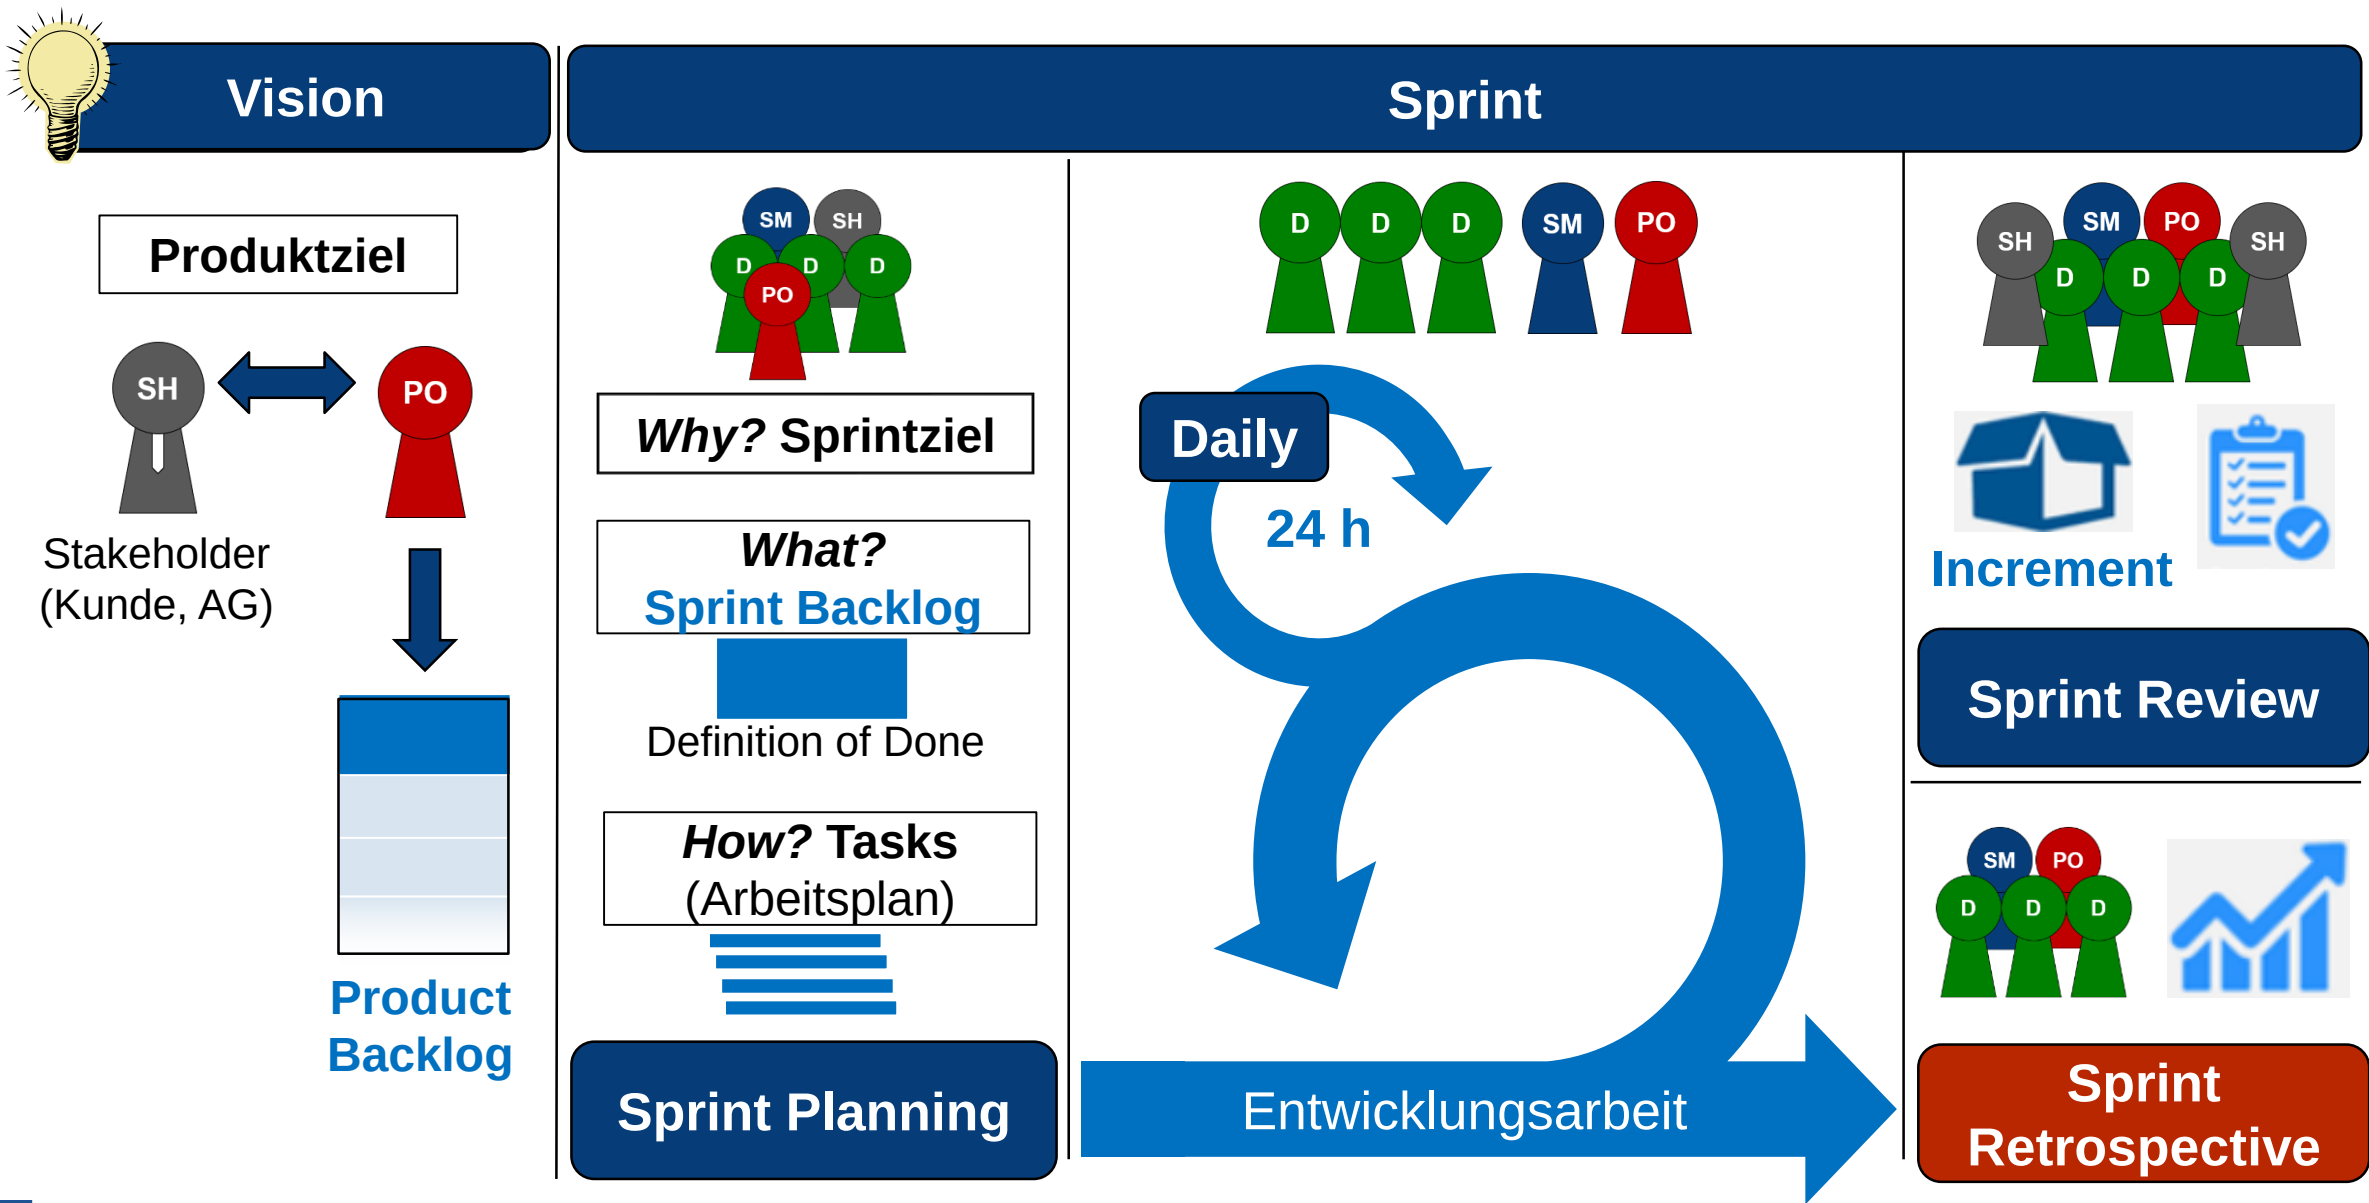


# Increment: Konkreter Schritt in Richtung des Produkt-Ziels

- ▶ Jedes Increment muss gründlich geprüft werden, um sicherzustellen, dass es zusammen mit allen bereits vorhandenen funktioniert
- ▶ Innerhalb eines Sprints können mehrere Increments erstellt werden
- ▶ Im Sprint Review werden alle im Sprint fertiggestellten Increments vorgestellt
- ▶ Ein Increment kann ggf. schon vor dem Ende des Sprints ausgeliefert werden. Das Sprint Review sollte niemals als Barriere zur Lieferung von Wert angesehen werden



# Sprint Review: Überprüfung der Sprint-Ergebnisse und Festlegung künftiger Anpassungen

1. Scrum Team stellt den wichtigsten Stakeholdern die Ergebnisse seiner Arbeit vor – möglichst nicht auf eine Präsentation beschränken
  2. Die Fortschritte in Richtung des Produktziels werden diskutiert
  3. Scrum Team und die Stakeholder überprüfen, was im Sprint erreicht wurde und was sich im Umfeld verändert hat
  4. Alle Teilnehmer arbeiten daran, was als nächstes zu tun ist, ggf. Anpassung des Product Backlog
- ▶ Timebox: 4 h für 1-monatigen Sprint; bei kürzeren Sprints in der Regel kürzer
  - ▶ Teilnehmer: Scrum Team plus wichtige Stakeholder



18.05.2026: 1. Sprint Retrospektive mit Vorstellung der MVP

# Sprint Retrospective: Wege zur Steigerung von Qualität und Effektivität planen

## ► Rückblick

- Scrum Team untersucht, wie der letzte Sprint in Bezug auf Personen, Interaktionen, Prozesse, Werkzeuge und seine DoD verlief
- Falsche Annahmen werden identifiziert und analysiert
- Scrum Team bespricht, was während des Sprints gut gelaufen ist, auf welche Probleme es gestoßen ist und wie diese Probleme gelöst wurden (oder auch nicht).

## ► Ausblick

- Scrum-Team identifiziert die hilfreichsten Änderungen, um seine Effektivität zu verbessern
- Die wirkungsvollsten Verbesserungen werden so schnell wie möglich in Angriff genommen. Sie können sogar in das Sprint Backlog für den nächsten Sprint aufgenommen werden.


► **Timebox:** 3 h für 1-monatigen Sprint; bei kürzeren Sprints in der Regel kürzer

► **Teilnehmer:** Scrum Team



**Die Sprint Retrospektive schließt den Sprint ab**

# Format für Retrospektiven

| Was hat gut funktioniert?                                                         | Was hat nicht funktioniert?                                                         | Aktionen                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |

1. Jeder benennt 1-2 Punkte, die gut gelaufen sind
2. Jeder benennt 1-2 Punkte, die er für verbesserungswürdig hält
3. Besprechung dieser Punkte im Team – mit Clusterbildung und Priorisierung
4. Verbesserungsvorschläge für die in der 2. Spalte genannten und priorisierten Punkte finden und diese in die Aktionen-Spalte aufnehmen
5. Entscheidung treffen, welche besonders wichtigen Verbesserungsvorschläge – mindestens einer! – im nächsten Sprint umgesetzt werden sollen

| Was hat gut funktioniert?                                                                                                                                                                | Was hat nicht funktioniert?                                                                                               | Aktionen                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>Kommunikation</div> <div>gute Zusammenarbeit</div> <div>Daily Scrum/ up-to-date bleiben</div> <div>Arbeit im Team</div> <div>gutes Sprintziel</div> <div>Regelmäßige Meetings</div> | <div>Parallelisierung mancher Tasks</div> <div>Trennung der Entwicklungsgrenzen</div> <div>Pflege des Kanban-Boards</div> | <div>Auf dependencies zwischen Tasks achten, evtl kleinere ToDos als Lückenfüller</div> <div>Taskboard Pflege in DoD aufnehmen</div> |

# Weitere Formate für Retrospektiven

- ▶ Wie führt man spannende Retrospektiven durch? → Verschiedene Formate verwenden!
- ▶ Retromat: weit über 100 verschiedene Formate für Retrospektiven  
<https://retromat.org/blog/best-retrospective-for-beginners/>  
<https://agilescrumgroup.de/retrospektive-formen-mit-beispielen-und-ideen/>
- ▶ Beispiele  
*Start – Stop – Continue*

**Start:** Was soll künftig neu gemacht werden?


**Stop:** Was soll künftig unterlassen werden?

**Continue:** Was soll künftig fortgesetzt werden?

More of: Was soll verstärkt werden?

Less of: Was soll reduziert werden?

*Ich mochte – Ich wünsche mir*

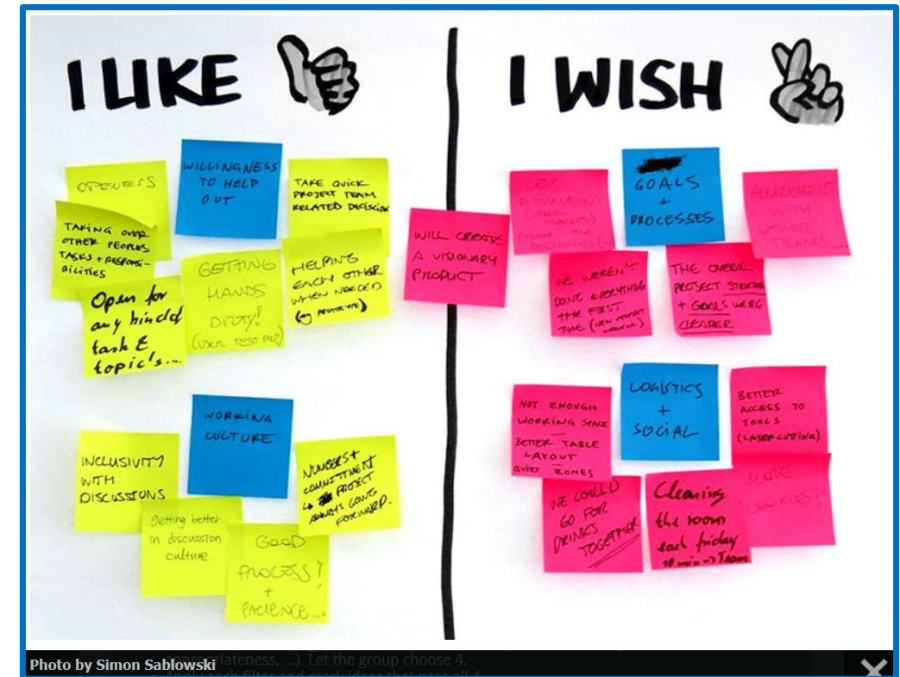



# Template „Sprint Retrospektive“ auf Conceptboard

| QUICK RETROSPECTIVE                                                                                                                                                                       |                      | TEAM: | DATE: |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|-------|
| <p>What was good?</p>   | <p>What was bad?</p> |       |       |
| <p>Ideas</p>                                                                                                                                                                              | <p>Actions</p>       |       |       |

# Beispiel 1

| QUICK RETROSPECTIVE                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                     | TEAM: #5 - Mach mit! | DATE: 30.05.2022 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|
| <b>What was good?</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Trello Board zur Organisation</li><li>Kommunikation und Abstimmung</li><li>Mehr Meetings in Kleingruppen</li><li>Fokus auf wichtigste User Storys</li></ul>                                 | <b>What was bad?</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Einschätzung Arbeitsaufwand</li><li>Keine Testmöglichkeiten in Umgebung</li><li>Einteilung von irrelevanten User Tasks für MVP</li></ul> |                      |                  |
| <b>Ideas</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Erstellung eines Click-Dummys (z.B. über Figma)</li><li>User Tests durchführen</li><li>Interviews über Anforderungen an die Website mit User:innen verschiedener Altersgruppen durchführen</li></ul> | <b>Actions</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Zugänge zum Testen bereitstellen lassen</li><li>Unterstützung bei Umsetzung eines Clickdummys einholen</li></ul>                               |                      |                  |

# Beispiel 2

## Was war gut?

- Regelmäßige Absprache mit den Auftraggeber:innen
- Leichte und unkomplizierte Kommunikation mit den Auftraggeber:innen
- Regelmäßige JF
- Offenes Ansprechen von Problemen
- Arbeitsbereitschaft der Teammitglieder
- Aufteilung der verschiedenen User Stories und Aufgaben

## Was war schlecht?

- Verantwortlichkeitsgefühl
- Klarheit der Aufträge
- (Teilweise) Fehlende Kommunikation zu Beginn des Projektes
- Teamarbeit bei Erstellung der Figma-Flows
- Zugang zu den Zielgruppen - Auszubildenden & Betriebe
- Krankheitsfälle im Team verzögerten den Projektfortschritt

## Ideen

- **Mehrere kleine Treffen die Woche**
- **Expert:innen für verschiedene Themen festlegen**
- Einbringen der Diversität der Nutzer:innen
- Informationen von anderen Quellen einholen: Personen mit Beeinträchtigung

## Übernommen von anderen Teams

## Aktionen

- Interviews mit den Berufslehrer:innen/Ausbilder:innen
- Interviews mit den Auszubildenden führen
- Informationen von anderen Quellen einholen
- **Tasks in Kleingruppen aufteilen**

# DoD wird im Rahmen der Sprint Retrospektive überprüft und sichert Qualität des Produktes

Die DoD-Kriterien (Abnahmekriterien für alle US des Sprints)

- ▶ ... müssen eindeutig sein
- ▶ ... müssen überprüfbar sein
- ▶ ... der Weg zur Abnahme muss festgelegt sein
- ▶ ... und am wichtigsten, von allen Betroffenen akzeptiert werden

Qualität entsteht durch

- ▶ ... Abarbeiten der DoD Punkte und die ständige Anpassung dieser
- ▶ ... die gegebene Transparenz und das gemeinsame Verständnis des Begriffs „Fertig“
- ▶ ... besseres Produkt Verständnis, resultierend durch kontinuierliches Testen

# Workshop: Sprint Retrospektive

Führen Sie eine Sprint Retrospektive durch!


1. Besprechung der persönlichen Favoriten aus den MVP-Vorstellungen → Priorisierung
  - **Ergebnis: mindestens ein Element aus den MVP-Präsentationen der anderen Teams für den nächsten Sprint übernehmen**
2. Auswahl eines Formats für die Durchführung der Sprint Retrospektive
3. Sammlung von Punkten (+ - ) zum vorangegangenen Sprint und von neuen Ideen
4. Bewertung durchführen und Entscheidung treffen, welche besonders wichtigen Verbesserungsvorschläge im nächsten Sprint umgesetzt werden sollen
  - **Ergebnis: 1 – 2 Verbesserungsvorschläge für den nächsten Sprint**
5. Reflexion der DoD (allgemeinen Abnahmekriterien) von Sprint 1 und Überlegung von Veränderungen
  - **Ergebnis: DoD für den nächsten Sprint**

Dauer: 15 Minuten

# Workshop: Sprint Retrospektive – Ergebnisse

- Team 1: Testing Spalte in Taskboard aufnehmen
- Team 2: Feedback stärken
- Team 3: Zeitmanagement verbessern
- Team 4: Mehr Feedback
- Team 5: Verbesserung von UI
- Team 6: Testing

# Sprint Retrospektive: So nicht!

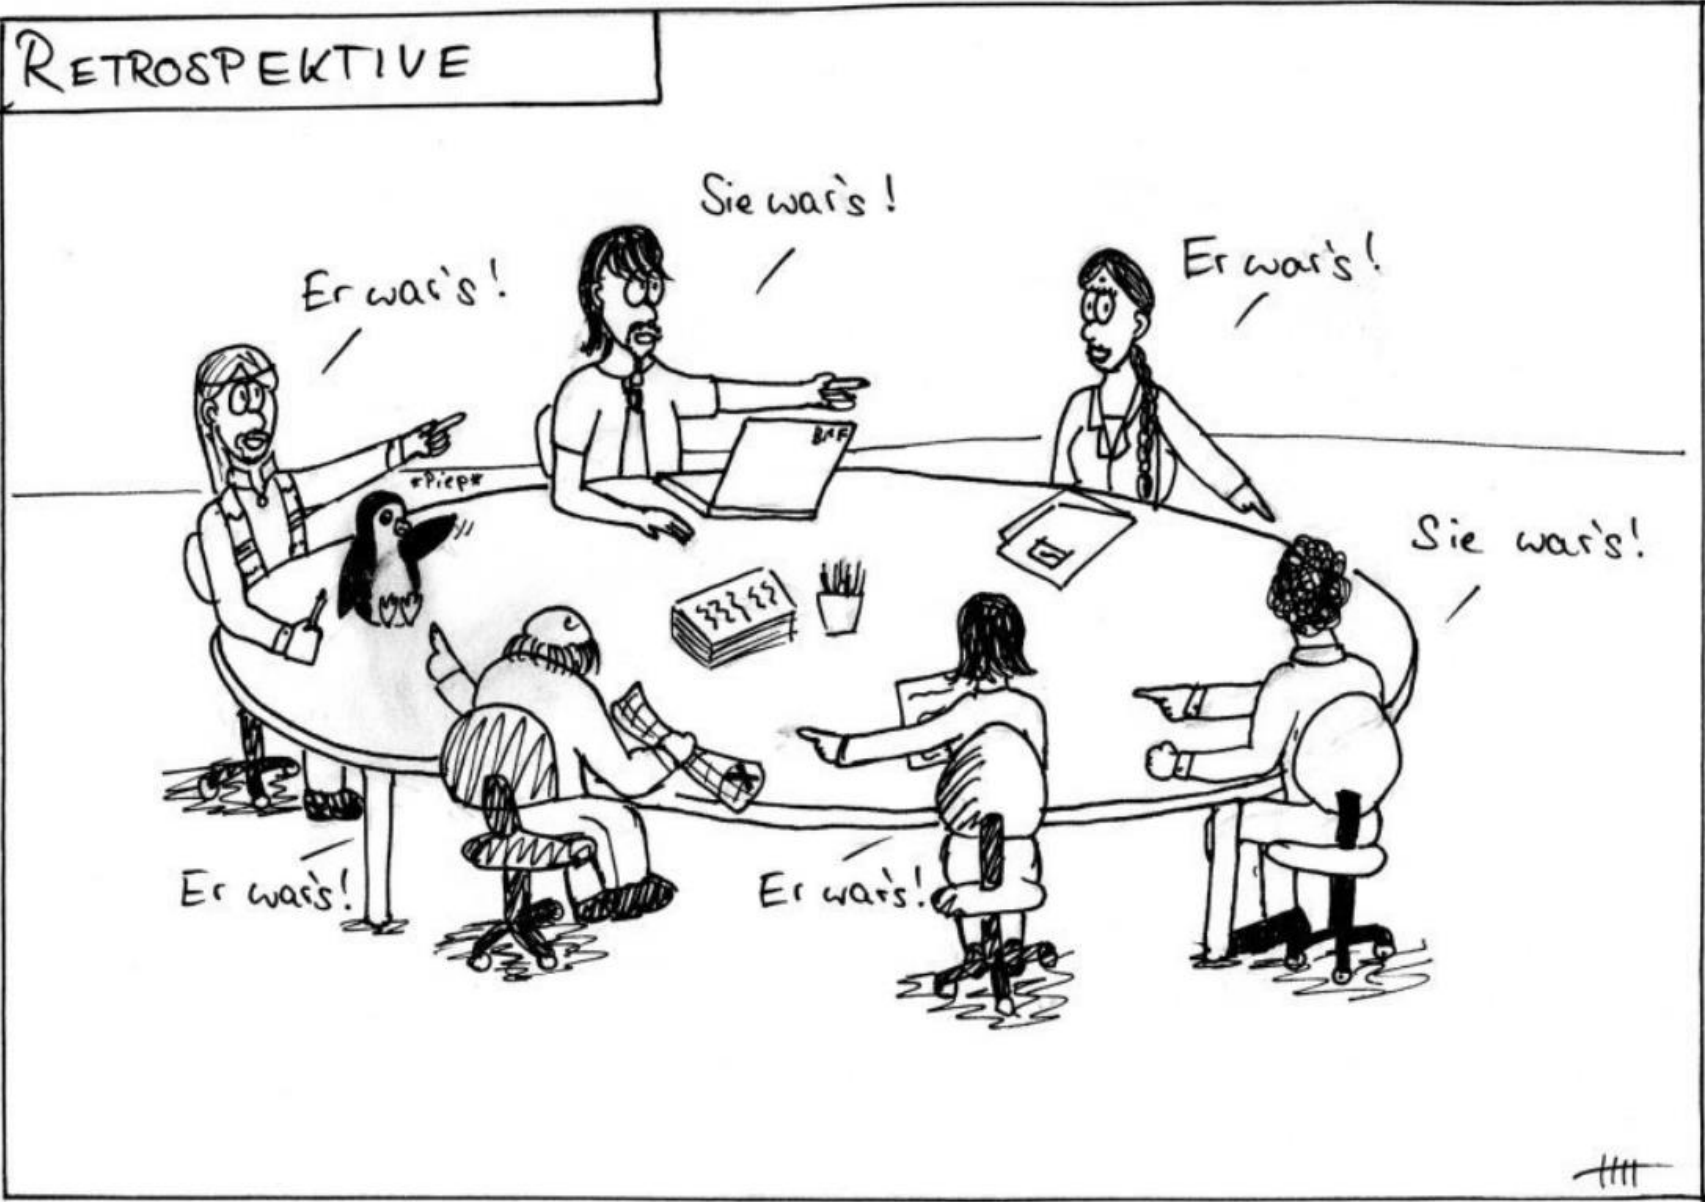

# Velocity (Entwicklungsgeschwindigkeit)

- ▶ Velocity eines Sprints = **Anzahl der Story Points der abgenommenen User Stories des Sprints**
- ▶ Dynamischer Wert, der von Sprint zu Sprint variieren kann
- ▶ Bei neuen Projekten und neuen Teams ist die Velocity schwierig einzuschätzen
- ▶ **Nutzung der Velocity:**



## 1. Planung des nächsten Sprints

- Beim Sprint Planning gibt die Velocity eine Orientierung für die Gesamtzahl der Story Points der für den Sprint ausgewählten User Stories
- Beispiel
  - Bisherige durchschnittliche Velocity beträgt 50 Story Points pro Sprint
  - Im Rahmen des Sprint Plannings werden User Stories ausgewählt, die einen Gesamtumfang von ca. 50+ Story Points haben

## 2. Schätzung der Projektdauer

- Prognose, wie schnell der Product Backlog (BP) vom Team abgearbeitet wird
- $\text{Anzahl notwendiger Sprints} = (\text{Summe der Story Points des PB}) / (\text{Velocity}) - \text{aufgerundet}^*$
- Beispiel
  - Velocity 60 SP; Product Backlog: 195 SP  
→ Anzahl Sprints = 4
  - Bei einer Sprintlänge von 2 Wochen beträgt die Projektdauer 8 Wochen

**\*) Scrum-Guide kennt nur Sprints gleicher Länge, auch der letzte Sprint zählt voll dazu!**



# Impediment Backlog

- ▶ Nützliches Artefakt – nicht im Scrum Guide
- ▶ **Impediment Backlog:**  
**Dynamische Liste der Hindernisse, die die Entwickler bei der Bearbeitung behindern**  
und die von diesen nicht selbst aus dem Weg geräumt werden können
- ▶ **Beispiel**

| Impediment                               | Ersteller | Datum      | Priorität | Status    | Verantwortlicher |
|------------------------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------------|
| Backlog-Pflege unvollständig             | CZ        | 04.04.2026 | hoch      | erledigt  | Product Owner    |
| Neue Hardware (Lautsprecher) benötigt    | JF        | 08.04.2026 | hoch      | In Arbeit | SM               |
| Fehlender Installer behindert User-Tests | AM        | 06.05.2026 | schwach   | Neu       | SM               |

- ▶ Aufgabe des Scrum Masters: Dokumentation und Beseitigung der Impediments

# Time Boxes der Events

| Event                | Sprint-Dauer: 4 Wochen | Sprint-Dauer: 1, 2 oder 3 Wochen |
|----------------------|------------------------|----------------------------------|
| Sprint Planning      | 8 h                    | Entsprechend kürzer              |
| Daily Scrum          | 15 Minuten täglich     | 15 Minuten täglich               |
| Sprint Review        | 4 h                    | Entsprechend kürzer              |
| Sprint Retrospektive | 3 h                    | Entsprechend kürzer              |

# Artefakte enthalten Selbstverpflichtungen

- ▶ Die Artefakte Product Backlog, Sprint Backlog und Increment sind ausgelegt, die Transparenz von Schlüsselinformationen zu maximieren
- ▶ Alle, die diese Informationen überprüfen, haben somit die gleiche Grundlage für Anpassungen
- ▶ **Jedes Artefakt beinhaltet ein Commitment (Selbstverpflichtung)**
  - Damit sollen die Informationen geliefert werden, welche Transparenz und Fokus verbessern, um den Fortschritt messbar zu machen

| Artefakt        | Commitment                | Ersteller     | Verpflichtung für |
|-----------------|---------------------------|---------------|-------------------|
| Product Backlog | <b>Produkt-Ziel</b>       | Product Owner | Scrum Team        |
| Sprint Backlog  | <b>Sprint-Ziel</b>        | Scrum Team    | Developer         |
| Increment       | <b>Definition of Done</b> | Scrum Team    | Developer         |

# VORBEREITUNGEN FÜR SPRINT 2

# Aktualisierung des Product Backlog

## ► Der Product Owner stellt sicher, dass das Product Backlog aktuell ist

- Neue Anforderungen sind berücksichtigt, z.B. Feedback vom Kunden
- Nicht mehr relevante Einträge sind entfernt
- Prioritäten im Backlog sind überprüft: Die wichtigsten Anforderungen stehen an oberster Stelle
- Die Akzeptanzkriterien (spezifische Anforderungen, die erfüllt sein müssen, damit eine User Story als abgeschlossen betrachtet werden kann) der User Stories sind definiert
- Die Größenordnung Product-Backlog-Einträge (BPI)\* ist in Story Points geschätzt  
Developer sind für die Größenbestimmung verantwortlich

## ► Refinement des Product Backlogs

- Zu große Product-Backlog-Einträge (BPI) werden in kleinere, präzisere Elemente zerlegt  
Für einen Sprint können nur solche BPIs ausgewählt werden,  
die innerhalb des Sprints abgeschlossen (Done) werden können

\*) Zur Erinnerung: User Stories sind spezifische Product-Backlog-Einträge (BPI). Andere PBIs können technische Aufgaben, Bug fixes oder andere Arten von Aufgaben umfassen, die für die Entwicklung des Produkts erforderlich sind

# Workshop: Voraussetzungen für Sprint 2 schaffen

Jedes Team

- a) identifiziert **ein besonders wichtiges Impediment** (Hindernis) des 1. Sprints
- b) berechnet die **Velocity** des 1. Sprints (Summe der erledigten User Stories)
- c) aktualisiert seinen **Product Backlog**

Dauer: 15 Minuten


**Chat Storm:** Product Owner schreiben die Ergebnisse von a) und b) in den Chat:

Team #: < ein Impediment des 1. Sprints >; < Anzahl > SP

- Team 1:
- Team 2:
- Team 3:
- Team 4:
- Team 5:
- Team 6:

# SPRINT PLANNING 2


# Sprints folgen direkt hintereinander

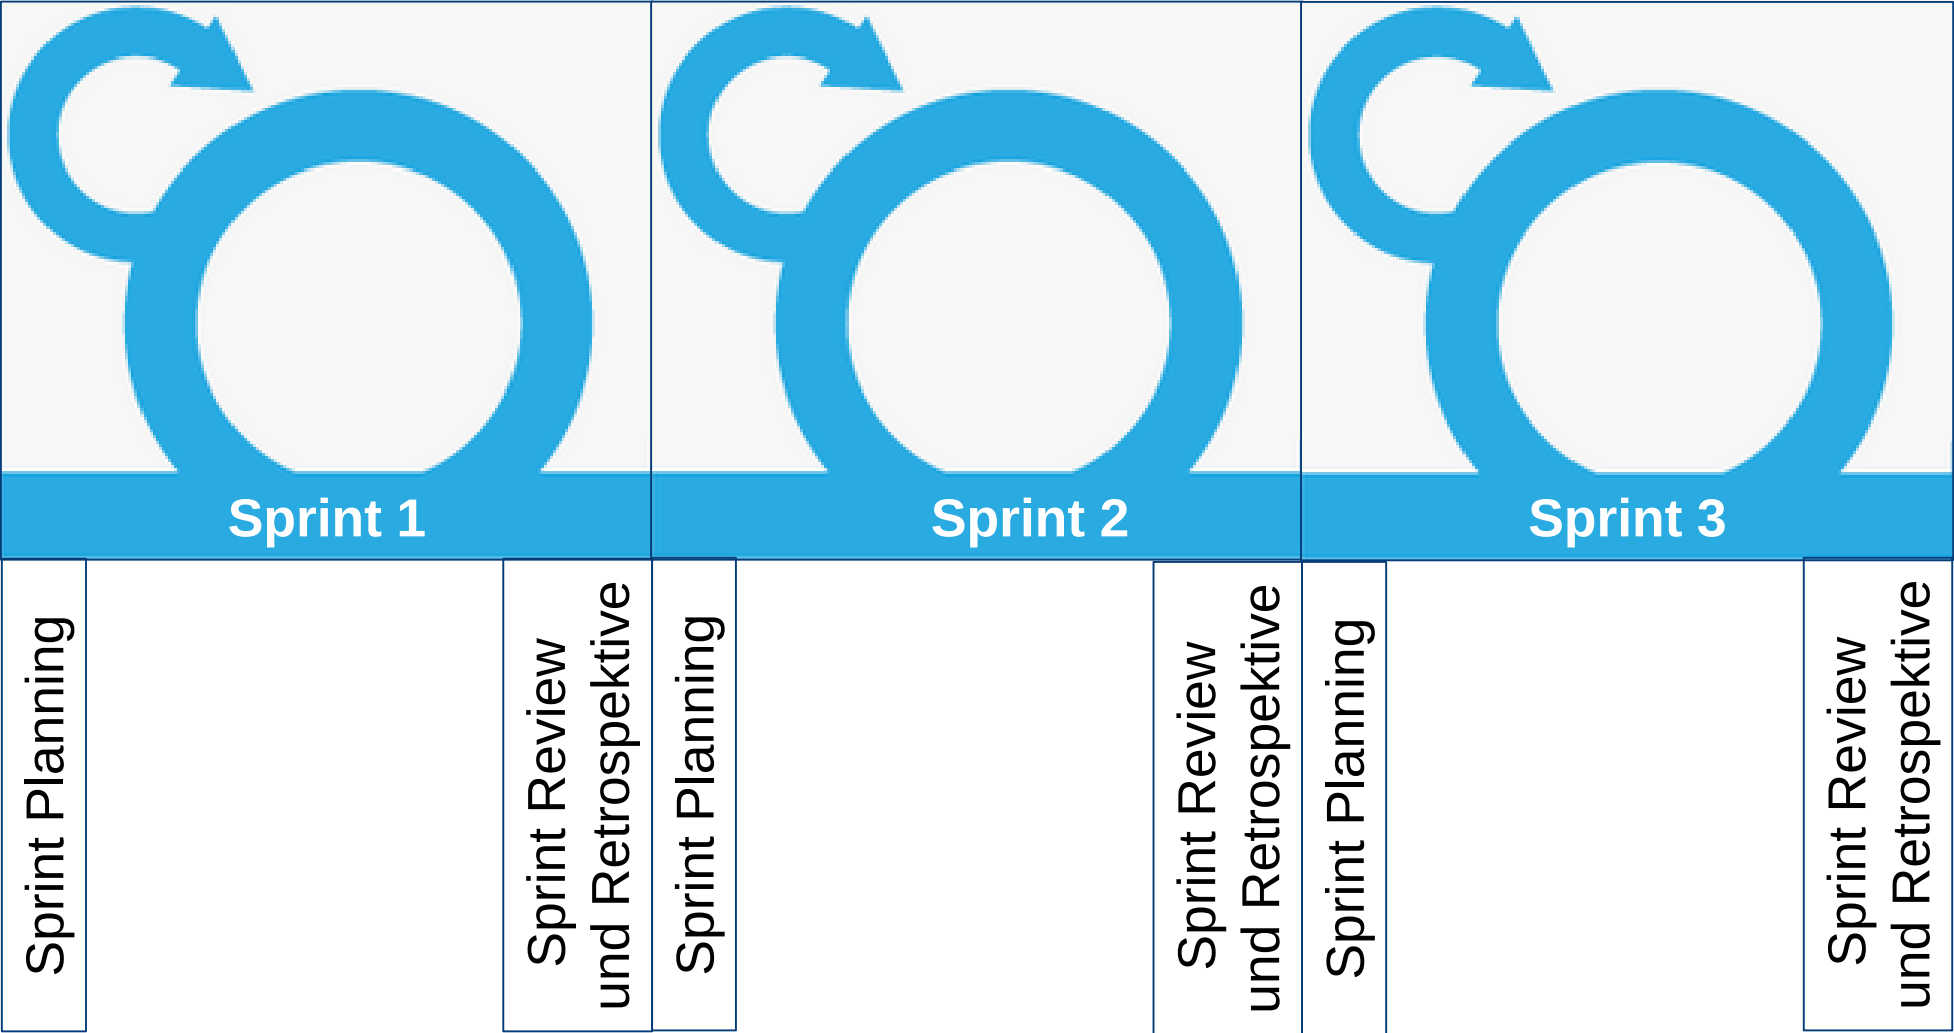



## 1. Warum ist dieser Sprint für die Stakeholder wertvoll?

- Product Owner macht einen Vorschlag
- Scrum Team erarbeitet ein **Sprintziel**



## 2. Was kann in diesem Sprint abgeschlossen werden?

- Aus dem Product Backlog wählen die Developer mit dem PO hochpriorisierte Einträge (PBI) aus, die in den aktuellen Sprint aufgenommen werden sollen
- Das Scrum Team kann diese Einträge verfeinern, um das Verständnis zu erhöhen

## 3. Wie wird die ausgewählte Arbeit erledigt?

- Zu jedem ausgewählten BPI planen die Developer die notwendige Arbeit, um ein Increment zu erstellen
  - Die Product Backlog-Einträge werden in Developer-Tasks zerlegt
- ▶ **Das Sprint-Backlog** besteht aus Sprintziel, ausgewählten Product Backlog-Einträgen und dem Umsetzungsplan – visualisiert durch **Taskboard**
  - ▶ **Timebox:** 8 h für 1-monatigen Sprint; bei kürzeren Sprints in der Regel kürzer
  - ▶ **Teilnehmer:** Scrum Team, ggf. weitere Personen

# Sprint Planning 2

## Vorbereitungen

- **Feedback** des Auftraggebers – möglichst auch von Anwendern – zum MVP einholen und damit **Product Backlog aktualisieren**
- **Komplexität** der BPI in **Story Points** schätzen, ggf. zu große US **verfeinern**
- **Priorität** der BPI nach dem **MuSCoW Prinzip** festlegen
- **Akzeptanzkriterien** für die User Stories des 2. Sprints festlegen – sofern noch nicht geschehen

## Sprint Planning 2

1. **Sprintziel 2** festlegen
2. **Sprint Backlog erstellen:** Auswahl der User Stories zur Erreichung des Sprintziels (Velocity des 1. Sprints berücksichtigen)
3. **Entwickler-Tasks** zur Erledigung der User Stories des 2. Sprints ermitteln und **neues Taskboard** anlegen

# Sprint Planning 2

## 1. Sprintziel 2 festlegen

|                                                                                                                                                          |                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SPRINTZIEL</b><br>Hier wird das Sprintziel festgelegt.<br>z.B. Realisierung eines Prototypen, Implementierung eines Features, Analyse eines Problems. | <b>PRODUKTNAME</b><br>Hier wird das Produkt festgelegt.                            |
| <b>HERANGEHENSWEISE</b><br>Hier wird die Herangehensweise festgelegt.<br>z.B. Scrum, Kanban, Hybrid, etc.                                                | <b>SPRINT</b><br>Hier wird der Sprint festgelegt.<br>z.B. Sprint 1, Sprint 2, etc. |
| <b>ÜBERPRÜFUNG</b><br>Hier wird die Überprüfung festgelegt.<br>z.B. Review, Demo, etc.                                                                   |                                                                                    |

## 2. Sprint Backlog erstellen: Auswahl der User Stories zur Erreichung des Sprintziels (Velocity des 1. Sprints berücksichtigen)

## 3. Tasks zur Erledigung der User Stories des 2. Sprints ermitteln und **neues Taskboard** anlegen

| User Stories                                                | To Do                                              | In Progress             | Done                    | Done - Sprint 1         |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| User Story #1 - Terminkalender                              | Task #6 - Mockup Projektübersicht                  | + Eine Karte hinzufügen | + Eine Karte hinzufügen | + Eine Karte hinzufügen |
| User Story #2 - Verbesserung Projektübersicht               | Task #7 - Projekte der Stadt in Übersicht einfügen |                         |                         |                         |
| User Story #3: Diskussionsplattform                         | Task #1: Design Diskussionsplattform               |                         |                         |                         |
| User Story #4 - Projektbeiträge verfasse, teilen und suchen | Task #2: Recherche nach Open-Source Lösung         |                         |                         |                         |
| User Story #5 - Ergebnisse werden veröffentlicht            | Task #3: Integration auf Website                   |                         |                         |                         |

# Workshop: Formulieren Sie ein Sprintziel für den 2. Sprints / Chat Storm

- Team 4: Auftraggeber + User interviews führen, auswerten und Features implementieren
- Team 1: Eine Variation einer Fertigen Pipeline zur PDF Zerlegung.
- Team 4: Dokumentenerstellung, Weitere Kernfeatures nach Absprache mit Auftraggeber.
- Team 4: Vollständige Dokumente aus App generieren für Vorlage bei Arztbesuchen
- Team 5: ready for a hand full real users
- Team 1: Fallerstellung und basic backend implementiert
- Team 3: identifizierte Pain Points aus Usertests beheben
- Team 2: Weitere Optimierung der Web-App unter Berücksichtigung von externem Feedback
- Team 2: Feedback und Iteration mit potentiellen Nutzenden
- Team 1: Prototyp fertig machen und erste Umsetzung ausarbeiten
- Team 3: Input von Sportpsycholog\*innen bekommen haben und Nutzertests durchgeführt haben
- Team 6: Deliver anomaly detection for uploaded documents, a document detail view with extracted fields, a searchable My Documents page, and improve upload UX — all 100% browser-local.
- Team 3: Optimierung des Mvps
- Team 2: Vorliegender MVP mit Designideen verbinden und es auf allen Rechnern laufen lassen zu können
- Team 3: Feedback der Athleten einarbeiten und Sportpsychologen Feedback einholen
- Team 6: Anomaly detection, document detail view, My Documents page, and upload UX improvements — maintaining 100% local processing
- Team 2: Feedback von potenziellen Nutzern & Hosting geklärt

# Workshop: Sprintziel 2

Schreiben Sie Ihr **Sprintziel** in das Template und ergänzen Sie die anderen Felder

- ▶ **Produktname:** = Ihr Projektname
- ▶ **Sprint:** Sprint 2 vom 18.05. – 15.06.2026
- ▶ **Herangehensweise** ...
- ▶ **Überprüfung** ...

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SPRINTZIEL</b><br><small>Warum führen wir diesen Sprint durch?<br/>- z.B. Auslieferung eines Features, Optimierung, Adressierung eines Risikos, Validierung einer Annahme</small>                                                                                                                                              |  <b>PRODUKTNAME</b><br><small>Wie heißt das Produkt?</small>                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>SPRINT</b><br><small>Sprintname oder Nummer des Sprints,<br/>ggfs. Von/Bis-Datum</small>                                                                                                          |
| <b>HERANGEHENSWEISE</b><br><small>Wie wollen wir das Sprintziel erreichen? Welche Artefakte werden erstellt?<br/>z.B. Click-Dummy, Produkt-Inkrement, Usability-Test, A/B-Test,<br/>User-Test (interne Stakeholder, Testkunden), etc.</small>  | <b>ÜBERPRÜFUNG</b><br><small>Wie überprüfen wir, ob wir das Sprintziel erreicht haben?<br/>z.B. Performance-Messungen,<br/>3 von 5 Test-Usern haben den Workflow komplett durchlaufen, etc.</small>  |

Dauer: 10 Minuten

# Beispiel

## Sprint-Ziel für den 2. Sprint

|                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SPRINTZIEL</b><br><small>Warum führen wir diesen Sprint durch?<br/>z.B. Auslieferung eines Features, Optimierung, Adressierung eines Risikos, Validierung einer Annahme</small>                                                                     |  <b>PRODUKTNAME</b><br><small>Wie heißt das Produkt?</small>                                                                                                                                         |  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>- User Interface weiter optimieren</li><li>- zusätzliche Features einfügen</li><li>- Barrierefreiheit</li><li>- Integration in analoge Prozesse</li></ul>                                                        | <b>Mach mit!</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>SPRINT</b><br><small>Sprintname oder Nummer des Sprints,<br/>ggfs. Von/Bis-Datum</small>                                                                                                                                                                                           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Sprint 2: 31.05. - 27.06.</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |
| <b>HERANGEHENSWEISE</b><br><small>Wie wollen wir das Sprintziel erreichen? Welche Artefakte werden erstellt?<br/>z.B. Click-Dummy, Produkt-Inkrement, Usability-Test, A/B-Test,<br/>User-Test (interne Stakeholder, Testkunden), etc.</small>          |  <b>ÜBERPRÜFUNG</b><br><small>Wie überprüfen wir, ob wir das Sprintziel erreicht haben?<br/>z.B. Performance-Messungen,<br/>3 von 5 Test-Usern haben den Workflow komplett durchlaufen, etc.</small> |  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Recherche Umsetzbarkeit der Features</li><li>- Mock-Up erstellen zur Visualisierung</li><li>- Koordination mit Auftraggeber zu Ausprägung der Features</li><li>- Integration auf Website vorbereiten</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Klare Feststellung einer verbesserten Website durch eine Testperson</li><li>- Für alle Features sind Design Mock-Ups, Integration auf Website und Umsetzbarkeit definiert</li></ul>                                                           |                                                                                     |

## Sprint Backlog und geplante Velocity

|                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| <b>MUST HAVE</b>                                      |    |
| User Story #4: Projektbeiträge verfassen und suchen   | 5  |
| User Story #9: Barrierefreiheit                       | 13 |
| User Story #10: Hybride Veranstaltungen               | 5  |
| User Story #11: FAQ Sektion                           | 5  |
| Geplante Minimale Velocity                            | 28 |
| <b>SHOULD HAVE</b>                                    |    |
| User Story #12: Feedback Kanal                        | 13 |
| User Story #14: Notification System mit Opt-In Option | 20 |
|                                                       | 61 |

## Sprint #2: Sprint Backlog nach MuSCow-Prinzip

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>User Story #4: Projektbeiträge verfassen und suchen</b><br><i>Als <u>Bürger:in</u> möchte ich einfach Projektbeiträge finden und mit ihnen interagieren können, um mitentscheiden und diskutieren zu können.</i>                                                                               | 5  |
| <b>User Story #9: Barrierefreiheit</b><br><i>Als <u>Bürger:in</u> möchte ich barrierefrei auf die Webseite zugreifen können, um mich in jeder Situation einfach und unabhängig von Beeinträchtigungen über die Projekte informieren zu können.</i>                                                | 13 |
| <b>User Story #10: Hybride Veranstaltungen</b><br><i>Als <u>Bürger:in</u> möchte ich Versammlungen per Stream verfolgen, sowie online bei diesen mit diskutieren und abstimmen können, um auch von zu Hause an den Versammlungen vollumfänglich teilnehmen zu können.</i>                         | 5  |
| <b>User Story #11: FAQ Sektion</b><br><i>Als <u>Bürger:in</u> möchte ich erklärt bekommen, wie ich die Webseite und die Diskussionsplattform nutzen kann, um mich beteiligen zu können und einfach auf der Webseite zurecht finden kann.</i>                                                      | 5  |
| <b>User Story #12: Feedback Kanal</b><br><i>Als <u>Bürger:in</u> möchte ich meine Meinung zur Webseite und Umsetzung der digitalen Bürgerbeteiligung teilen, um stetig zur Verbesserung der Webseite beizutragen, damit Bürgerbeteiligung möglichst einfach im digitalen Raum geschehen kann.</i> | 13 |
| <b>User Story #14: Notification System mit Opt-In Option</b><br><i>Als <u>Bürger:in</u> möchte ich ein <u>Notification</u> System mit <u>Opt-In</u> Option haben, um die Möglichkeit zu haben, für ausgewählte Projekte eine Benachrichtigung zu neuen Projektergebnissen zu erhalten.</i>        | 20 |

## User Tasks – Must Have

| User Story #4: Projektbeiträge verfassen und suchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | User Story #9: Barrierefreiheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><b>User Story #4</b><br/>Task #1 - User Surface<br/>👁 ⌚ 27. Jun. ☰ 💬 1</div> <div><b>User Story #4</b><br/>Task #2 - Filter Möglichkeiten<br/>👁 ⌚ 27. Jun. ☰ 💬 2</div> <div><b>User Story #4</b><br/>Task #3 Maske für Diskussionsbeitrag<br/>⌚ 27. Jun. ☰</div> <div><b>User Story #4</b><br/>Task #4 Verlinkung von Projekt zu Diskussionsbeitrag<br/>👁 ⌚ 27. Jun. 💬 1</div> | <div><b>User Story #9</b><br/>Task #1 - Button für leichte Sprache<br/>⌚ 27. Jun.</div> <div><b>User Story #9</b><br/>Task #2 - Erklärung von Optionen in leichter Sprache</div> <div><b>User Story #9</b><br/>Task #3 - Vorlesefunktionoption einfügen</div> <div><b>User Story #9</b><br/>Task #4 - (Bei Terminkalender auf Barrierefreiheit achten (Rahmenbedingungen, Karten, Zusammenfassung von Veranstaltungen))</div> |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Verständliche und einfache Gestaltung</li><li>• Filter: Ort, Projektart etc.</li><li>• Fehlertoleranz bei der Suche</li></ul>                                                                                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"><li>• Recherche nach Einbindung leichter Sprache</li><li>• Einbindung Vorlesefunktion</li><li>• Barrierefreiheit nicht nur bei Projektbeschreibungen ermöglichen, sondern auch im Termin-Kalender, FAQ etc.</li></ul>                                                                                                                                                                       |

# AUFGABE 5

# Aufgabe 5: Vorbereitungen

1. Prüfen Sie, welches Element eines anderen Teams aus dem heutigen Sprint Review Sie für Ihr Projekt adaptieren wollen
2. Führen Sie eine **Retrospektive** des 1. Sprints durch  
Ergebnisse: **Verbesserungsmaßnahme + DoD für 2. Sprint**
3. Berechnen Sie die Velocity des 1. Sprints
4. *Optional*: Stellen Sie potentiellen Anwendern Ihr MVP vor und holen Sie **Feedback** ein
5. Aktualisieren Sie Ihren **Product Backlog** – in Vorbereitung auf Sprint Planning 2
6. Führen Sie das **Sprint Planning 2 – Meeting** durch



# Aufgabe 5a: Retrospektive, Backlog-Aktualisierung, Sprint Planning 2

Erstellen Sie eine **Präsentation** [Sprint2-Team\\_x](#) mit folgenden Inhalten:

- 1. Ergebnisse Retrospektive des 1. Sprints** (incl. Verbesserungsvorschlag und DoD für Sprint 2)
- 2. Aktualisiertes Product Backlog** – in Vorbereitung auf Sprint Planning 2
  - User Stories des Product Backlog sind nach dem **MuSCoW Prinzip** priorisiert
  - Komplexität der User Stories des Product Backlog sind in **Story Points** geschätzt
- 3. Ergebnisse vom Sprint Planning 2**
  - 2. Sprintziel
  - Sprint Backlog: User Stories zur Erreichung des Sprintziels (Velocity des 1. Sprints berücksichtigen!)
  - Akzeptanzkriterien für alle User Stories des Sprint Backlog – mindestens 2 AK pro US
  - Taskboard für Sprint 2
- 4. Reflexion der Prozesse und Ergebnisse**
- 5. Nächste Schritte**

Upload auf WueCampus bis 30.05.2026 / 23:55: [Sprint2-Team\\_x](#)

Präsentation am 01.06.2026 durch die Product Owner der **Teams 3 und 4**  
(Dauer: max. 8 Minuten)

# Hinweise zur Aufgabe 5a

- ▶ Bitte vor der Abgabe stets prüfen, ob alle Teile der Aufgabe bearbeitet wurden
- ▶ DoD: Katalog von Abnahmekriterien, mit denen alle User Stories auf „Done“ geprüft werden
- ▶ Durchgängigkeit der Nummerierung der US und zugehörigen Tasks
  - bei den Einzelbeschreibungen von US mit zugehörigen Task
  - bei der Angabe der SP und Prio nach MuSCoW
  - im Taskboard
- ▶ Check: Wenn alle Tasks einer US erfüllt sind, ist dann die US vollständig realisiert?
- ▶ Neues Taskboard
  - Am Ende des Sprint Plannings wird ein neues Taskboard für den neuen Sprint angelegt
  - Die in diesem Sprint zu erledigenden Tasks werden in die „todo“-Spalte eingetragen
  - Die im Sprint zuvor erledigten US sind nicht Bestandteil des neuen Taskboards
  - Empfehlung: USx → Tx.1, Tx.2, Tx.3 plus farbliche Kennzeichnung

# Aufgabe 5b: Projektbericht

Erstellen Sie Kapitel 4 des Projektberichtes!

## 4. Scrum (Sprint 1 und Sprint 2)

- Agiles Manifest und agile Werte
- Scrum
  - Theorie und Werte
  - Rollen
  - Artefakte
  - Events
  - Ergänzungen zum Scrum-Guide
- Anwendung von Scrum im Projekt
  - Sprint 1: Sprint Planning, Sprint Review, Sprint Retrospective
  - Sprint 2: Sprint Planning, Sprint Review, Sprint Retrospective
- Reflexion Prozesse und Ergebnisse

## Inhaltsverzeichnis

|                                         |
|-----------------------------------------|
| 1. Einleitung .....                     |
| 2. Projektdesign mit dem Project Canvas |
| 3. Lean Startup und Story Mapping ..... |
| 4. Scrum (Sprint 1 und Sprint 2) .....  |

u.a. Sprintziele, Taskboards, DoD, Velocity, User Stories mit Akzeptanzkriterien, Story Points und Priorisierung, Impediment Backlog, Sprint Retrospektive, Feedback von Auftraggeber / Anwendern

Upload auf WueCampus bis 15.06.2026 / 23:55: **PB-3-Team\_x**
