

Professionelles Projektmanagement in der Praxis - Mit digitalen Unternehmensgründungsprojekten

Prof. Dr. Harald Wehnes

Veranstaltung 6 (01.06.2026)

- **Projektstart, Projektziele, Projektsteckbrief**
- **Projektumfeld und Stakeholdermanagement**

Partner:

Servicezentrum
Forschung und
Technologietransfer
(SFT)


Innovations- & Gründerzentrum
WÜRZBURG

 **ZDI**
ZENTRUM
FÜR DIGITALE INNOVATIONEN
MAINFRANKEN

Information zu allen Vorlesungen

- **Wir starten jede Vorlesung auf die Minute pünktlich!**
- Bitte rechtzeitig einwählen.
- Videokamera bitte einschalten – Bei Gruppenarbeit immer einschalten!
- Mikrofone bitte stumm schalten, wenn vorgetragen wird
- Fragen / Anmerkungen / Rückmeldungen per Handzeichen-Symbol oder über den Chat
- Die Vorlesung wird aufgezeichnet und auf WueCampus zur Verfügung gestellt (nur für Vorlesungsteilnehmer!)
Die Aufzeichnungen beschränken sich in der Regel auf die Vorträge des Dozenten.
Studentische Vorträge werden für den Dozenten zur Benotung aufgezeichnet;
diese Vorträge werden nicht auf WueCampus gestellt.
- Bitte Bescheid geben, wenn jemand verhindert ist
- Themen der Workshops haben hohe Relevanz für die Klausur

Zeitplan

12:15 Organisatorisches

- Aufgabe 5: Ergebnisse von Team 3 und 4 (Präsentationen)
- Stand-up Meeting der Product Owner der anderen Teams

13:00 Projektmanagement: Grundbegriffe

13:15 Projektstart, Projektsteckbrief, Projektziele

13:45 – 14:15 Pause



14:15 Projektumfeld

14:45 Stakeholdermanagement

15:45 Ende



Template: Projektsteckbrief



Template Umfeldanalyse



Template Stakeholderanalyse



Template Stakeholderportfolio

Vortragstermine (Stand: 30.05.2026)



Name	Anzahl Mitglieder	20.04.	27.04.	04.05.	18.05. MVP1	01.06.	08.06.	15.06. MVP2	22.06.	29.06.	06.07.	13.07. Projektiade
1 - Mindocu	5	1			1			1		1		2
2 - Musikstadt Würzburg	5			1	1			1		1		2
3 - Mind League	7		1		1	1		1	1		1	2
4 - Patienten akte	6		1		1	1		1	1			2
5 - Funeral Compass	6			1	1		1	1			1	2
6 - Data Digitalization	6			1	1		1	1		1		2

Jedes Team mit n Teammitgliedern hat n+1 Vorträge

Aufgabe 5a: Retrospektive, Backlog-Aktualisierung, Sprint Planning 2

Erstellen Sie eine **Präsentation** [Sprint2-Team_x](#) mit folgenden Inhalten:


- 1. Ergebnisse Retrospektive des 1. Sprints** (incl. Verbesserungsvorschlag und DoD für Sprint 2)
- 2. Aktualisiertes Product Backlog** – in Vorbereitung auf Sprint Planning 2
 - User Stories des Product Backlog sind nach dem **MuSCoW Prinzip** priorisiert
 - Komplexität der User Stories des Product Backlog sind in **Story Points** geschätzt
- 3. Ergebnisse vom Sprint Planning 2**
 - 2. Sprintziel
 - Sprint Backlog: User Stories zur Erreichung des Sprintziels (Velocity des 1. Sprints berücksichtigen!)
 - Akzeptanzkriterien für alle User Stories des Sprint Backlog – mindestens 2 AK pro US
 - Taskboard für Sprint 2
- 4. Reflexion der Prozesse und Ergebnisse**
- 5. Nächste Schritte**

Upload auf WueCampus bis 30.05.2026 / 23:55: [Sprint2-Team_x](#)

Präsentation am 01.06.2026 durch die Product Owner der Teams 3 und 4

(Dauer: max. 8 Minuten)

Lean Startup: Erfolgsfaktor „Kunden-Kontakt und Feedback“

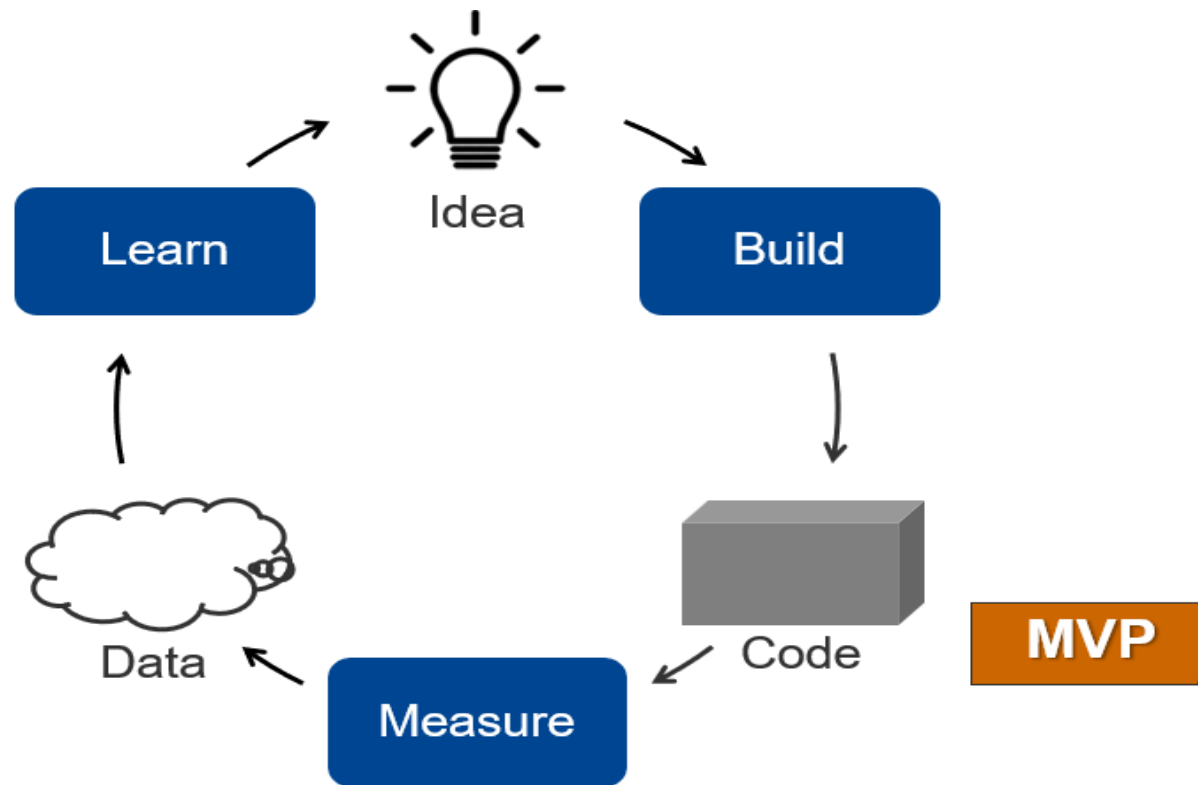


Realitätscheck
mit echten Kunden unter möglichst realen Marktbedingungen

Get out of your building!

Feedback zu den Lösungen der Aufgabe 5a

- ▶ Unterschiedliche Qualität: gut mit punktuellen Mängeln bis vorbildlich
- ▶ **Bitte stets prüfen, ob alle Teile der Aufgabe bearbeitet wurden!**
 - Es fehlten teilweise: neues Product Backlog, DoD, Priorisierung nach MuSCoW-Prinzip
- ▶ **Durchgängigkeit der Nummerierung der US und zugehörigen Tasks beachten:**
Gleiche Nummerierung im Taskboard, bei der Angabe der SP und Prio nach MuSCoW und bei den Einzelbeschreibungen von US mit zugehörigen Tasks
- ▶ Empfehlung: Nur ganzzahlige Nummern bei der Nummerierung der User Stories verwenden
- ▶ Im aktualisierten Product Backlog stehen **keine bereits erledigte US**
- ▶ Teilweise Probleme mit „Velocity“
 - Velocity = Summe der Story Points aller im Sprint abgeschlossenen User Stories
- ▶ Testing ist grundsätzlich eine Spalte nicht eine Einzeltask
- ▶ **Reflexion der Ergebnisse: muss sich auf **ERGEBNISSE der Aufgabe** fokussieren;**
hier: Sprint Retrospective, neues Product Backlog, Ergebnisse des Sprint Planning

Stand-Up-Meeting zum Projekt-Status mit den Product Ownern

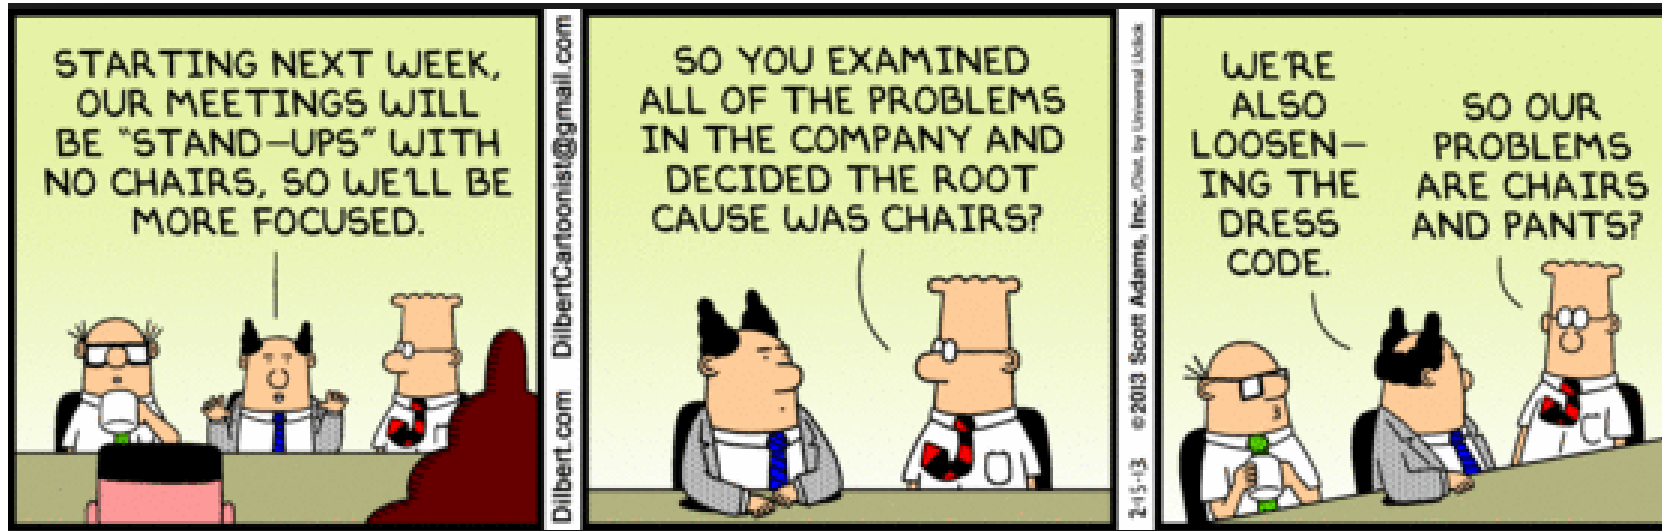

Product Owner
Teams 1,2,5,6

Stand-Up-Meeting (max. 3 Minuten pro PO)



Quelle:
<https://agilefellow.com/2016/06/30/daily-scrum-personas/>

- *Was hat das Team seit der letzten Vorlesung erarbeitet?*
- *Was waren die wichtigsten Ergebnisse aus den Anwendertests und/oder Auftraggeber-Feedbacks?*
- *Was plant das Team, bis zur nächsten Vorlesung zu tun?*
- *Was behindert das Team bei der Arbeit (Impediments)?*

Vorstellung der MVPs am 15.06.2026

Zeit	Team	Projekt	Wissenstransfer <i>Präsentationen aller Teams aktiv begleiten: Jeder Teilnehmer soll mindestens ein „Element“ bei einem anderen Team identifizieren, das er für geeignet findet, um es im eigenen Projekt zu übernehmen</i>
12:20 – 12:30	6	Data Digitalization	
12:30 – 12:40	5	Funeral Compass	
12:45 – 12:55	4	Patientenakte	
12:55 – 13:05	3	MindLeague	
13:10 – 13:20	2	Musikstadt Würzburg	
13:20 – 13:30	1	Mindocu	


PROJEKTMANAGEMENT: GRUNDBEGRIFFE

Historische Projekte

Bau der ägyptischen Pyramiden (2550 – 1550 v. Chr.)


z.B. Cheops-Pyramide

- 146 m Höhe, 2,3 Mio. Steinquader
- 20 Jahre Bauzeit
- ca. 100.000 Arbeiter/Sklaven



Turmbau zu Babel (600 v. Chr.)

- » *Stufentempel in den Himmel*
- » *Gescheitertes Projekt* - wegen babylonischer Sprachverwirrung



Landung des ersten Menschen auf dem Mond (1969)

- » Apollo-**Programm** (1968 – 1972)
- » Schrittweise Realisierung des Ziels
- » 2.000 Institutionen und Firmen
- » 300.000 Beschäftigte; 25 Mrd. \$



Elbphilharmonie 2016

Projektmanagement – heute

► Projekte in Unternehmen

- Entwicklung neuer Produkte
- Entwicklung neuer Dienstleistungen
- Abwicklung von Kundenaufträgen (Bau, Anlagenbau)
- Forschungs- und Entwicklung in der Automobilindustrie
- Neuorganisation des Unternehmens / einer Abteilung
- Planung einer Veranstaltung einer Event-Agentur
- **Verwirklichung komplexer Unternehmensziele**

► Staatliche Projekte

- Gemeinde-, Landes-, Bundes- und EU-Projekte
- Hochschulprojekte (Verwaltung, Forschung)

► Projekte von Gemeinnützigen Organisationen

► Private Projekte

- Bau / Umbau eines Hauses
- Organisation einer Feier oder einer Sportveranstaltung



**Projektifizierung
von Wirtschaft
und Gesellschaft**

Was ist ein Projekt?

DIN 69901-5, 2009:

„**Vorhaben**, das im wesentlichen durch **Einmaligkeit** der Bedingungen in ihrer Gesamtheit gekennzeichnet ist, wie zum Beispiel

- Zielvorgabe
- Projektspezifische Organisation
- Zeitliche, finanzielle, personelle oder andere Begrenzungen.“

Anmerkung:

Viele Unternehmen haben unternehmensspezifische Projekt-Definitionen entwickelt, insbesondere zur Abgrenzung von Projekt- und Linienarbeit


Zum Schmunzeln:

Ein Forscher wollte wissen, ob "das Projekt" eher männliche oder eher weibliche Eigenschaften hat.

Die befragten Männer meinten, dass Projekte weiblich seien. Begründung: "*Projekte sind wie Frauen: Sie sind kostspielig und unpünktlich. Außerdem machen sie nicht das, was man von ihnen erwartet.*"

Die befragten Frauen hingegen waren der umgekehrten Meinung, dass Projekte männlich seien. Begründung: "*Projekte sind wie Männer: Sie versprechen, was sie nicht halten können, geben großkotzig mit jeder Kleinigkeit an. Außerdem wollen sie für jedes noch so kleine Ergebnis bewundert werden.*"

Merkmale von Projekten

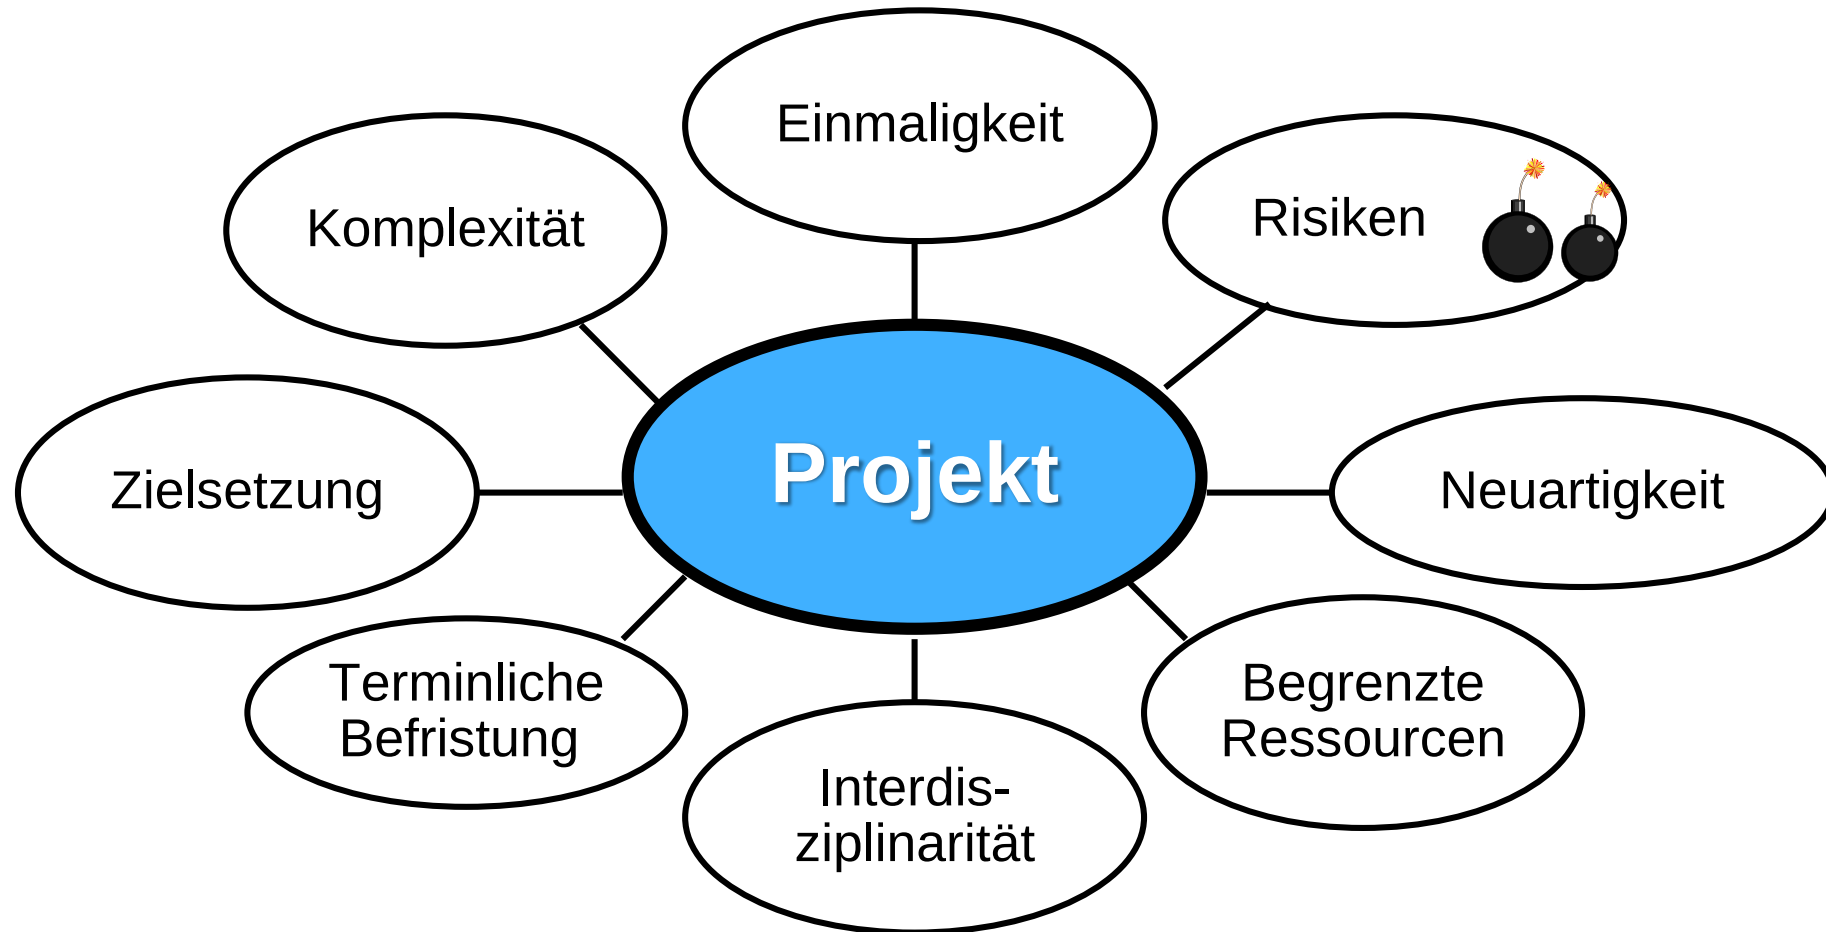

Wann liegt kein Projekt vor?

► Projekt-Kriterien

- Einmaligkeit des Vorhabens
- Komplexität
- Zeitliche Begrenzung
- Zielsetzung
- Begrenzte Ressourcen
- Risiken
- Neuartige, außergewöhnliche Aufgabe

► Kein Projekt

- Regelmäßige Betriebsabläufe
- Fließbandfertigung
- Serviceleistungen
- Routinetätigkeiten
- Linienaufgaben

Beispiele:

- Entwicklung eines neuen Auto-Modells: **Projekt**
- Serienherstellung des neuen Modells: **kein Projekt**
- Optimierung der Auto-Klimaanlage: **Projekt**
- Neues Serverkonzept entwickeln und einführen: **Projekt**
- Serverbetrieb: **kein Projekt**
- Versand der in einem Webshop bestellten Produkte: **kein Projekt**
- Aufbau eines Webshops: **Projekt**

Wann liegt kein Projekt vor?

► Projekt-Kriterien

- Einmaligkeit des Vorhabens
- Komplexität
- Zeitliche Begrenzung
- Zielsetzung
- Begrenzte Ressourcen
- Risiken
- Neuartige, außergewöhnliche Aufgabe

► Kein Projekt

- Regelmäßige Betriebsabläufe
- Fließbandfertigung
- Serviceleistungen
- Routinetätigkeiten
- Linienaufgaben

Beispiele:

- Entwicklung eines neuen Auto-Modells:
- Serienherstellung des neuen Modells:
- Optimierung der Auto-Klimaanlage:
- Neues Serverkonzept entwickeln und einführen:
- Serverbetrieb:
- Versand der in einem Webshop bestellten Produkte:
- Aufbau eines Webshops:

Definition: Projektmanagement

Projekt

- Einmaligkeit
- Klares Ziel
- Komplexität der Aufgabe
- Begrenzungen
- Risiko

Management

- Zielsetzung
- Führung
- Organisation
- Planung
- Steuerung

Projekt-Management


DIN 69901-5, 2009: „Gesamtheit von

- *Führungsaufgaben,*
- *Führungsorganisation,*
- *Führungstechniken und Führungsmitteln*

für die Initialisierung, Definition, Planung, Steuerung und den Abschluss von Projekten.“

Projektmanagement ist eine Methoden-unterstützte Führungsdisziplin

Projekt, Programm, Projektportfolio

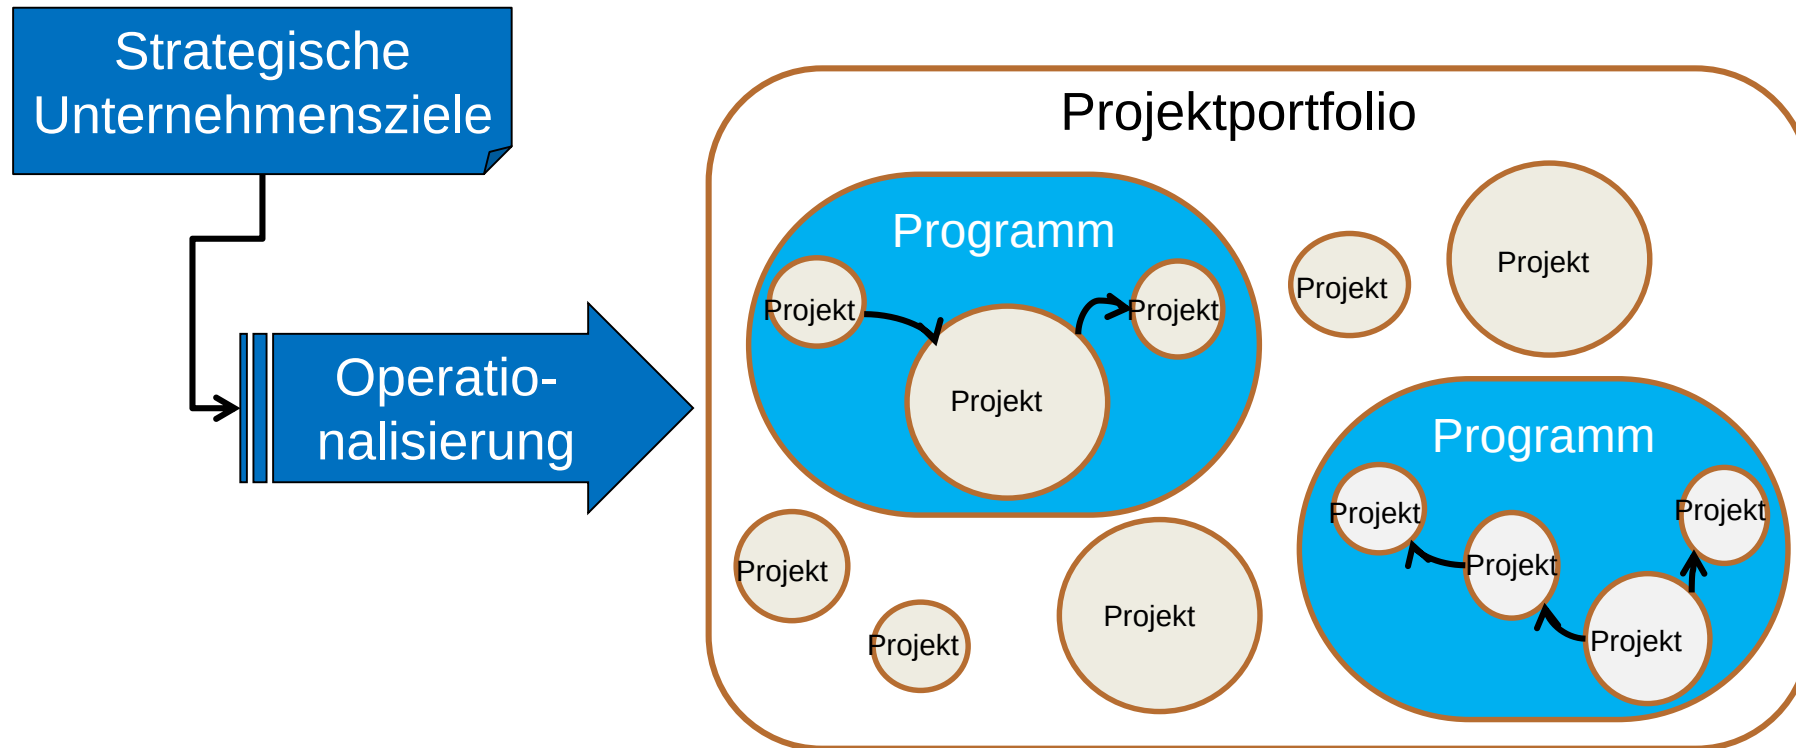

- ▶ **Programm:** Menge von zusammengehörigen Projekten, die zu einem gemeinsamen Oberziel gehören – **zeitlich befristet**
- ▶ **Projektportfolio:** Alle Projekte und Programme eines Unternehmens / einer Organisation / eines Geschäftsbereichs – **zeitlich unbefristet**

Zu viele parallele Projekte behindern den Durchsatz → Priorisierung!

Projektarten

Projektart: Kategorisierung von Projekten, basierend auf ihren gemeinsamen Merkmalen

Zweck: Projektarten dienen dazu, ähnliche Projekte zu gruppieren und sie besser zu planen und zu steuern. Die Projektart kann beispielsweise durch die Branche, den Anwendungsbereich oder die technische Komplexität definiert werden

Merkmal / Dimension	Ausprägung			
Auftraggeber	intern		extern	
Projekthalt	Entwicklung	Forschung	Investition	Organisation
Branche	Bau	IT	Banken, Versicherungen	andere...
Komplexität	Standard-Projekt	Akzeptanz-Projekt	Potential-Projekt	Pionier-Projekt
Projektorganisation	Einfluss/ Stab		Matrix	Autonom
Projektsteuerung	traditionell		agil	
Geografie	national		international	
Projektgröße	klein		mittel	groß
weitere Merkmale ...				

Projektarten: Beispiele mit dem Merkmal / Dimension: Projektinhalt

(Produkt-) Entwicklungsprojekte

- Klar definiertes Entwicklungsziel: Neues Produkt / Dienstleistung
- Bei Produkten für den Markt hat der Termin oft enorme Bedeutung

- neues Automodell
- neue Software / Hardware
- neues Medikament / Impfstoff

Forschungsprojekte

- Entwicklungsziel nur grob definiert
- Pioniercharakter, hoher Änderungsgrad der Projektparameter

Entwicklung neuer Technologien sowie neuer Verfahren und Methoden
(Beispiel: Weltraum-Frühwarnsystem)

Investitionsprojekte

- Bau einer Produktionsanlage
- ROI steht im Vordergrund

- Bau einer Fabrik für Elektrofahrzeuge
- Anschaffung einer Produktionsanlage
- Solarfarm, Windradpark

Organisations-/Change-Projekte

- Häufiges Ziel: Rationellere Abwicklung der Geschäftsprozesse (Kosteneinsparungen; besserer Kundenservice)
- Hohe Abhängigkeit vom Umfeld

- Einführung einer neuen Organisation
- Einführung eines neuen Vertriebssystems

Klassifizierung von Projekten in Unternehmen

In Unternehmen werden Projekte häufig in Projektklassen eingeteilt


- Kriterien: Mitarbeiterzahl, Budget, Dauer, strategische Bedeutung, Risiko
- Beispiel:

	Kleinprojekt C-Projekt	Mittleres Projekt B-Projekt	Großprojekt A-Projekt
Anzahl Mitarbeiter	5 – 50	50 – 500	> 500
Personenjahre	2 – 10	10 – 250	> 250
Budget (in Mio. €)	0,02 – 0,2	0,2 - 10	> 10

Konsequenzen:

- Je nach Kategorie werden Projektmanager unterschiedlichen Grades (z.B. Erfahrungen, Ausbildung) eingesetzt
- Umfang des Projektmanagements (z.B. Prozesse, Tooleinsatz, Berichtswesen) hängt ebenfalls von der Projektklasse ab – „*nicht mit Kanonen auf Spatzen schießen*“

Das magische Dreieck des Traditionellen Projektmanagements

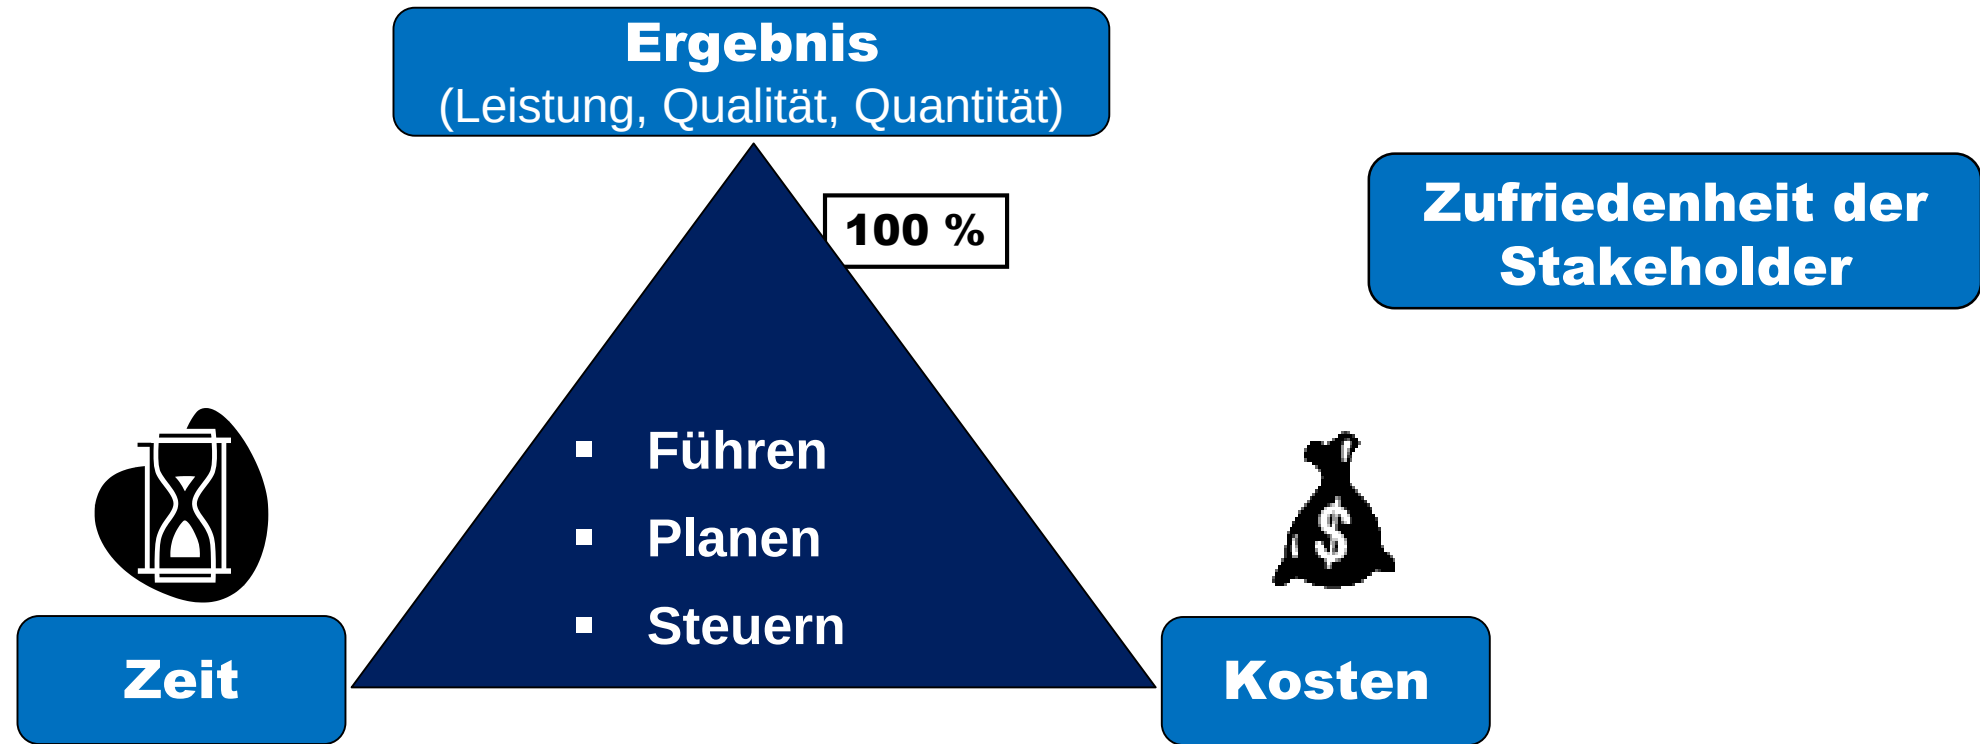

Die drei Kernziele (Ergebnis-, Zeit- und Kostenziel) beeinflussen sich gegenseitig

Beispiel: Höhere Qualitätsforderungen haben unwillkürlich Auswirkungen auf Termine und/oder Kosten

Traditionelles PM: Leistungsumfang (Ergebnisse) ist vorgegeben;
Aufwände, Termine, Ressourcen und Kosten werden geschätzt

Traditionelles Projektmanagement = **Plan-basiertes Projektmanagement**

Das magische Dreieck



- **Klassisches Dilemma in IT-Projekten**
 - ▶ Kein IT-Projekt erfüllt alle drei Dimensionen maximal → systemisches Dilemma?
- **Definition von „optimal“**
 - ▶ Umfeld mit Zielkonflikten
- **„These“ zur Rolle der IT**
 - ▶ Priorisieren
 - ▶ Balancieren
 - ▶ Liefern
 - ▶ Erklären

Fazit ODER Frage?

Wie IT-Entscheidungen für/in Projekten heute zunehmend an wirtschaftlicher, technologischer, organisatorischer Komplexität scheitern oder wachsen!?

PROJEKTSTART

Projektstart


► Wann beginnt ein Projekt?

- Neue Idee
- Kundenauftrag
- Anstehende Investition
- Problem / Herausforderung
- ...



► Projektauftrag

PROJEKT STECKBRIEF	
Projektname:	Projektname: NA (Beispiel im Projektlauf)
Kurzbeschreibung:	Erstellungsdatum: 18.05.2020
Projektziele:	
Auftraggeber:	Kunde / Nutzer:
Projektmanager:	Kernteam:
Ressourcen:	Budget:
Risiken (potenzielle Show-Stopper):	Chancen:
Projektstarttermin:	Projektendtermin:
Meilensteine:	Sonstiges:
Unterschrift Auftraggeber	Unterschrift Projektleiter



► Projektstart-Workshop



► Kick-off



Projektstart mit dem Project Canvas

- ▶ **Project Canvas** dient dazu, dass **Projektteam und Auftraggeber** einen **gemeinsamen Überblick** über das Projekt gewinnen
- ▶ Dies ist eine gute Basis für den **Projektauftrag** bzw. **Projektsteckbrief**

PROJECT CANVAS

TITEL DES PROJEKTS:

ERSTELLT VON: _____

WO/WANN: _____

ZWECK

Was ist die Ursache des Projekts (auch: Motiv, Beweggrund)?
Warum ist das Projekt wichtig und bedeutsam – und für wen?
Inwiefern wird das Projekt die Zukunft verändern – und für wen?

BUDGET

Wie viel Geld ist verfügbar?
Wie flexibel ist der Finanzrahmen?

Wie viel Geld wird benötigt für
... das TEAM (intern / extern)?
... die notwendigen RESSOURCEN?

TEAM

Wer sollte dabei sein?

Wer ist
... im Kernteam?
... im erweiterten Team?
... externer Partner?
... Projektleiterin?

UMFELD

Welche bekannten Kräfte
(Ereignisse, Bedingungen, Menschen)
wirken auf das Projekt
... als Rückenwind?
... als Gegenwind?

ETAPPENZIELE

Welche Etappenziele
würden Anlässe zum Feiern?

Gibt es Termine für
... Teil- und Zwischenergebnisse?
... sicht- und messbare Erfolge?
... richtungsweisende Entscheidungen?

QUALITÄT

Was macht die KUNDEN wirklich
glücklich bezogen auf
... das ERGEBNIS des Projekts?
... die ETAPPENZIELE auf dem Weg dorthin?

Wie wollen die KUNDEN im Projekt
mitarbeiten und informiert werden?

RESSOURCEN

Was wird benötigt an
... Arbeitsmitteln (inkl. Software)?
... Materialien?
... Methoden und Modellen?
... Projektarbeitsräumen?
... Besprechungsräumen (vor Ort / virtuell)?

RISIKEN + CHANCEN

Welche unsicheren Ereignisse würden im
Falle ihres Eintretens, den Projekterfolg
... gefährden?
... beflügeln?

Tipps: Sicher eintretende und beeinflussbare Ereignisse
sind als UMFELD-Bedingungen zu berücksichtigen.

ERGEBNIS

Was genau soll am Ende des
Projekts an die KUNDEN geliefert werden?

Was ist es am ehesten, ist es
... ein neues Produkt?
... ein neuer Service?
... neues Wissen (Erkenntnisse)?

KUNDE

Wer ist Kunde des Projekts,
d.h. wer sind die Menschen, die
... das Projekt starten & beenden (Eigentümer)?
... das Projektergebnis erhalten (Empfänger)?
... das Projekt finanzieren (Sponsor)?

Bei mehreren Personen:
Gibt es absehbare Konflikte?

ZEIT

Wann startet das Projekt tatsächlich? Was wird dafür benötigt (z.B. Vorbereitungen, Dokumente)?
Wann ist das Projekt wirklich abgeschlossen? Was wird dafür benötigt (z.B. Dokumente, Freigaben)?
Wie flexibel ist der Starttermin des Projekts? Wie flexibel ist der Endtermin des Projekts?

Over the Fence overthefence.com.de
(THE PROJECT CANVAS Version 4.0, Apr 2018)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. View a copy of this license: <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Projektdokumente für die Leistungsumfang-Beschreibung

- **Projektsteckbrief**
TOP-Level-Dokument
mit den Basisdaten des Projekts

PROJEKT STECKBRIEF	
Projektname:	Projektleiter: NN (Wechsel im Projektverlauf) Erstellungsdatum: 18.05.2020
Kurzbeschreibung:	
Projektziele:	
Auftraggeber:	Kunde / Nutzer:
Projektmanager:	Kernteam:
Ressourcen:	Budget:
Risiken (potentielle Show-Stopper):	Chancen:
Projektstarttermin:	Projektendtermin:
Meilensteine:	Sonstiges:
Unterschrift Auftraggeber	Unterschrift Projektleiter

- **Lastenheft**
Dokumentation der **Anforderungen des Projektauftraggebers** an die Lieferungen und Leistungen
(= Aufgaben und Lasten für den Projektauftragnehmer)

- **Pflichtenheft**
Dokumentation des **Auftragnehmers**, wie er die im Lastenheft genannten Anforderungen umsetzen wird
(= Verpflichtung zur Lieferung / Ausführung)

Die Inhalte des Lastenheftes entsprechen i.w. dem Product Backlog (Epics, User Stories).
Es hat den **Anspruch auf Vollständigkeit der Anforderungen**.

Projektsteckbrief: Template

PROJEKT STECKBRIEF	
Projektname:	Projektleiter: NN (Wechsel im Projektverlauf) Erstellungsdatum: 27.05.2024
Kurzbeschreibung:	
Projektziele:	
Auftraggeber:	Kunde / Nutzer:
Projektmanager:	Kernteam:
Ressourcen:	Budget:
Risiken (potentielle Show-Stopper):	Chancen:
Projektstarttermin:	Projektendtermin:
Meilensteine:	Sonstiges:
Freigabe für Phase: ☐ Initialisierung ☐ Definition ☐ Planung ☐ Steuerung ☐ Abschluss	

Unterschrift Auftraggeber

Unterschrift Projektleiter

Template:
 Projektsteckbrief.docx

Projektsteckbrief: Beispiele

PROJEKT STECKBRIEF


Projektname: Simple Order	Projektleiter: NN (Wechsel im Projektverlauf) Erstellungsdatum: 09.06.2023
Kurzbeschreibung: Die App Simple Order dient dazu den Bestellprozess in Restaurants zu digitalisieren und zu verbessern. Durch die Möglichkeit der Bestellung über das eigene Handy erhalten Kunden hierbei die Chance eigenständig Essen und Getränke zu ordern. Dies soll zum einen zu einem verbesserten Restaurantlebnis der Besucher*innen, sowie zu einer Erleichterung für die Mitarbeitenden in Restaurants (Besitzer wie Angestellte) führen.	
Projektziele: Erstellen einer funktionsfähigen App zur Bestellung im Restaurant	
Auftraggeber: Cem Özdemir und Lenny Sjol	Kunde / Nutzer: Restaurantbetreiber*innen und Besucher*innen
Projektmanager: Aktueller Projektleiter	Kernteam: Alle Teammitglieder
Ressourcen: Vorlesungsfolien, <u>Firestore</u> , Flutter als Entwicklungsplattform, Microsoft Teams, WhatsApp zur Kommunikation	Budget: 1 Cent (<u>Firestore</u>)
Risiken (potentielle Show-Stopper): - Skepsis oder Ablehnung der Stakeholder - App erfüllt ihren Zweck nicht	Chancen: - Erster Einsatz in Partnerrestaurant wird gut angenommen - App trifft auf hohe Akzeptanz bei Kunden
Projektstarttermin: 17.04.2023	Projektendtermin: 24.07.2023
Meilensteine: Sprints & MVP 1 + 2	Sonstiges: -
Freigabe für Phase: ☐ Initialisierung ☐ Definition ☐ Planung ☐ Steuerung ☐ Abschluss	

PROJEKT STECKBRIEF

Projektname: Sozialomat	Projektleiter: wechselnd Erstellungsdatum: 05.06.2023
Kurzbeschreibung: Der Sozialomat ist ein Chatbot, der potentiellen Sozialleistungsempfänger*innen einen einfachen, zentralen und personenzentrierten Zugang zu Informationen sowie individuelle Vorschläge zu passenden Sozialleistungen gibt.	
Projektziele: - Chatbot auf lokalem Server und über eine aussagekräftige Domain zugänglich - Chatbot gibt passende Antworten und trifft korrekte Aussagen zu den Sozialleistungen - Die Datenschutzrechte der User*innen werden gewahrt	
Auftraggeber: Michael Gabler von viind	Kunde / Nutzer: Alle Bürger*innen, die soziale Unterstützung benötigen und in Deutschland wohnen
Projektmanager: wechselnd	Kernteam: Caro Baur, David Hilbert, Kim Gärtner, Nina Vössing, Luzie Beuther, Max Wittstock
Ressourcen: - Zugänge zu Programmen und Servern (z. B. Web-Server oder Chat GPT API) bereitgestellt von viind - PM-Methoden - Öffentlich zugängliche Informationsquellen (z. B. Gesetzestexte) - Zoom als Besprechungsraum	Budget: Kein Budget
Risiken (potentielle Show-Stopper): - Verbreitung von nicht aktuellen Informationen/ Falschinformationen - Gefährdung des Datenschutzes - Ethische Frage um die Verwendung von ChatGPT	Chancen: - Förderung von sozialer Gerechtigkeit - Fachkräfte in Sozialämtern entlasten - Prozesse beschleunigen und bürokratischen Aufwand einsparen
Projektstarttermin: 17.04.2023	Projektendtermin: 17.07.2023
Meilensteine: 1. Sprint 1 mit MVP 1 (erster Prototyp) 2. Sprint 2 mit MVP 2 (Prototyp) 3. Sprint 3 mit MVP 3 (finale Produkt) und Abschlusspräsentation	Sonstiges:
Freigabe für Phase: ☐ Initialisierung ☐ Definition ☐ Planung ☐ Steuerung ☐ Abschluss	

Lasten- und Pflichtenheft


Anforderungen des
Auftraggebers (AG)

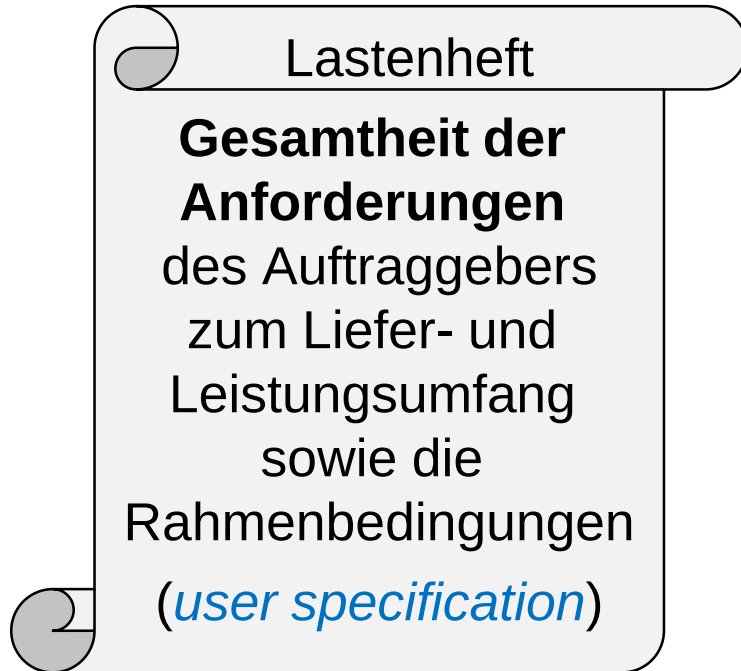

Auftraggeber
spezifiziert das gewünschte Ergebnis
und bezahlt es nach Lieferung



Vom Auftragnehmer (AN)
abgeleitetes Realisierungsvorhaben

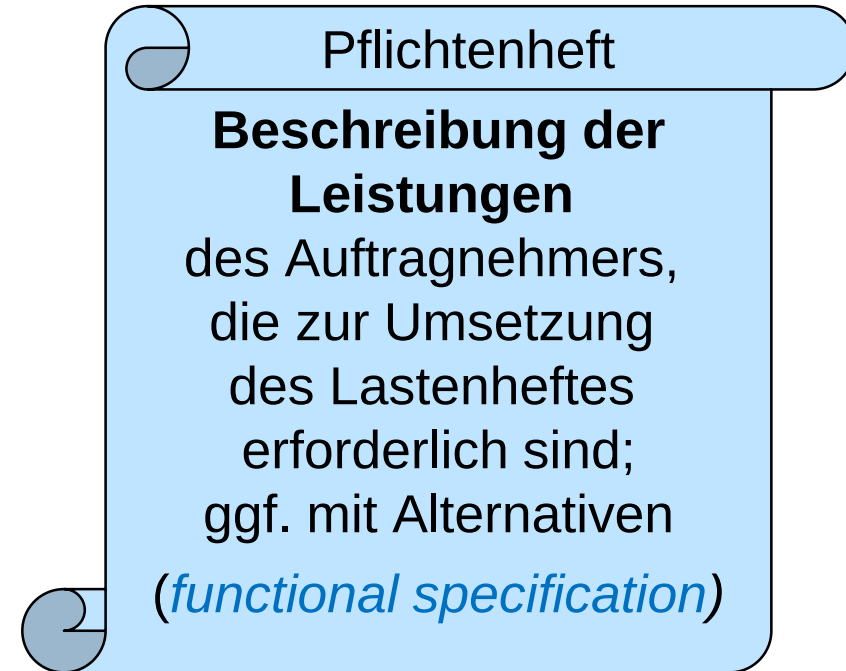

Auftragnehmer (= Lieferant)
stellt das bestellte Ergebnis her
und wird dafür entlohnt

Lasten- und Pflichtenheft: Gliederungsbeispiele

Lastenheft


1	Überblick über das Projekt	7	Anforderungen an die Qualität
1.1	Veranlassung	7.1	Qualitätsmerkmale
1.2	Einbettung in die Strategie	7.2	Qualitätssicherung
1.3	Zielsetzung	7.3	Qualitätsnachweis
1.4	Technische Zusammenhänge	8	Inbetriebnahme und Betrieb
1.5	Organisatorische Einbettung	8.1	Dokumentation
1.6	Wirtschaftliche Zusammenhänge	8.2	Schulung
1.7	Eckdaten des Projekts	8.3	Montage
2	Ist-Situation	8.4	Inbetriebnahme
2.1	Technischer Prozess	8.5	Abnahme
2.2	Vorhandene Systeme	8.6	Betrieb und Bedienung
2.3	Organisation	8.7	Instandhaltung
2.4	Mengengerüst	9	Umweltschutz und Außerbetriebnahme
3	Schnittstellen	10	Projektabwicklung
3.1	Äußere Schnittstellen	10.1	Projektorganisation
3.2	Bedienungs-Schnittstellen	10.2	Projektplanung und -überwachung
3.3	Innere Schnittstellen	10.3	Personal
4	Soll-Zustand	10.4	Lieferanten und Verträge
4.1	Übersicht Aufgabenstellung	10.5	Änderungen
4.2	Projektziele	A	Anhang
4.3.	Detaillierte Aufgabenstellung	A.1	Begriffe und Definitionen
4.4.	Abläufe	A.2	Gesetze, Normen, Richtlinien
4.5	Mengengerüst	A.3	Konstruktionsrichtlinien
4.6	Ausbaustufen	A.4	Vertragsgrundlagen
5	Anforderungen an die Technik		
6	Randbedingungen		
6.1	Genehmigungswesen		
6.2	Gesetze und Richtlinien		

Pflichtenheft

11	Fachliche / Technische Lösung	19	Projektkalkulation
11.1	Kurzbeschreibung	19.1	Kosten
11.2	Zusammenhang	19.2	Investitionen
11.3	Anlagenstruktur	19.3	Unteraufträge
11.4	Schnittstellendefinitionen	19.4	Betriebskosten
11.5	Dokumentenplan	19.5	Wirtschaftlichkeitsrechnung
11.6	Störfallanalyse	19.6	Mittelabflussplanung
12	Komponentenbeschreibung	20	Projektplanung und -überwachung
13	Genehmigungsergebnisse	20.1	Terminplan
14	Logistik	20.2	Meilenstein-Entscheidungen
15	Test und Abnahme	20.3	Kapazitätseinsatzplanung
15.1	Testkonzept	20.4	Berichtsplan
15.2	Testvorbereitung, Durchführung	A	Anhang
16	Inbetriebnahme und Betrieb	A.1	Begriffe und Definitionen
16.1	Personal	A.2	Gesetze, Normen, Richtlinien
16.2	Schulung	A.3	Konstruktionsrichtlinien
16.3	Organisatorische Einbindung	A.4	Vertragsgrundlagen
17	Wartung und Störfälle		
18	Ausschreibung und Lieferanten		
18.1	Ausschreibungsart/Veröffentlichung		
18.2	Lieferantenauswahlkriterien (Präqualifikation)		
18.2	Vorbereitung Leistungsverzeichnis		
18.3	Vorbereitung Ausschreibungen		

Quelle: PM4, S. 1123 und 1127

Prozess: Vom Lastenheft zum Vertrag mit Pflichtenheft

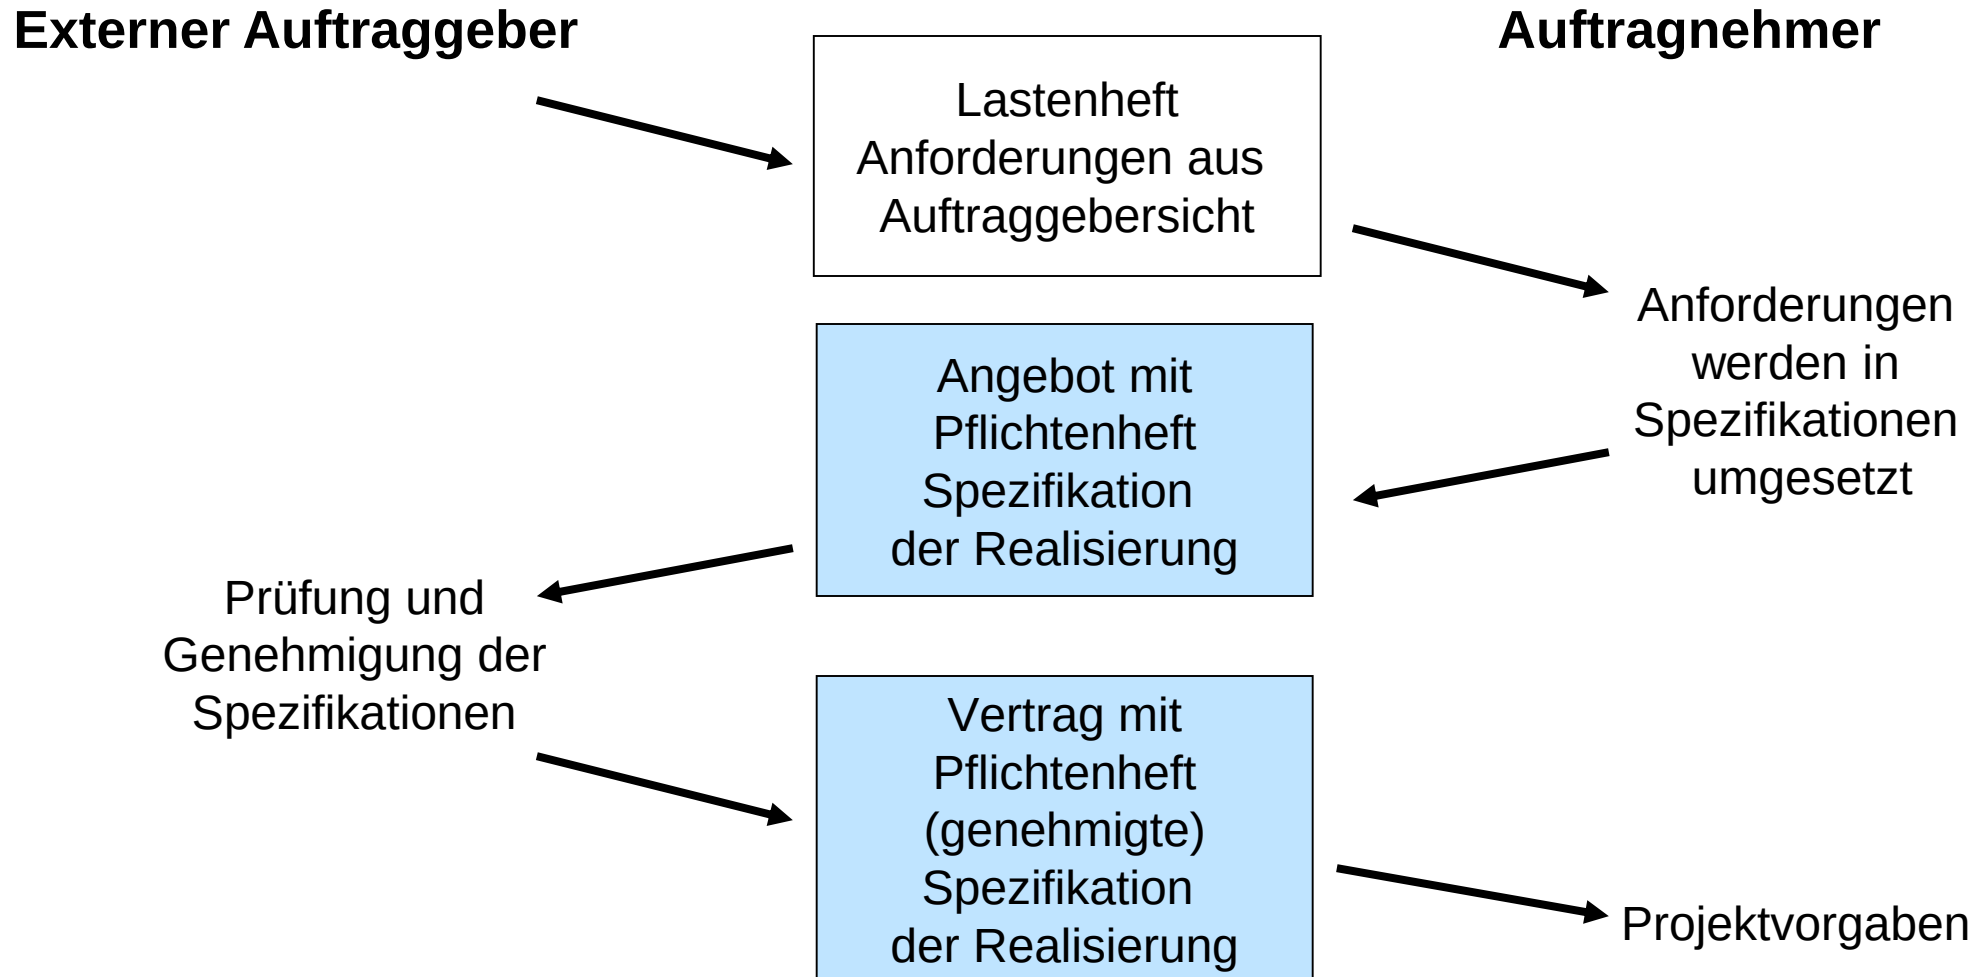

Prozess: Interne Projektbeauftragung (Auftraggeber im Unternehmen)

1. Projektantrag

PROJEKT STECKBRIEF	
Projektname:	Projektleiter: NN (Wechsel im Projektverlauf) Erstellungsdatum: 18.05.2020
Kurzbeschreibung:	
Projektziele:	
Auftraggeber:	Kunde / Nutzer:
Projektmanager:	Kernteam:
Ressourcen:	Budget:
Risiken (potentielle Show-Stopper):	Chancen:
Projektstarttermin:	Projektendtermin:
Meilensteine:	Sonstiges:
Freigabe für Phase: ☐ Initialisierung ☐ Definition ☐ Planung ☐ Steuerung ☐ Abschluss	
Unterschrift Auftraggeber	Unterschrift Projektleiter

2. Entscheidung (z.B. durch Steuerkreis)

- Projektantrag wird genehmigt
- Projektantrag wird abgelehnt oder zurückgestellt



Interner Projektauftrag



Projektstart-Workshop

- ▶ **Ziel: Grober Projektplan erstellen**
- ▶ **Teilnehmer:** Projektmanager, Kernteam, Auftraggeber und sonstige wichtige Stakeholder

- ▶ Wichtige Inhalte
 - Erstellung eines Project Canvas o.ä.
 - Festlegung der groben Projektziele
 - Identifikation der wichtigsten Stakeholder
 - Grobe Strukturierung des Projektes in Projektphasen und Festlegung von Meilensteinen
 - Projektorganisation (grob)
 - Kommunikationsorganisation
 - Identifikation und Bewertung von Projektrisiken
 - Nächste Schritte
 - Vorbereitung Kick-off Veranstaltung (Informationsveranstaltung für alle Projektteammitglieder)




Kickoff-Veranstaltung (Informationsveranstaltung)

- ▶ **Formaler Projektstart:** Erstes Treffen des Projektmanagers mit dem gesamten Projektteam
- ▶ **Ziel: Klarheit und Gesamtüberblick schaffen**
 - Jeder kennt die Projektziele und die Kriterien, an denen der Projekterfolg gemessen wird
 - Jeder kennt das geplante Vorgehen mit Meilensteinen
 - Jeder hat das Projekt als Ganzes verstanden
 - Jeder kennt seine Rolle im Projekt
- ▶ Teilnehmer: Projektmanager, Projektteam, Auftraggeber und sonstige wichtige Stakeholder
- ▶ Vorstellung / Kennenlernen der Teammitglieder
- ▶ Vorstellung des Projektauftrages und der Projektprozesse
 - Projektziele, -inhalte und -termine
 - Commitment zu den Zielen
 - Organisatorische Rahmenbedingungen, u.a. Kommunikation
 - Spielregeln der Zusammenarbeit




Projektziele

Projektzielklärung ist wichtig

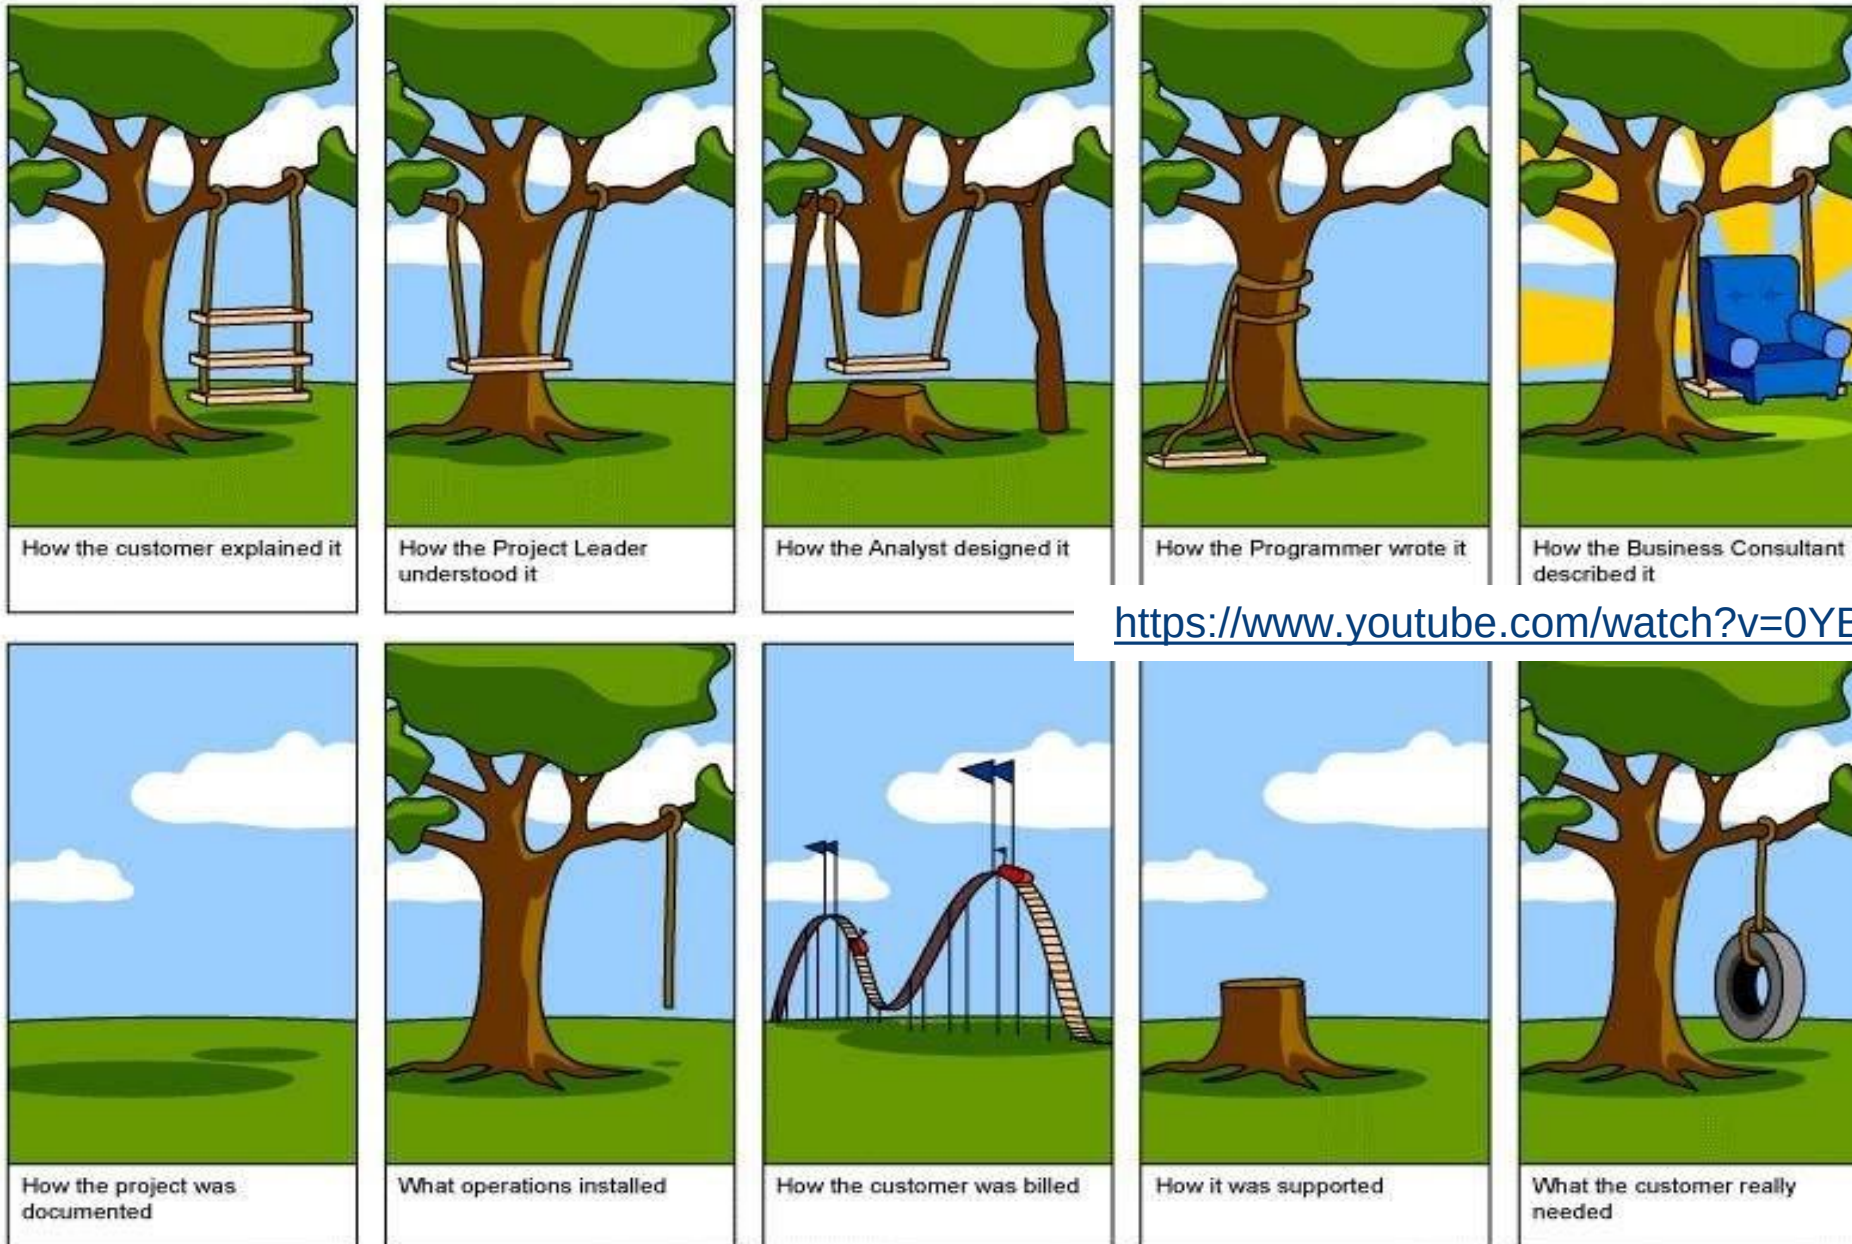

<https://www.youtube.com/watch?v=0YBMfTorE6A&nohtml5=False>

Klare Ziele haben hohen Stellenwert im Traditionellen PM

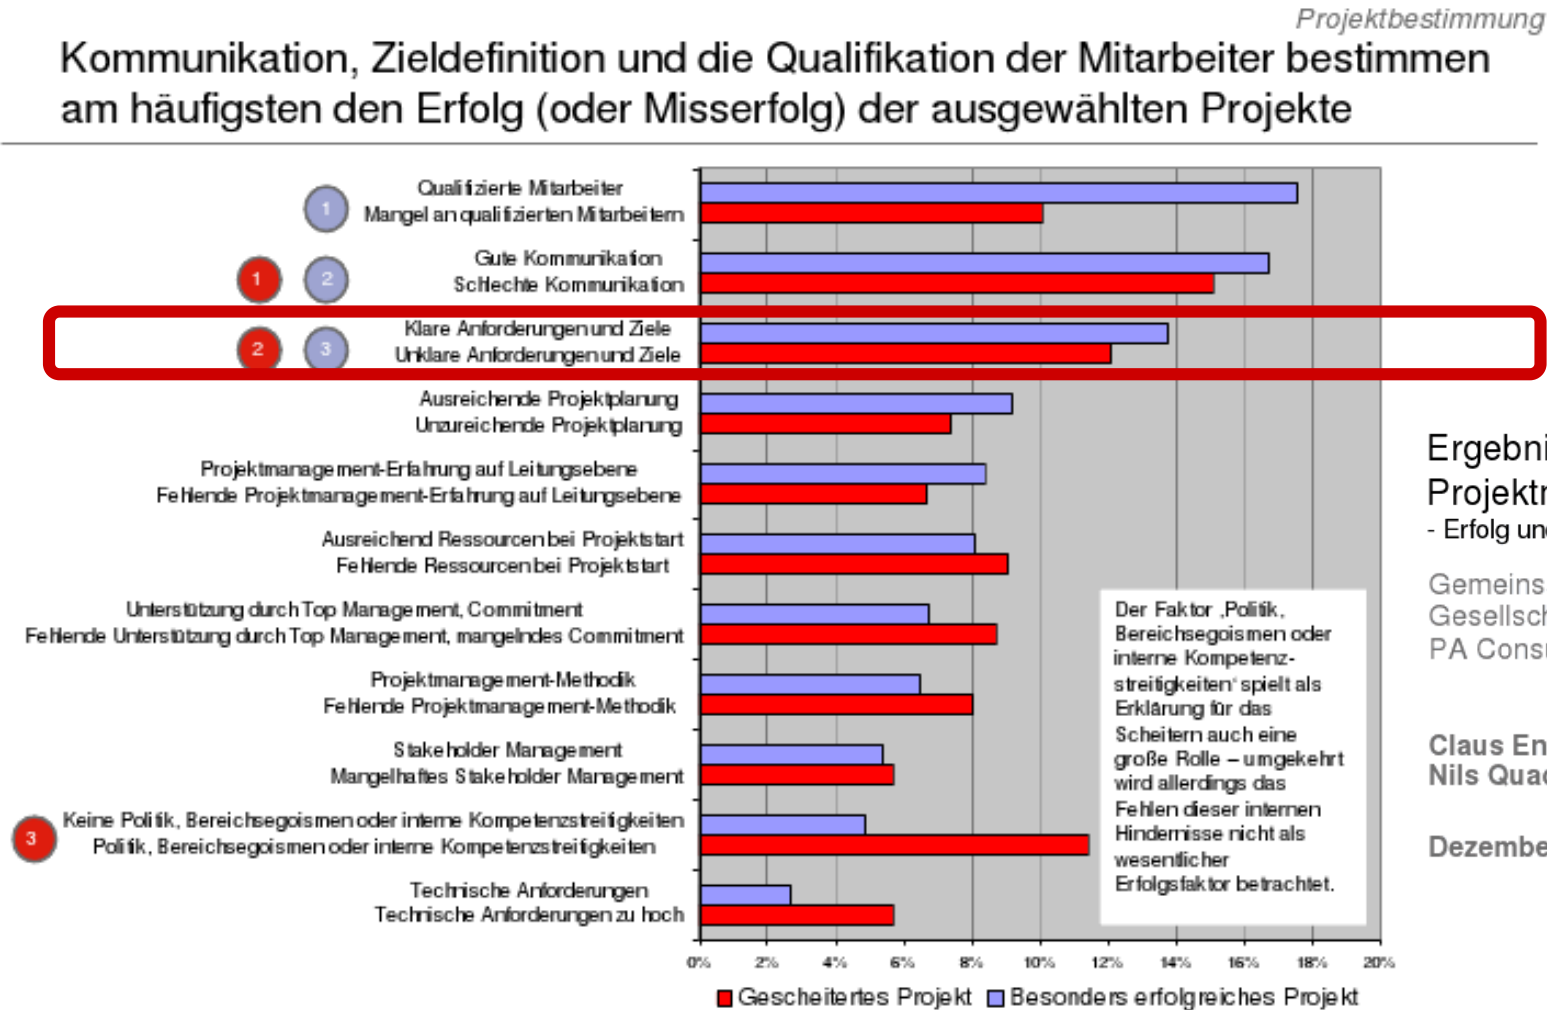

Ergebnisse der
Projektmanagement Studie 2008
- Erfolg und Scheitern im Projektmanagement -

Gemeinsame Studie der GPM Deutsche
Gesellschaft für Projektmanagement e.V.
PA Consulting Group

Claus Engel, Alexander Tamdjidi,
Nils Quadejacob

Dezember 2008


**Nur wenn die Anforderungen und Ziele klar sind,
können auch realistische Pläne hierzu entwickelt werden**

Klare Ziele haben hohen Stellenwert im Traditionellen PM

Management Summary

Es gibt drei Handlungsfelder, denen Unternehmen mit dem Wunsch nach erfolgreicherem Projektmanagement besondere Beachtung schenken sollten

In allen Teilen dieser Studie – von den Erkenntnissen zum Thema Projektmanagement-Kultur bis hin zu den Ergebnissen aus dem Vergleich von erfolgreichen und gescheiterten Projekten - ergibt sich das gleiche Bild: Der Erfolg eines Projektes ist am stärksten abhängig von den folgenden Faktoren:

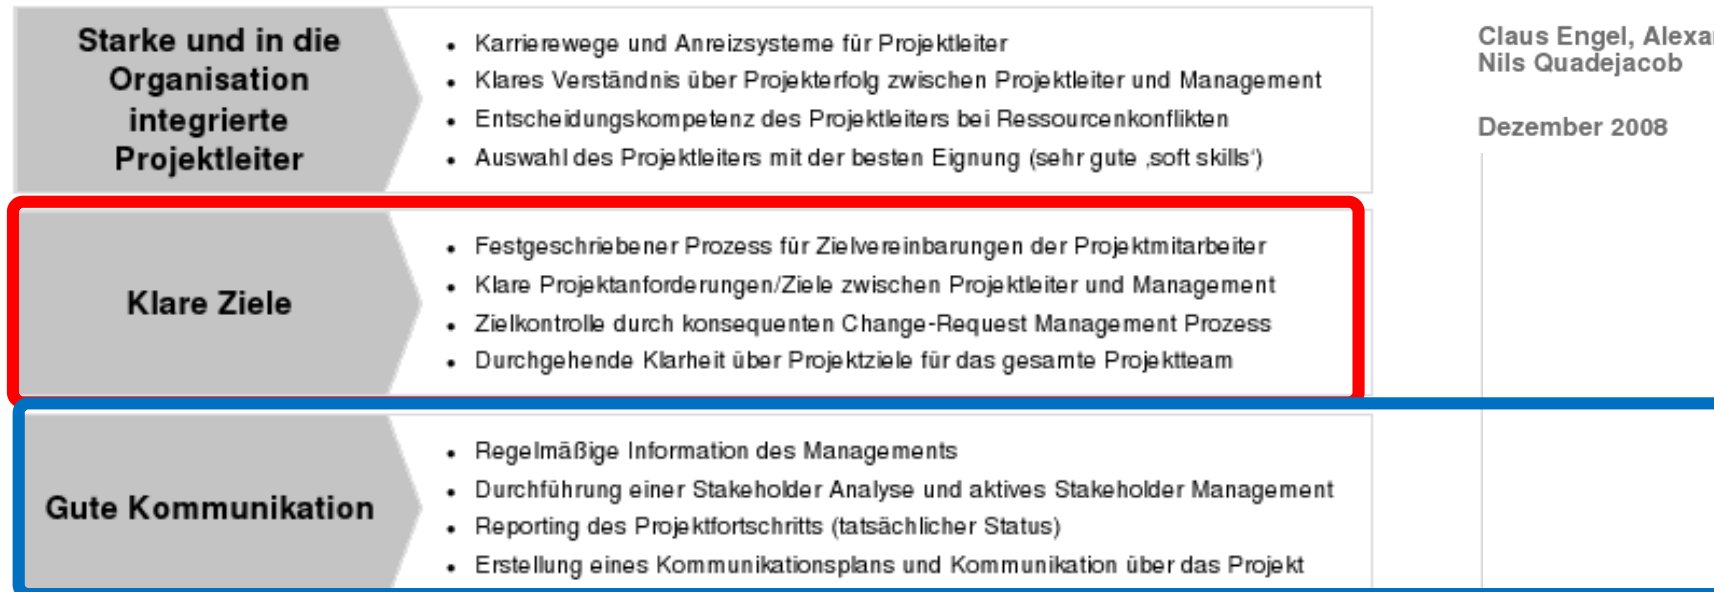

Ergebnisse der
Projektmanagement Studie 2008
- Erfolg und Scheitern im Projektmanagement -

Gemeinsame Studie der GPM Deutsche
Gesellschaft für Projektmanagement e.V.
PA Consulting Group

Claus Engel, Alexander Tamdjidi,
Nils Quadejacob

Dezember 2008

Traditionelles Projektmanagement ist nicht geeignet für Vorhaben mit unklaren Anforderungen, unklarem Vorgehensweg oder instabilen Zielen!!!

Was ist ein (Projekt-)Ziel?

Ein **Ziel** ist ein gedanklich vorweggenommener **angestrebter zukünftiger Zustand**




Definition (DIN 69901-5:2009):

- **Projektziel** ist die "**Gesamtheit von Einzelzielen**, die durch das Projekt erreicht werden sollen, bezogen auf Projektgegenstand und Projektablauf."

Hinweis: Gutes Projektmanagement hat ergänzend zu den Produktzielen die übergeordneten Ziele

- Zufriedenheit des Auftraggebers und der Kunden
- Zufriedenheit der Projektmitarbeiter
- Zufriedenheit der sonstigen Stakeholder, z.B. Lieferanten

Zielkategorien: Leistungen, Termine, Kosten, Soziales, Nachhaltigkeit

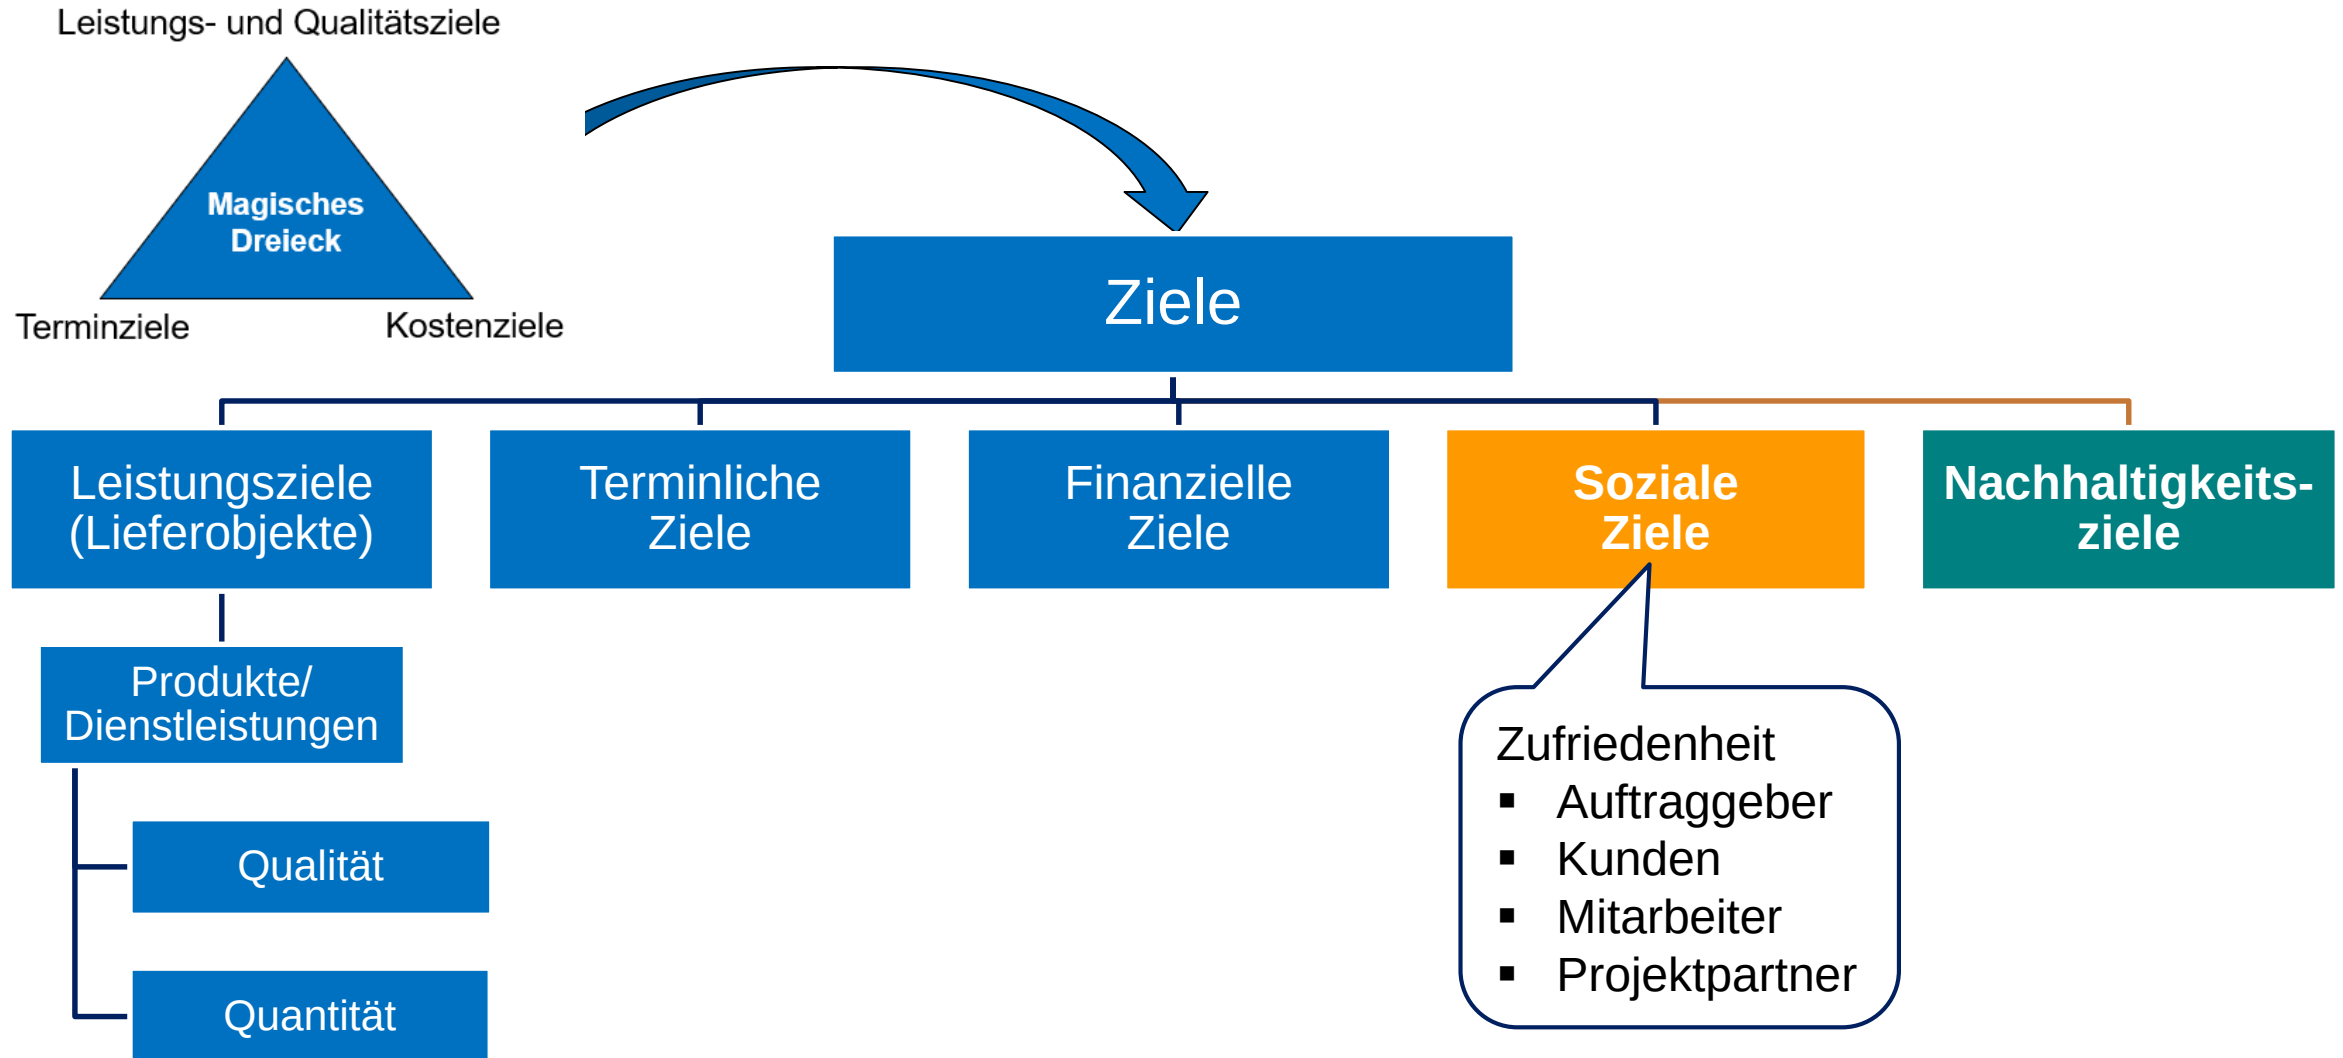


Chatstorm „Soziale und Nachhaltigkeitsziele“

Jeder benennt ein soziales und/oder ein Nachhaltigkeitsziel seines Projektes und schreibt dieses in den Chat

Versand erst nach Kommando des Referenten

- Democratizes professional document processing for small businesses that can't afford enterprise software like DATEV
-

Ergebnis- und Vorgehensziele

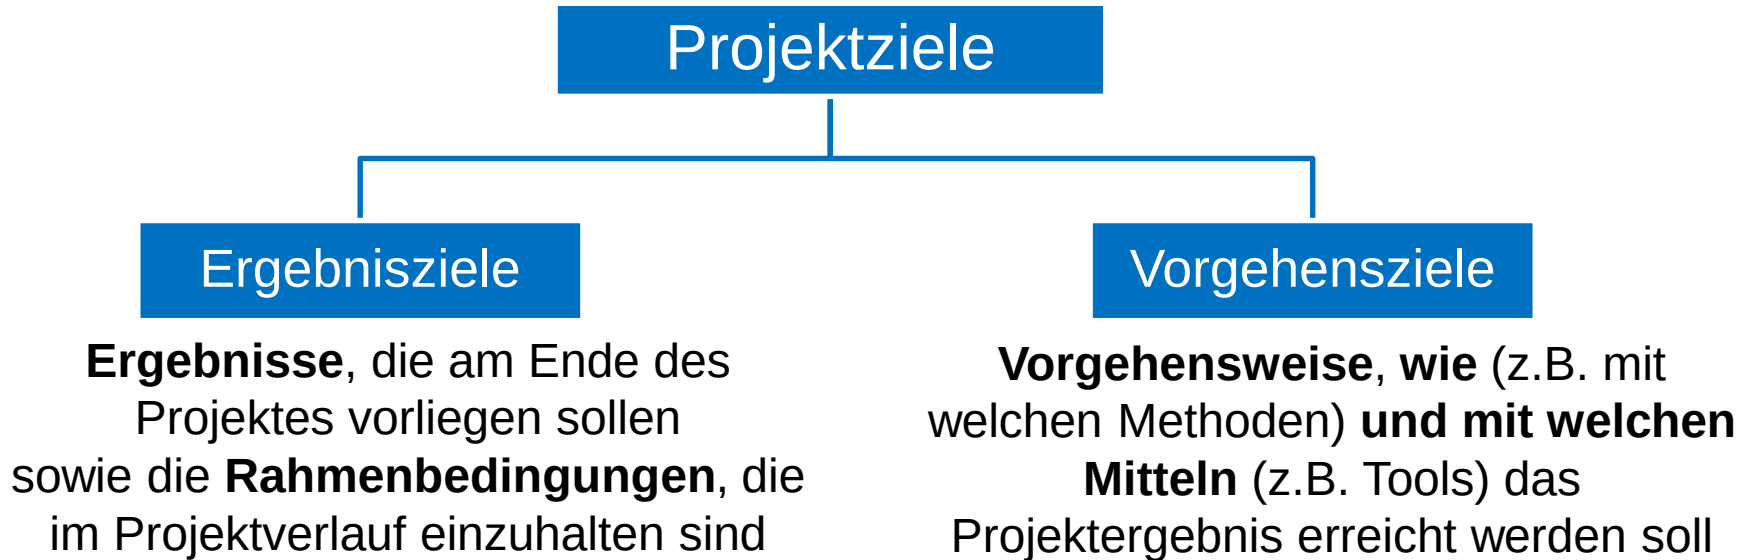


Beispiel

Projektziel: Entwicklung einer Kita-App für den Einstieg in die Kitas; niederschwellige Nutzung durch Ausgabe der Informationen in Voice (und Textform), damit auch Analphabeten die Informationen verstehen.

Ergebnisziel: Features der App, verschiedene Sprachen, Feedback, ...

Vorgehensziel: App-Erstellung mit **ionic**, um mit einmaliger Entwicklung Android und iOS-Versionen zu erzeugen

Zielpriorisierung: Muss-, Soll- und Kann-Ziele

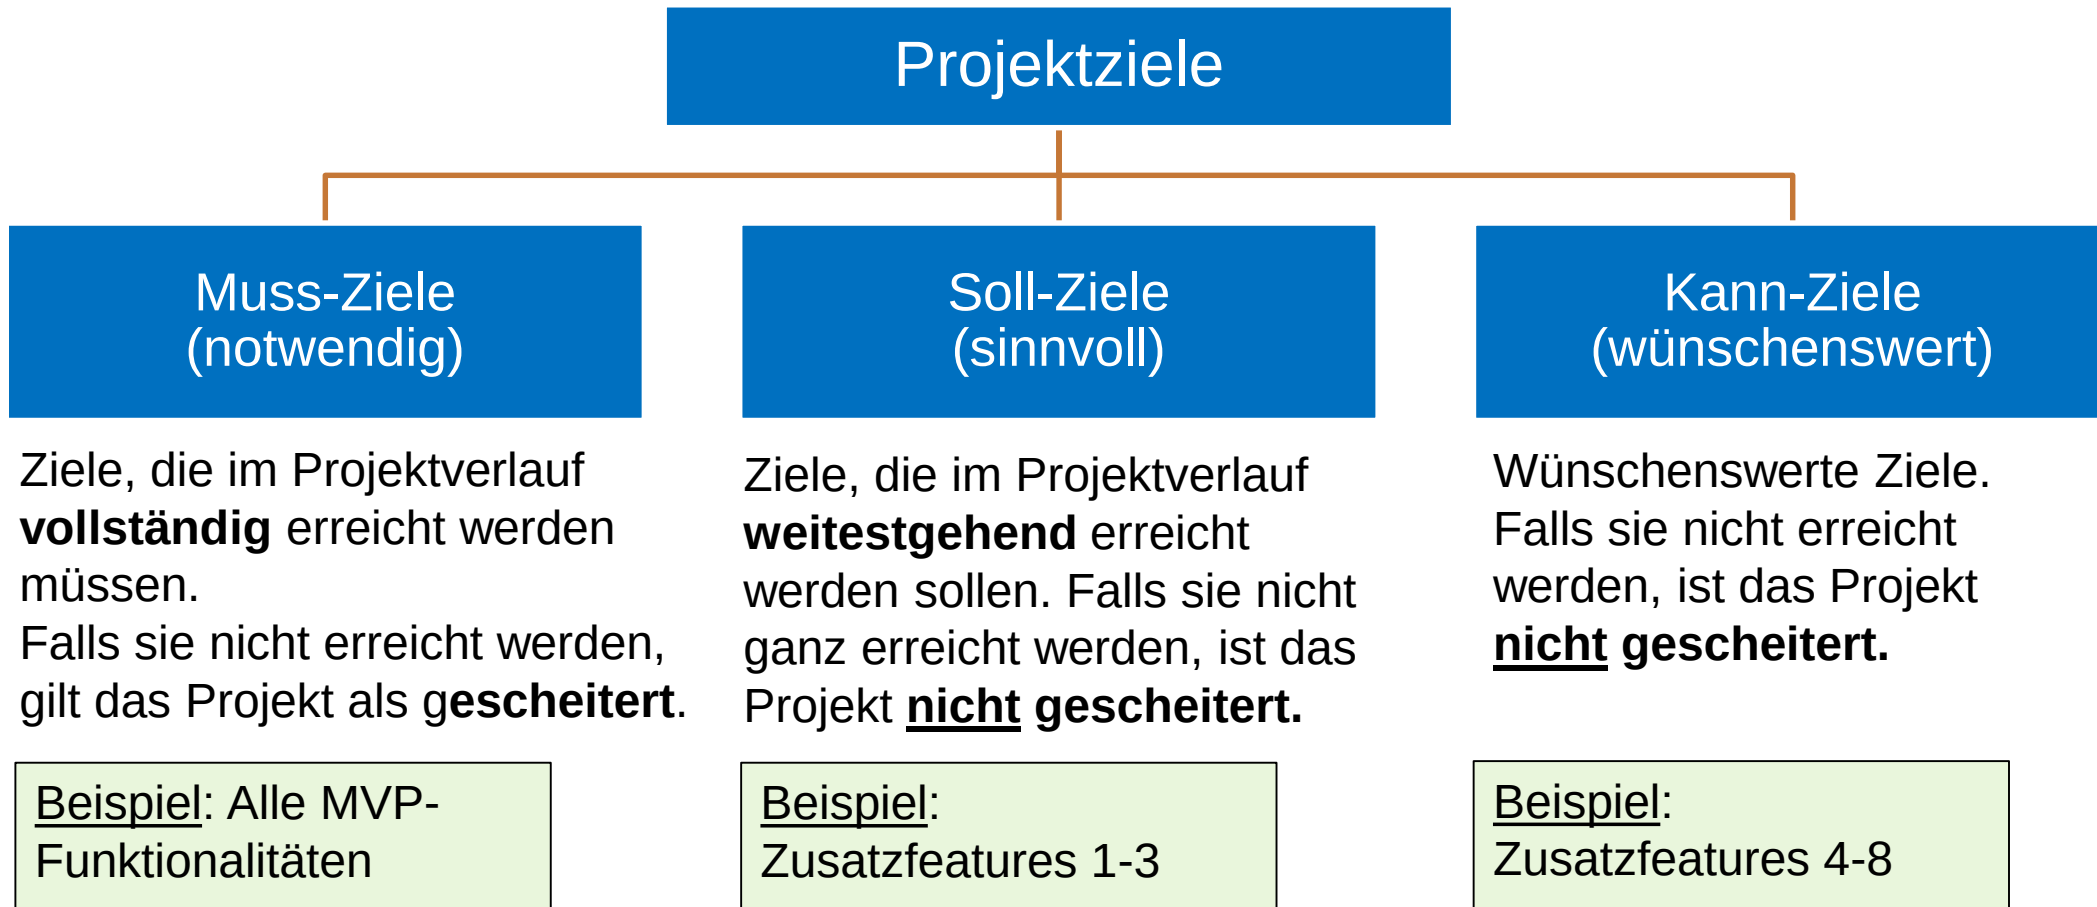

In Engpass-Situationen kann (priorisiert) gesteuert werden:

- Prio 1: Muss-Ziele - **Must**
- Prio 2: Soll-Ziele - **Should**
- Prio 3: Kann-Ziele - **Could**

Nicht-Ziele zur Abgrenzung des Projektumfangs

Zur Abgrenzung des Projektumfangs (**Scope**) werden „**Nicht-Ziele**“ festgelegt

- „Nicht-Ziele“: Was **NICHT** Bestandteil des Projektes ist
- Abgrenzung erhöht die Entscheidungssicherheit für alle Beteiligten:
 - schafft Klarheit und
 - vermeidet unnötige Konflikte (aufgrund unausgesprochener Erwartungen)

Beispiele

- **Ziel:** Entwurf und Implementierung eines modernen Internet-Auftritts
- **Nicht-Ziel:** Inhaltliche Überarbeitung der Website-Texte
- **Nicht-Ziel:** Keine Entwicklung neuer Features – im Rahmen des Projektes – nach Start des Rollouts

Nicht-Ziele - **Won't**

Funktionen von Zielen in Projekten

► Kontrollfunktion

Projekterfolg wird überprüfbar; Abweichungen lassen sich früh erkennen

► Orientierungsfunktion

„Road Map“ des Projektes; alle kennen den Zweck des Projektes;
Korrektur falscher Erwartungen (Nicht-Ziele)

► Verbindungsfunktion

Mitarbeitermotivation durch Einbindung in Zielformulierung und laufende Information
zum Gesamtstatus: „Wir“-Gefühl

► Koordinierungsfunktion

Ziele ermöglichen eine Strukturierung des Projektes mit arbeitsteiliger Zusammenarbeit

► Selektionsfunktion

Priorisierung bei der Bewertung von Alternativen; Entscheidungen im Projektverlauf
werden erleichtert

Bringt uns die Entscheidung näher zum Ziel oder entfernt sie uns vom Ziel?

Welche Alternative unterstützt am besten die Projektziele?

Quelle: [1], S. 102

Ziele müssen klar, spezifisch und messbar sein: SMART Prinzip

S

= Specific (spezifisch)

einfach, verständlich und präzise. Das „S“ wird vielfach als auch synonym für „schriftlich fixiert“ verwendet. Ziele sind immer **positiv** zu formulieren.

M

= Measurable (messbar)

klare Kriterien bzw. Grenzwerte zur Überprüfung der Zielerreichung

A

= Achievable (erreichbar)

unter realistischen Bedingungen erreichbar.

Aber durchaus anspruchsvoll. Oftmals wird das „A“ auch gleichgesetzt mit „attraktiv“ oder „aktiv beeinflussbar“.

R

= Relevant (relevant)

das Ziel muss relevant sein und in Bezug zum Gesamtziel stehen

T

= Terminated (terminiert)

Ist eine Frist gesetzt, innerhalb der das genannte Ziel erreicht werden soll?

Ggf. bietet sich die ergänzende Vereinbarung von terminierten Zwischenzielen an.



Nicht jedes Einzelziel muss alle SMART-Kriterien erfüllen, sondern das Gesamtpaket an Zielen

Beispiel: SMARTe Zielformulierung

Falsche Zieldefinition	Richtige Zieldefinition (SMART)
Entwickeln Sie möglichst schnell eine neue Version der CoroSuddy-App	Bis zum 31.05.2026 soll eine neue, mit 20 Anwendern erfolgreich getestete Version der CoroSuddy-App im Play-Store für die Anwender zur Verfügung stehen. Diese soll ergänzend zur bestehenden folgende neue Features beinhalten:
• Nicht spezifisch • Nicht messbar • Erreichbarkeit ist wegen ungenauer Spezifikation unklar • Nicht terminiert	✓ Spezifisch ✓ Messbar ✓ Erreichbar ✓ Relevant ✓ Terminiert

Beispiele: SMARTER Zielformulierungen

- ▶ Erstellung eines überzeugenden Businessplans, der alle relevanten Informationen und finanziellen Prognosen enthält, bis zum Ende des 2. Quartals
- ▶ Definition der Hauptfunktionalitäten und -merkmale des MVPs bis zum Ende Mai 2026
- ▶ Erstellung eines Minimum Viable Product (MVP) bis zum Ende des 2. Quartals
- ▶ Sammeln von Feedback von mindestens 10 potenziellen Nutzern des MVPs innerhalb des ersten Monats
- ▶ Gewinnung von mindestens drei potenziellen Investoren für das Startkapital von 20.000 EUR bis Ende 7/2026
- ▶ Erhöhung der Website-Klickrate um 15% innerhalb von zwei Monaten durch die Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit und des Website-Designs

Ziele müssen messbar sein bzw. gemacht werden

Ziele müssen möglichst **quantitativ messbar** sein, damit am Ende des Projektes eine objektive Überprüfung stattfinden kann, ob sie erfüllt wurden

Vorgehen

- ▶ Relevante Zielgrößen (Kennzahlen) ermitteln und festlegen
- ▶ Zahlen oder zumindest Größenordnungen, Zahlenintervalle, Grenzwerte, Minimal- oder Maximalwerte hierfür vereinbaren
- ▶ Qualitative Ziele durch subjektive Bewertungsverfahren beurteilen lassen

Falsche Zieldefinition	Richtige Zieldefinition
Möglichst viele Kongress- teilnehmer sollen Entscheider sein	Mindestens 70 % der Kongressteilnehmer sollen Entscheider sein. <u>Kriterium</u> : Auswertung der Anmeldeliste, aus der die Stellung der Teilnehmer im Unternehmen hervorgeht
Die Teilnehmer sollen mit dem Fachprogramm zufrieden sein	Die Teilnehmer bewerten das Fachprogramm mit mindestens der Durchschnittsnote „gut“ (2,0). <u>Kriterium</u> : Auswertung der Feedbackbögen

Chat Storm: Ziele „SMART“ formulieren

Jede/r formuliert ein besonders wichtiges Ziel seines Startup-Projektes mit der SMART-Regel (**spezifisch, messbar, erreichbar, relevant und terminiert**) und schreibt dieses in den Chat

Absenden erst auf Kommando des Dozenten

Timebox: 3 Minuten


Weitere Anforderungen an Projektziele

- ▶ Ziele müssen allen relevanten Stakeholdern **bekannt** sein, insbesondere Auftraggeber und Projektteam
- ▶ Ziele sind **lösungsneutral** zu definieren.
Projektteam muss die Möglichkeit haben, eine optimale Lösung zu finden
- ▶ Ziele müssen im **Einklang mit den Unternehmenszielen** und der Unternehmensstrategie stehen
- ▶ Ziele sollten während der Laufzeit des Projektes möglichst konstant sein
- ▶ Es darf **keine** ernsthaften **Zielkonflikte** geben – ggf. vor Projektbeginn lösen



PROJEKTUMFELD

Das Projektumfeld beeinflusst das Projekt und dieses wird vom Projekt beeinflusst

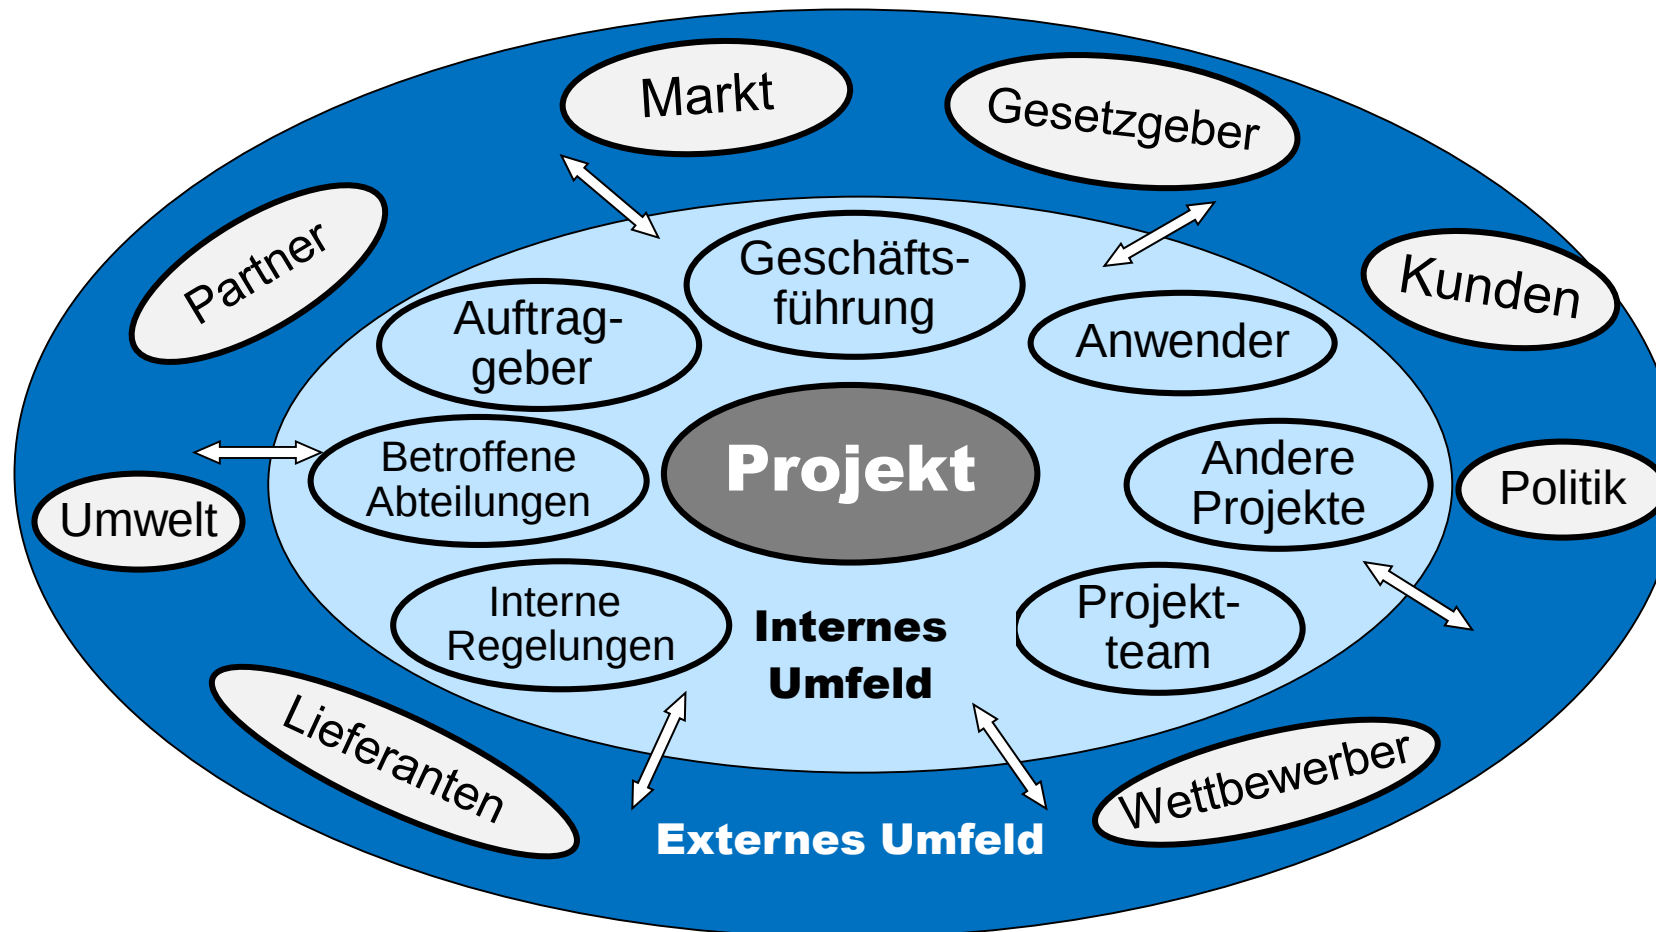


Ziele der Projekt-Umfeld-Analyse (PUA):
Identifikation und Bewertung aller Einflussfaktoren und Randbedingungen

Projektumfeldanalyse (PUA)

Grobe Analyse des Projektumfeldes

Gliederung

- ▶ **Soziale Faktoren:** wichtige Personen und Personengruppen
- ▶ **Sachliche Faktoren:** Gesetze, Technik, Ökonomie, Gesellschaft
- ▶ Zusätzliche Klassifizierung: **interne / externe Faktoren**

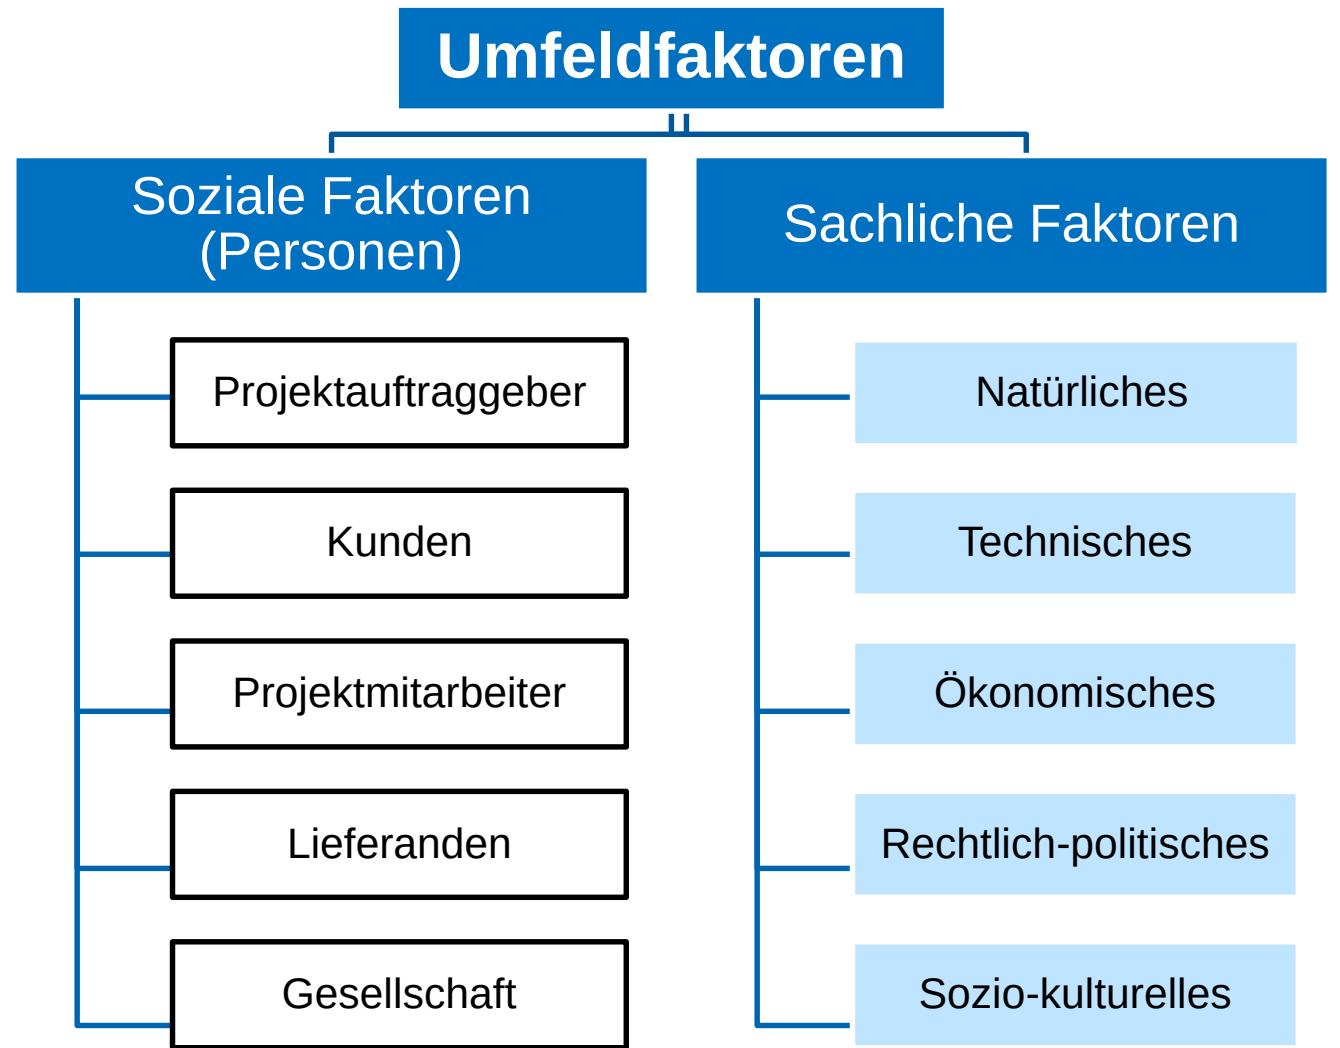

Verfeinerung der PUA im weiteren Projektverlauf

- Soziale Faktoren → **Stakeholdermanagement**
- Sachliche Faktoren → **Risikomanagement**

Projektumfeld gegliedert in interne und externe Faktoren (mit Beispiel)

	Sozial (Personen)	Sachlich
Intern	▪ Vorstand, Führungskräfte ▪ Betriebsrat / Personalrat ▪ Sonderbeauftragte: Qualität, Datenschutz, Sicherheit ▪ Mitarbeiter im Projekt ▪ Mitarbeiter außerhalb des Projektes	▪ Betriebsvereinbarung ▪ PM-Handbuch ▪ Richtlinien, Regelwerke (z.B. Beschaffungen) ▪ IT-Standards (intern) ▪ Produktions- /Testumgebung ▪ andere interne Projekte
Extern	▪ (externer) Auftraggeber ▪ Mitarbeiter der AG-Organisation ▪ Kunden ▪ Lieferanten / Berater ▪ Öffentlichkeit	▪ Gesetze ▪ IT-Sicherheit ▪ Normen und Standards ▪ Mitbewerbersituation ▪ Marktentwicklung

Quelle: [1]

Stakeholdermanagement

Risikomanagement

Management der Einflüsse auf das Projekt

Beispiel: Bürgerbeteiligungsplattform




Beispiel: Bürgerbeteiligungsplattform

	Sozial (Personen)	Sachlich
Intern	▪ Projektteam ▪ Projektleiter ▪ Product Owner ▪ Scrum Master ▪ Hr. Prof. Wehnes (Ansprechpartner)	▪ unterschiedliche Entwicklungsumgebungen
Extern	▪ Auftraggeber: Hr. C. Andersen (ZDI Würzburg) ▪ Hr. K. Walther (WiFö Würzburg) ▪ participate (Parallel-Projekt) ▪ Democy (Wettbewerber) ▪ mehrDemokratie! e. V. ▪ CONSUL Community ▪ Stadtrat Würzburg ▪ Stadtverwaltung Würzburg ▪ Bürger*innen Würzburg ▪ Bürgerinitiativen	▪ Datenschutz (EU-DSGVO) ▪ Technische Infrastruktur ZDI ▪ OpenSource Plattform CONSUL ▪ COVID-19

Beispiel: Bürgerbeteiligungsplattform

Sachliche Umfeldfaktoren	Beschreibung / Schnittstelle (zwischen Projekt und sachlichem Umfeld)	Maßnahmen	Übertragung ins Risikomanagement
Datenschutz	Rechtlich konformer Umgang mit persönlichen Daten	Sicherstellen der Daten; Erstellen einer Datenschutzerklärung	Ja
Technische Infrastruktur ZDI	Server zum Betreiben der Plattform	Nutzung des zur Verfügung gestellten Servers des ZDI (Auftraggeber)	Nein
Unterschiedliche Entwicklungsumgebungen	Harmonisierung der Umgebungen	Entwicklungsumgebung Virtual Box mit CONSUL, Github Repository	Nein
COVID-19	Einschränkungen der Zusammenarbeit und des Kontakts mit Stakeholdern	Einsatz von digitalen Tools, Feedback der Stakeholder durch digitale Meetings	Ja

1. Welche Umfeldfaktoren beeinflussen Ihr Projekt? – Grafik, Tabelle

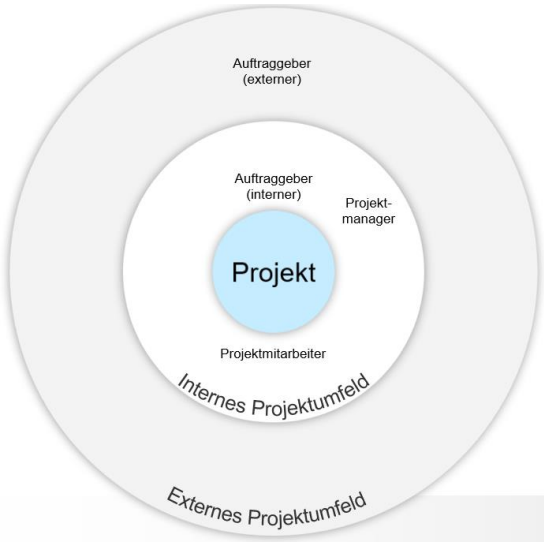

	Sozial (= Stakeholder)	Sachlich
Intern	▪ ▪ ▪	▪ ▪ ▪
Extern	▪ ▪ ▪	▪ ▪ ▪

2. Analysieren Sie die sachlichen Umfeldfaktoren Ihres Projektes!
Welche davon sind potentielle Projektrisiken?

Sachliche Umfeldfaktoren	Beschreibung / Schnittstelle (zwischen Projekt und sachlichem Umfeld)	Maßnahmen	Übertragung ins Risikomanagement

STAKEHOLDER MANAGEMENT

Definition: Projektstakeholder (Interessengruppen)



Stake: Anspruch, Interesse, Erwartung oder Forderung

„to have a stake in“ = „Interesse haben an“

Projektstakeholder (Interested Parties):

Einzelpersonen, Personengruppen oder Organisationen, die

- sich für das Projekt interessieren,
- am Projekt beteiligt sind,
- das Projekt beeinflussen können oder
- von den Auswirkungen des Projektes betroffen sind bzw. sich betroffen fühlen

Projekterfolg resultiert in hohem Maße aus einem guten Management der Stakeholder:

Kundenzufriedenheit, Mitarbeiterzufriedenheit und die Zufriedenheit der sonstigen Stakeholder (Lieferanten, Vertragspartner usw.)

Fünf prinzipielle Stakeholdergruppen

► Kunden

- Auftraggeber / Sponsor des Projektes
- Anwender / Nutzer des Projektproduktes

► Unternehmen, welches das Projekt durchführt

- Verschiedene Funktionsträger: Vorstand/Geschäftsführung, Personalrat, Datenschutzbeauftragter, Sicherheitsbeauftragter, Projektmanagement Office u.a.

► Mitarbeiter in den verschiedenen Rollen

- Projektleiter, Projektcontroller, Teammitglied, Projektadministrator, Mitglieder von Lenkungsausschüssen, Steuerungskreisen u.a.

► Lieferanten / Subauftragnehmer

- Subunternehmer, Ingenieurbüros, Berater, sonstige Dienstleister (Versicherung, Finanzen) u.a.

► Gesellschaft

- Anlieger, Behörden
- Bürgerinitiativen, Gesetzgeber u.a.



Welche Personen / Gruppen haben den größten Einfluss? Chatstorm

Wer hat den größten Nutzen vom Projektergebnis? Chatstorm


Wer könnte Ängste/Befürchtungen haben? Chatstorm

Wer könnte das Projekt noch wirkungsvoll unterstützen? Chatstorm


Inhalt von Stakeholdermanagement

Ziel: Zufriedenheit der Stakeholder → vertrauensvolle Projektarbeit

- ▶ **Stakeholder-Management Planung** zum Umgang mit den Stakeholdern, insbesondere Einbindung und Kommunikation
- ▶ Stakeholdermanagement-Prozess im Projektverlauf
 - Möglichst frühzeitig alle relevanten Stakeholder mit ihren Interessen, Wünschen, Ängsten, Einstellungen und Einflussmöglichkeiten ermitteln (**Identifikation**)
 - Diese in Bezug auf ihren Einfluss auf das Projekt bewerten (**Analyse**)
 - Geeignete Maßnahmen planen, umsetzen und deren Wirksamkeit kontrollieren, um den Projekterfolg sicherzustellen (**Maßnahmenplan**)
 - Sicherstellung, dass diese Maßnahmen erfolgreich sind (**Controlling**)
- ▶ Sicherung der Erfahrungen für Folgeprojekte (**Lessons learned**)

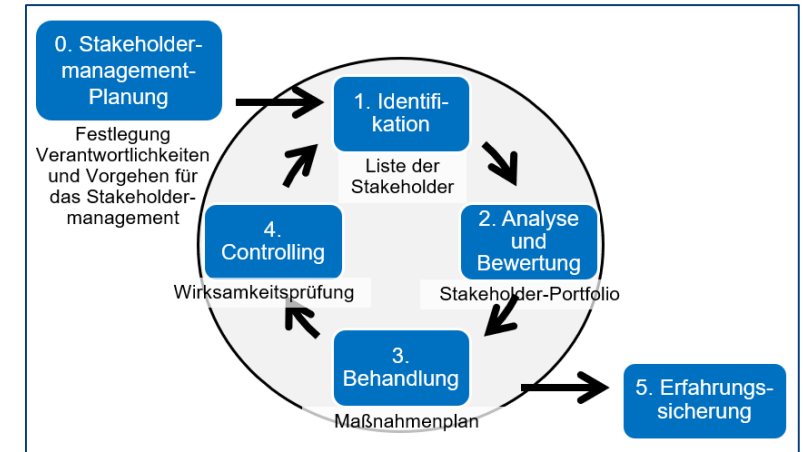

Der Stakeholdermanagement-Prozess sichert einen professionellen Umgang mit den Erwartungen der Stakeholdern

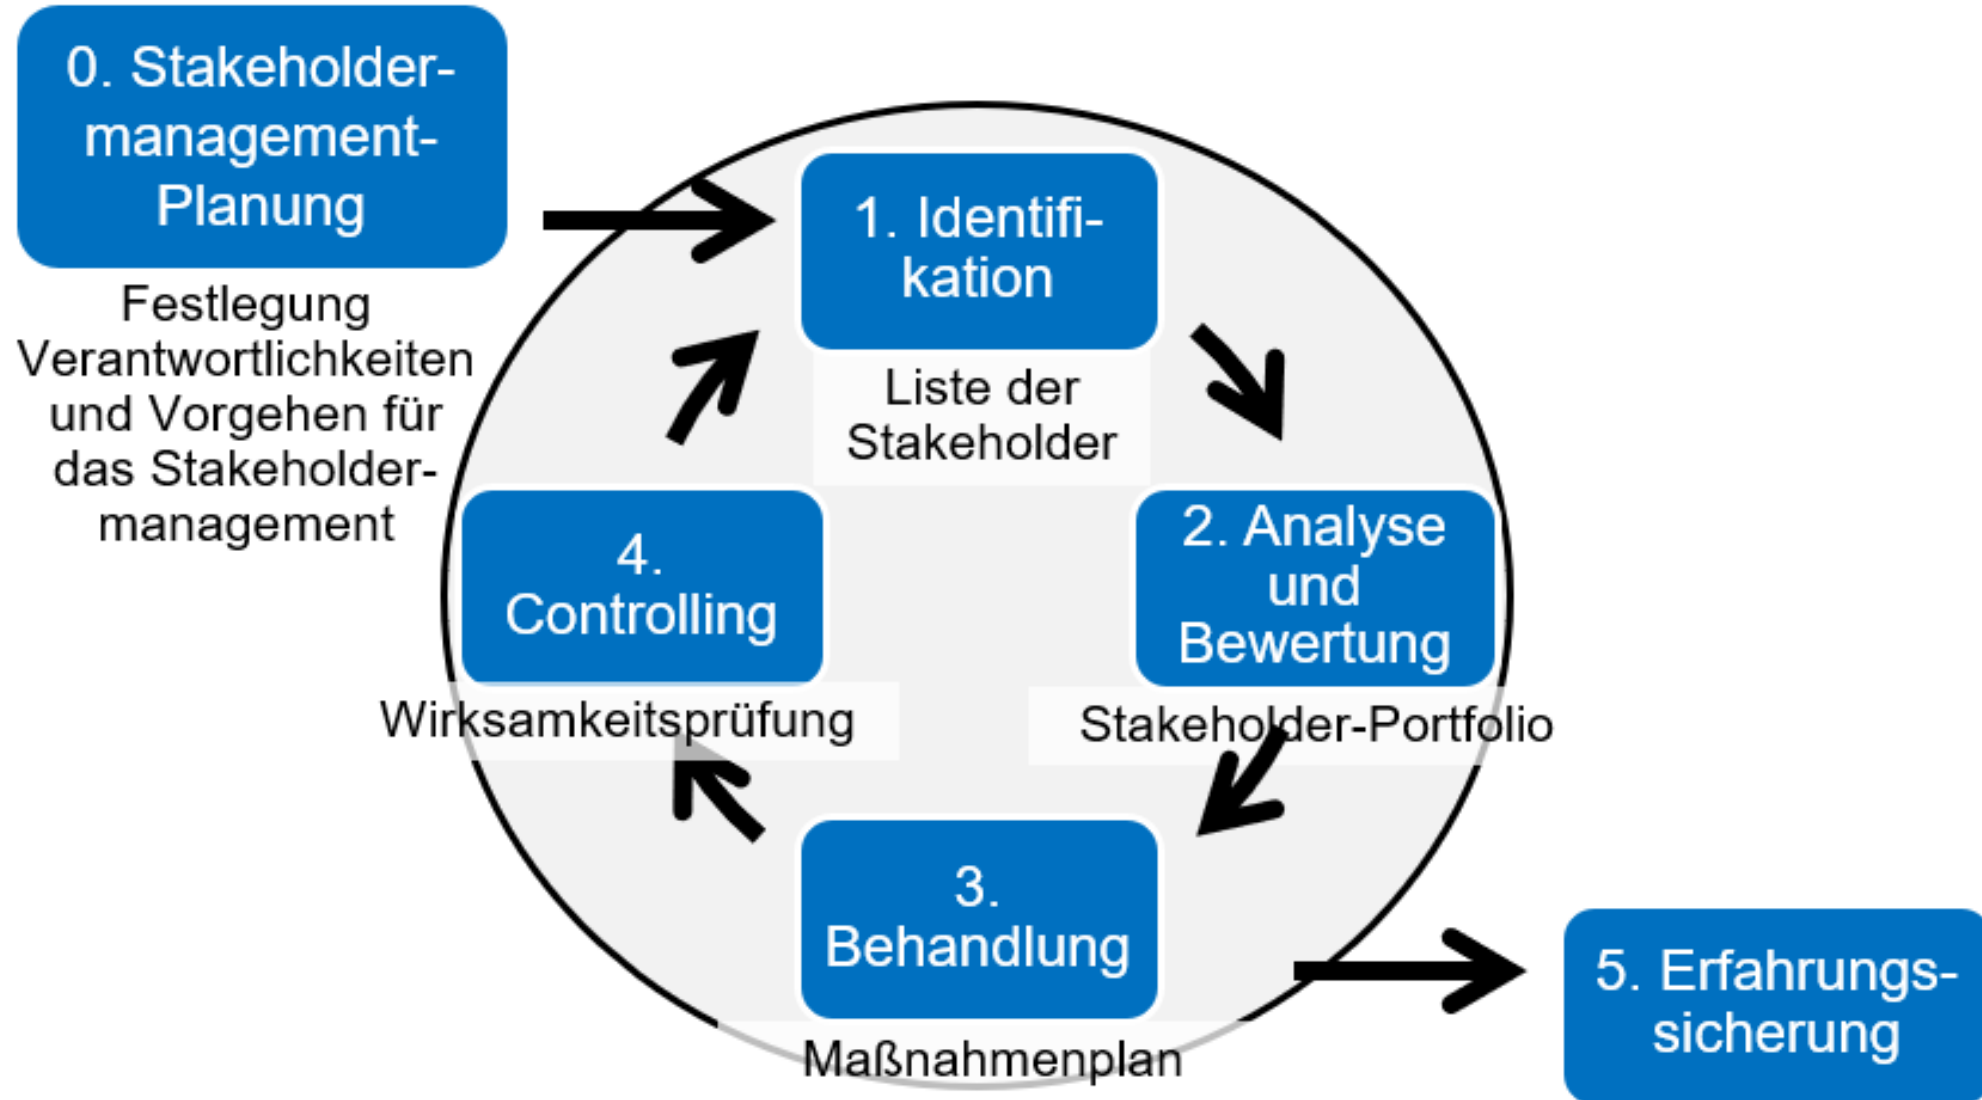

0. Stakeholdermanagement-Planung

- ▶ **Festlegung von Verantwortlichkeiten und Vorgehen für das Stakeholdermanagement im vorliegenden Projekt**
 - Rollen und Verantwortlichkeiten für Analysen, Maßnahmen und Controlling
 - Zeitpunkte im Projektverlauf zur Überprüfung des Stakeholderportfolios (Fortschreibung)
 - Verwendete Templates u.ä.
 - Klärung des Vorgehens zur Erfahrungssicherung

- ▶ **Ergebnisse**
 - **Stakeholdermanagement-Plan**
 - **Bewusstsein für Projektumfeld und Stakeholder**

1. Identifikation der Stakeholder

Vorgehen: Workshop durchführen (Leitfragen helfen)

- *Welcher Personenkreis ist durch das Projekt betroffen?*
- *Wer hat Interesse am Projekterfolg und könnte es wirkungsvoll unterstützen (Promotoren)?*
- *Wer könnte Ängste, Befürchtungen haben und gegen das Projekt sein?*
- *Wo könnten durch unterschiedliche Interessen oder Prioritäten Konflikte entstehen?*
- *Wer kann den Erfolg des Projektes verhindern (Opponenten)?*
- *Wer muss bzw. sollte an Projektentscheidungen mitwirken?*
- *Wer muss bzw. sollte über das Projekt informiert werden?*
- *Wer könnte als Meinungsführer gewonnen werden?*

Übersehene Stakeholder können den Projekterfolg gefährden!

Ergebnis: Stakeholderliste

Übersicht

Promotoren

Opponenten

Neutrale



2. Stakeholder-Analyse: Einstellung und Einfluss

Erwartungen

- Welche Erwartungen haben die Stakeholder – und warum?

Befürchtungen

- Welche Ängste / Befürchtungen haben sie – und warum?

Betroffenheit der Interessen durch das Projekt (Projektziele/ -ergebnisse)

- Grad der Betroffenheit: gering – mittel – stark
- Art der Betroffenheit: positiv – negativ



Einstellung zum Projekt

Einstellung ist abhängig von den **Erwartungen** und **Befürchtungen** und vom Grad und Art der (gefühlten) **Betroffenheit**
→ Einstellung zum Projekt: **positiv – neutral – negativ**

Einflusskraft auf das Projekt (Macht)


- Möglichkeit der Einflussnahme auf das Projekt: **gering – mittel – stark**
- Direkter / indirekter Einfluss auf das Projekt

2. Stakeholder-Analyse: Vorgehen

Ausgangsbasis: Stakeholderliste

Analyse (für jeden Stakeholder):

Projektverantwortliche versuchen sich in die Situation der jeweiligen Stakeholder zu versetzen

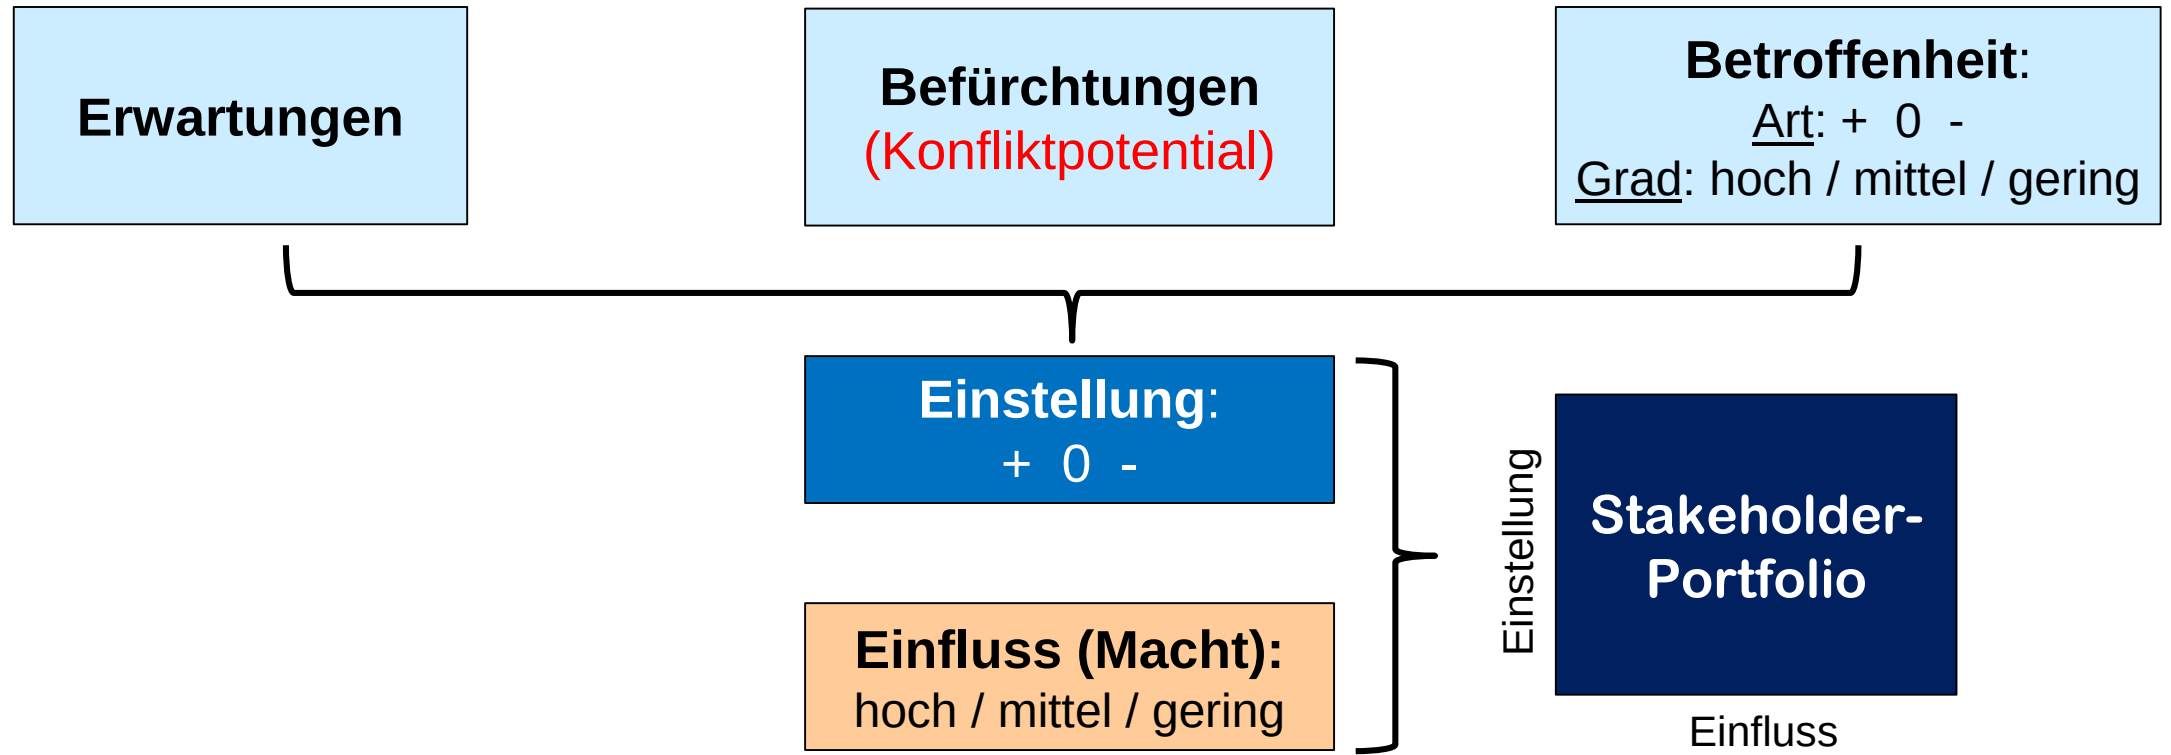

Konfliktpotential bei Stakeholdern mit negativer Einstellung

2. Vorlage „Stakeholderanalyse“


Stakeholder	Vermutete Erwartungen	Vermutete Befürchtungen	Betroffenheit		Erwartete Einstellung: + 0 -	Einfluss (Macht): h/m/g
			Art: + 0 -	Grad: h/m/g		

2. Stakeholderanalyse: Beispiel

ID	Stakeholder	Vermutete Erwartungen	Vermutete Befürchtungen	Betroffenheit		Erwartete Einstellung: + 0 -	Einfluss (Macht): h/m/g
				Art: + 0 -	Grad: h/m/g		
1	Auftraggeber: Hr. C. Andersen (ZDI, WÜ)	Plattform zur digitalen Bürgerbeteiligung	Zu viele verschiedene Lösungen für die Stadt Würzburg mit dem selben Ziel	+	h	+	m
2	Hr. K. Walther (WiFö Würzburg)	Überzeugung des Wirtschaftsbeirats (Idee & MVP) stufenweiser Ausbau der Beteiligungsmöglichkeiten über CONSUL	mangelnde Akzeptanz Stadtverwaltung aufgrund zusätzlichen Aufwands mangelnde Bürgerbeteiligung Projekt wird nach Semesterende nicht weiter vorangetrieben	+	g	+	h
3	mehrDemokratie! e. V.	Leuchtturmimplementierung für die Region	Schlechte Implementierung und Präsentation der Plattform	+	m	+	g
4	CONSUL Community	erfolgreiche Umsetzung auf der Welt	Missbrauch der Open-Source Plattform	+	g	+	g
5	Stadtrat Würzburg	höhere Akzeptanz bei politischen Entscheidungen	Hoher Aufwand der Auswertung und des Betriebs, geringe Beteiligung der Bürger, kein Mehrwert für zukünftige Entscheidungen	+	h	-	h
6	Bürger*innen Würzburg	Flexible und einfache Beteiligung bei politischen Prozessen	Stadt geht nicht auf die Vorschläge ein, Einseitiger Einfluss durch demographische Gruppen	+	m	0	g
7	Bürgerinitiativen	Plattform um mehr Beteiligung für ihre Anliegen zu erhalten	Bürger sind nicht auf der Plattform aktiv	+	h	+	g
8	Stadtverwaltung	intensiverer Austausch von Politik und Bevölkerung	Aufwand für Administration und Moderation der Plattform	-	h	-	m

2. Stakeholderportfolio mit Beispiel

ID	Stakeholder
1	Auftraggeber: Hr. C. Andersen (ZDI Würzburg)
2	Hr. K. Walther (WiFö Würzburg)
3	mehrDemokratie! e. V.
4	CONSUL Community
5	Stadtrat Würzburg
6	Bürger*innen Würzburg
7	Bürgerinitiativen
8	Stadtverwaltung

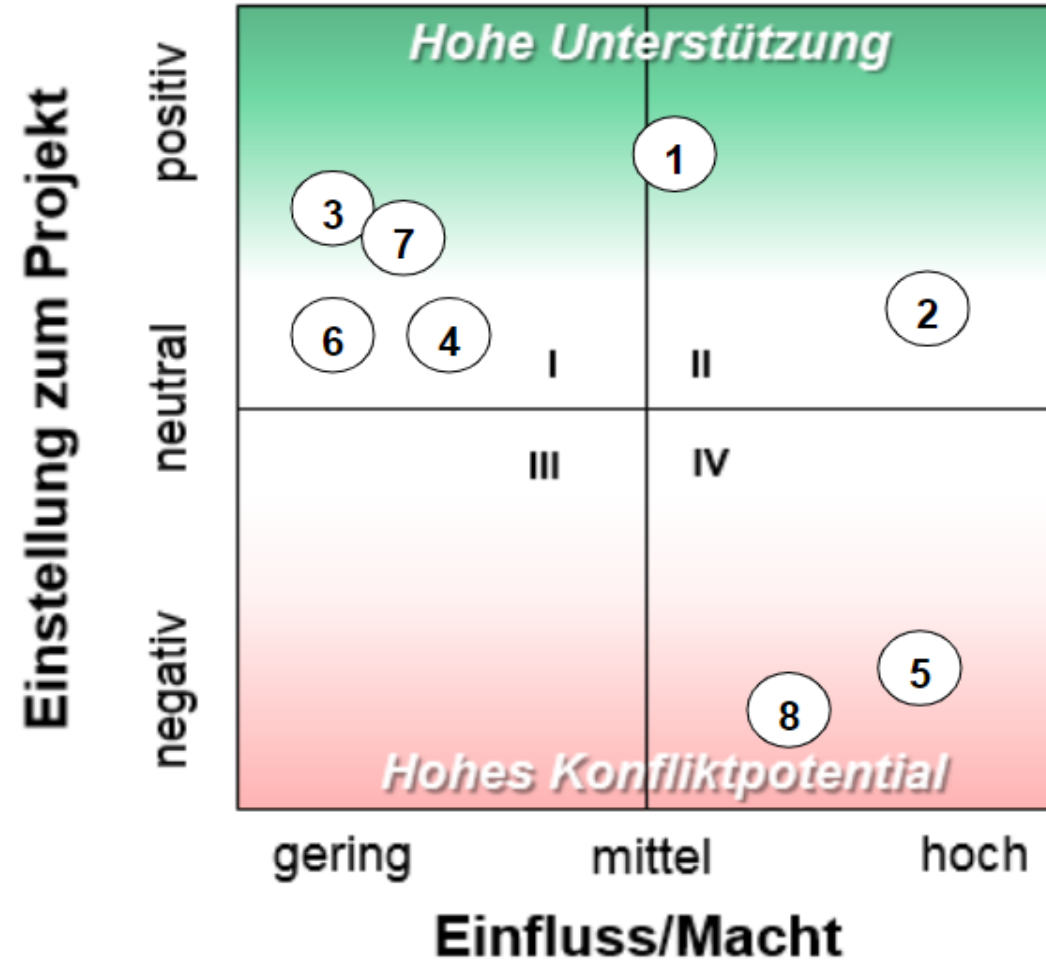


2. Stakeholderanalyse: weiteres Beispiel

Stakeholder	Vermutete Erwartungen	Vermutete Befürchtungen	Betroffenheit		Erwartete Einstellung: + 0 -	Einfluss (Macht): h/m/g
			Art: + 0 -	Grad: h/m/g		
Kunde (Bewerber*innen)	Erfolgreich Lebenslauf erstellen.	Lebenslauf wird nicht professionell erstellt. Webseite funktioniert nicht.	+	hoch	+	hoch
Recruiting Unternehmen	Unternehmen können durch die Webseite schnelleren Zugriff auf Bewerber*innen Daten erhalten und diese in ihre DB aufnehmen.	Das Parsen von Lebensläufen funktioniert nicht. Lebenslauferstellung wird nicht vereinfacht.	+	mittel	+	hoch
Auftraggeber	Am Ende steht eine Webseite, die professionelle Lebensläufe erstellt.	Webseite ist nicht funktionsfähig. Es gibt kein Abnahmeprodukt.	+	mittel	+	hoch
EasyRecruiting Team	Deployment einer Webseite zur reibungslosen Lebenslauferstellung in englisch und deutsch.	Gewollte technische Funktionalitäten lassen sich nicht umsetzen. Webseite funktioniert nicht reibungslos. Keine Marktnachfrage	+	hoch	+	hoch
Wettbewerber	Zusammenarbeit mit easyRecruiting, um gemeinsam mehr zu erreichen.	easyRecruiting könnte eine große Konkurrenz sein und sie vom Markt verdrängen.	-	hoch	-	mittel
Datenschutz-beauftragte	Die Datenschutz-Rechte der Nutzer werden nicht verletzt.	Datenschutz wird nicht eingehalten. Mit sensiblen Daten wird unverantwortlich umgegangen.	-	mittel	-	mittel
Hr. Prof. Wehnes	Entwicklung eines fertigen Produkts, das von vielen benutzt werden kann. Anwendung von PM- Theorie in der Praxis.	Teammitglieder brechen ab und steigen aus. Kein Endprodukt kommt zustande.	+	mittel	+	mittel
Open-Source-Community	Jeder hat Zugriff auf die Webseite zur Lebenslauferstellung.	Webseite ist nicht für alle zugreifbar.	+	mittel/ niedrig	0	gering

2. Stakeholderportfolio (weiteres Beispiel)

Nr.	Stakeholder
1	Kunde (Bewerber*innen)
2	Recruiting Unternehmen
3	Auftraggeber
4	easyRecruiting Team
5	Wettbewerber
6	Datenschutzbeauftragte
7	Hr. Prof. Dr. Wehnes
8	Open-Source-Community

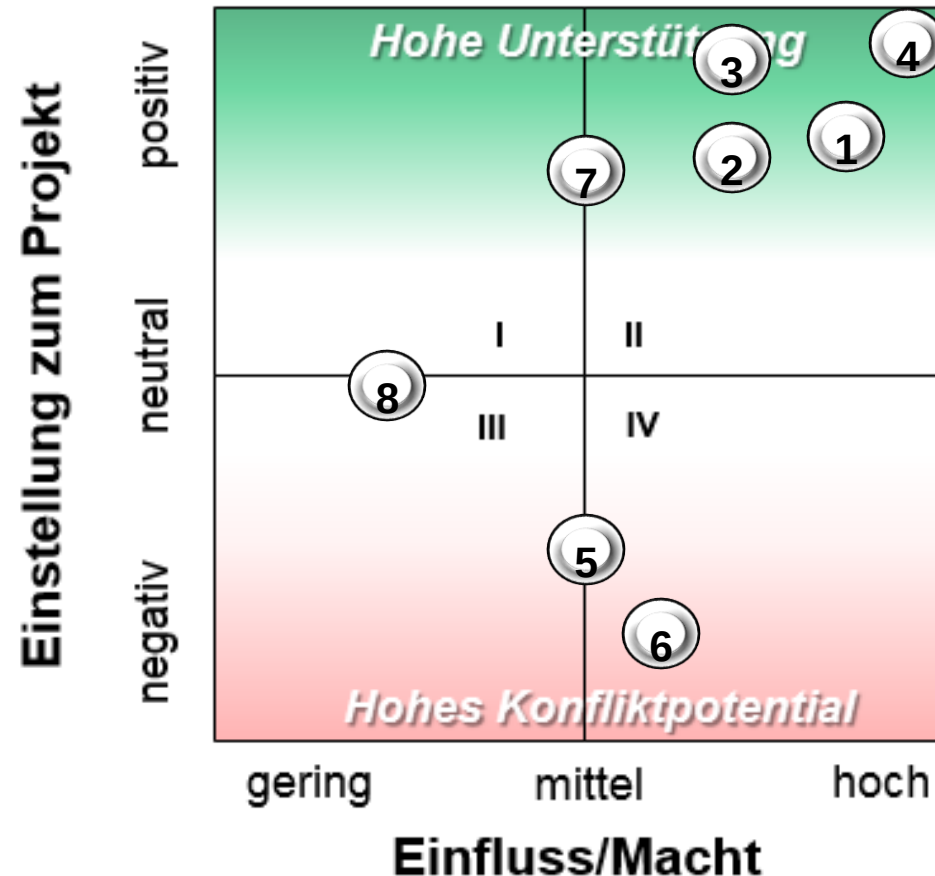

Datenschutzbeauftragte und Wettbewerber stehen dem Projekt **negativ** gegenüber und könnten es gefährden

→ Maßnahmen implementieren

3. Stakeholder-Maßnahmenplanung

- Maßnahmen zur Verringerung der Widerstände von Opponenten (z.B. Abbau von Ängsten und Befürchtungen)

- Win-Win-Situationen anstreben
- Pro-Kontra-Argumente herausarbeiten
- „Botschaften“ für Zielgruppen erarbeiten
- Vertrauensbasis schaffen
- Ehrliche und klare Kommunikation
- Evtl. Partizipation in der Projektarbeit

+ Maßnahmen zur Stärkung der Promotoren (Förderer)

- Lückenlose Information
- Persönliche Beziehung aufbauen
- Einbeziehung von Meinungsbildnern und Multiplikatoren

3. Maßnahmenplanung: Strategien

	Partizipative Strategie	Diskursive Strategie	Repressive Strategie
Merkmal	Beteiligung oder aktive Einbindung	Ringen um einen Interessenausgleich	Machteinsatz
Typisches Vorgehen	• Beteiligung an Entscheidungen • Beteiligung in der Projektarbeit • Information über wichtige Entwicklungen	• Führen von Verhandlungen • Einsatz von Methoden des Konflikt- und Verhandlungsmanagements	• Druck und Drohung • Vollendete Tatsachen schaffen • Nur Pseudo-Beteiligung • Selektive Informationen
Chancen	Wertvolle Beiträge des Stakeholders; Abbau von Vorbehalten	Nachhaltiger Interessenausgleich	Keine Gefahr mehr für den Projekterfolg
Gefahren	Verzögerung durch Beteiligung	Ausgleich mit Kompromiss → evtl. Nachteil für das Projekt	Nachhaltige Störung der Kommunikation mit dem Stakeholder

3. Maßnahmenplanung: Beispiele

Partizipative Strategie	Diskursive Strategie	Repressive Strategie
Beteiligung oder aktive Einbindung	Ringen um einen Interessenausgleich	Machteinsatz
▪ Aufnahme des Stakeholders in den Lenkungsausschuss ▪ Beteiligung des Stakeholders in der Projektarbeit ▪ Laufende Information über Entscheidungen bzw. wichtige Entwicklungen im Projekt	▪ Anhörung von Befürchtungen ▪ Berücksichtigung und Umsetzung von Interessen, sofern möglich ▪ Gespräche führen ▪ Einführung einer Hotline für schnelle Hilfe	▪ Stakeholder vor die Wahl stellen mitzumachen oder das Unternehmen zu verlassen

Ziel: Partizipative Strategie (Win-win-Lösungen schaffen)




Königsweg: „Betroffene zu Beteiligten machen“

3. Beispiel: Maßnahmen

ID	Stakeholder	Maßnahme
1	Auftraggeber: Hr. C. Andersen (ZDI Würzburg)	Befürchtungen reduzieren durch Überzeugung des Wirtschaftsbeirats mit Präsentation und Live-Demo
2	Hr. K. Walther (WiFö Würzburg)	Angst vor Mehrarbeit nehmen durch Demonstration der Bedienungsfreundlichkeit der Plattform, Gesamtheitliches Konzept zur Bürgerbeteiligung
3	mehrDemokratie! e. V.	keine Maßnahme identifiziert
4	CONSUL Community	keine Maßnahme identifiziert
5	Stadtrat Würzburg	Konzept zur idealen Nutzung und Einbindung der Bürger*innen
6	Bürger*innen Würzburg	Bewusstsein für Bürger*innenbeteiligung schaffen, um höheren Einfluss der Bürger*innen auf die Stadt zu schaffen
7	Bürgerinitiativen	keine Maßnahme identifiziert
8	Stadtverwaltung	Präsentation von Moderationsmöglichkeiten und Übernahme von Aufgaben durch Bürger*innen


3. Beispiel: Maßnahmen mit erwarteten Änderungen

ID	Stakeholder
1	Auftraggeber: Hr. C. Andersen (ZDI Würzburg)
2	Hr. K. Walther (WiFö Würzburg)
3	mehrDemokratie! e. V.
4	CONSUL Community
5	Stadtrat Würzburg
6	Bürger*innen Würzburg
7	Bürgerinitiativen
8	Stadtverwaltung

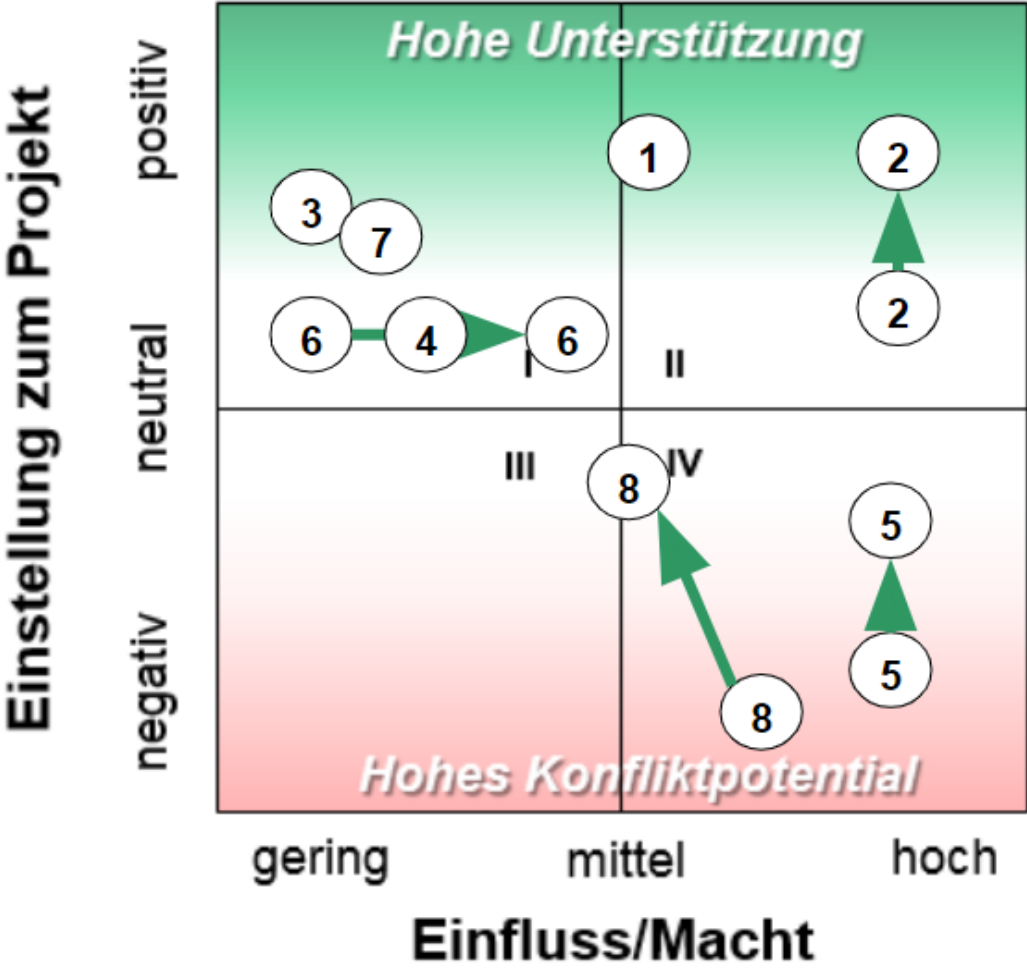

3. Beispiel: Maßnahmen mit erwarteten Änderungen

Nr.	Stakeholder	Maßnahmen
1	Kunde (Bewerber*innen)	Kunde wird durch User Test und Interviews miteinbezogen.
2	Recruiting Unternehmen	Keine Maßnahmen.
3	Auftraggeber	Zweiwöchige Meetings mit Auftraggebern, sowie ständige Kommunikation über den Slack Kanal.
4	easyRecruiting Team	Wöchentliche Meetings zur Bearbeitung und Besprechung des Projekts.
5	Wettbewerber	Zusammenarbeit anbieten.
6	Datenschutzbeauftragte	Datenschutzerklärung verfassen. Möglichkeit der Löschung von Daten.
7	Hr. Prof. Dr. Wehnes	Aktives Mitarbeiten in der Vorlesung, im Projekt und Vorbereitung der Aufgaben.
8	Open-Source-Community	Keine Maßnahmen erstmal benötigt.

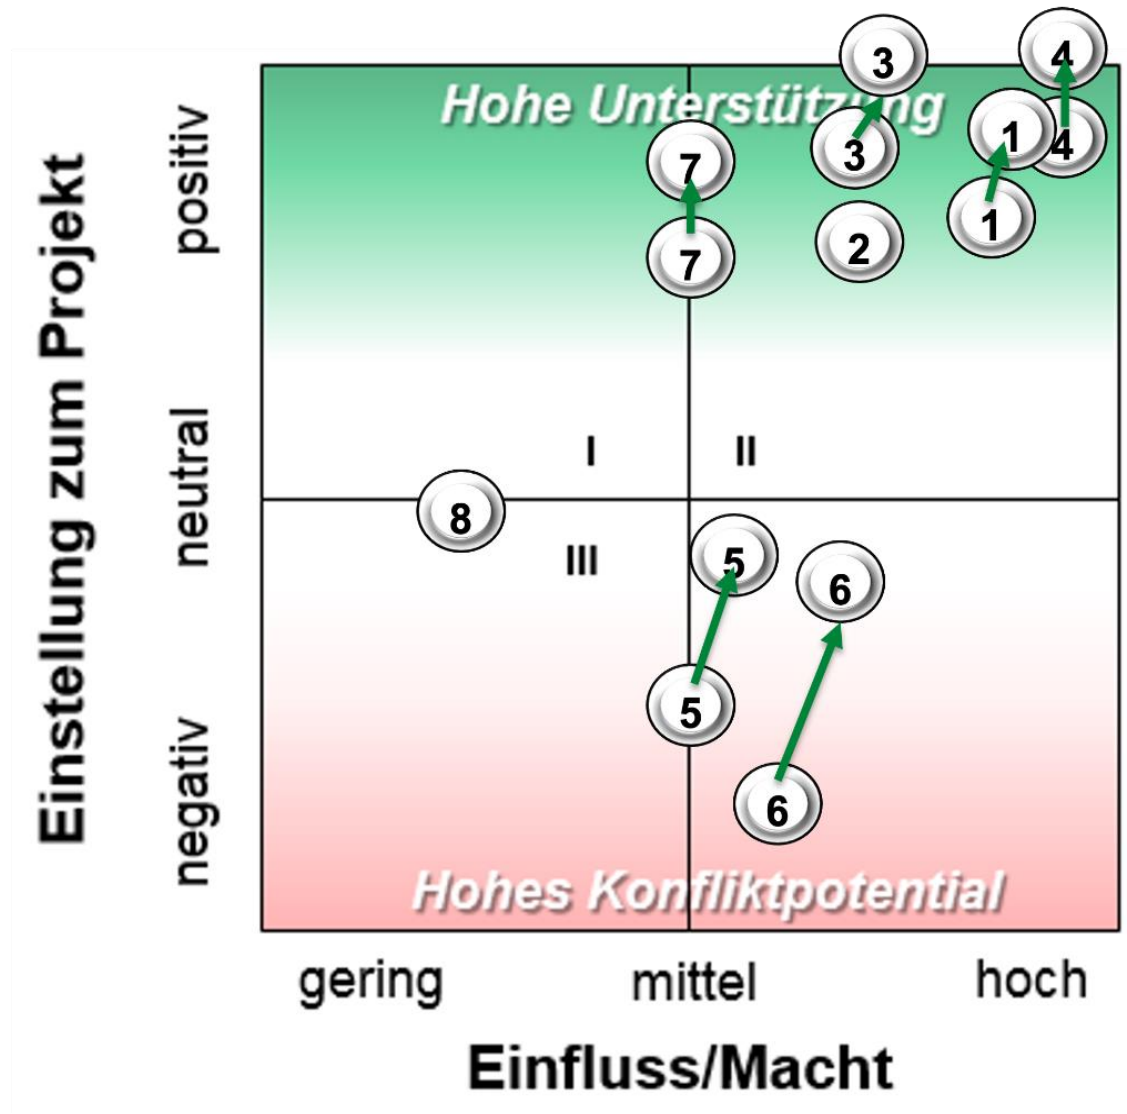

Workshop Stakeholdermanagement

1. Führen Sie für einen wichtigen potentiellen **Nutzer** Ihres Projektproduktes/ -services eine **Stakeholderanalyse** durch
Verwenden Sie dazu die Vorlage Stakeholder-Analyse.xlsx

Stakeholder	Vermutete Erwartungen	Vermutete Befürchtungen	Betroffenheit		Erwartete Einstellung: + 0 -	Einfluss (Macht): h/m/g
			Art: + 0 -	Grad: h/m/g		

2. Überlegen Sie sich eine geeignete **Maßnahme** für diesen Stakeholder
- Maßnahme:
 - Erwartete Veränderung:
3. Erstellen Sie ein **Stakeholderportfolio** vor und nach der Maßnahme für diesen Stakeholder ([Template: Stakeholderportfolio](#))

4. Controlling (Monitoring und Steuerung)

**Die Ergebnisse der Stakeholderanalyse bleiben projektintern.
Sie gehen nicht nach außen!**

Projektstakeholder-Identifikation, -Analyse und -Maßnahmenplanung sind im Projektverlauf mehrfach durchzuführen

- Durchführung der Maßnahmen sind zu kontrollen
- Wirksamkeit der Maßnahmen ist zu kontrollen
- Stakeholderidentifikation und -analyse stellen immer nur eine Momentaufnahme dar
- Geeigneter Zeitpunkt für Neubetrachtung/-bewertung: Beginn einer neuen Projektphase

Controlling-Fragen


- *Wurden die getroffenen Maßnahmen durchgeführt?*
- *Waren diese Maßnahmen erfolgreich?*
- *Gibt es neue Stakeholder?*
- *Haben sich bisherige Stakeholderpositionen wesentlich verändert?*
- *Welche neuen Maßnahmen sind zu veranlassen?*

5. Erfahrungssicherung

- ▶ **Dokumentieren** Sie Ihre Erfahrungen im Projektverlauf!
- ▶ Führen Sie spätestens am Projektende eine **Reflexion** (Nachbetrachtung) Ihres Stakeholdermanagements durch!
- ▶ Leiten Sie daraus **Optimierungen** (Prozesse, Templates u.a.) für Folgeprojekte ab!

Praxistipps zu Ziele und Stakeholdermanagement

- ▶ Es gibt häufig mehr Stakeholder als man denkt
 - ⇒ Ein **intensiver Identifikationsprozess** der Projektstakeholder vermeidet unangenehme Überraschungen im Projektverlauf und schafft zusätzliche Chancen zur Erhöhung des Projekterfolgs
- ▶ Schaffen Sie **Win-Win-Situationen!**
 - ⇒ Es gibt mehr Win-Win-Konstellationen, als man denkt
- ▶ Nehmen Sie wichtige **Stakeholder-Interessen in den Zielekatalog** auf!

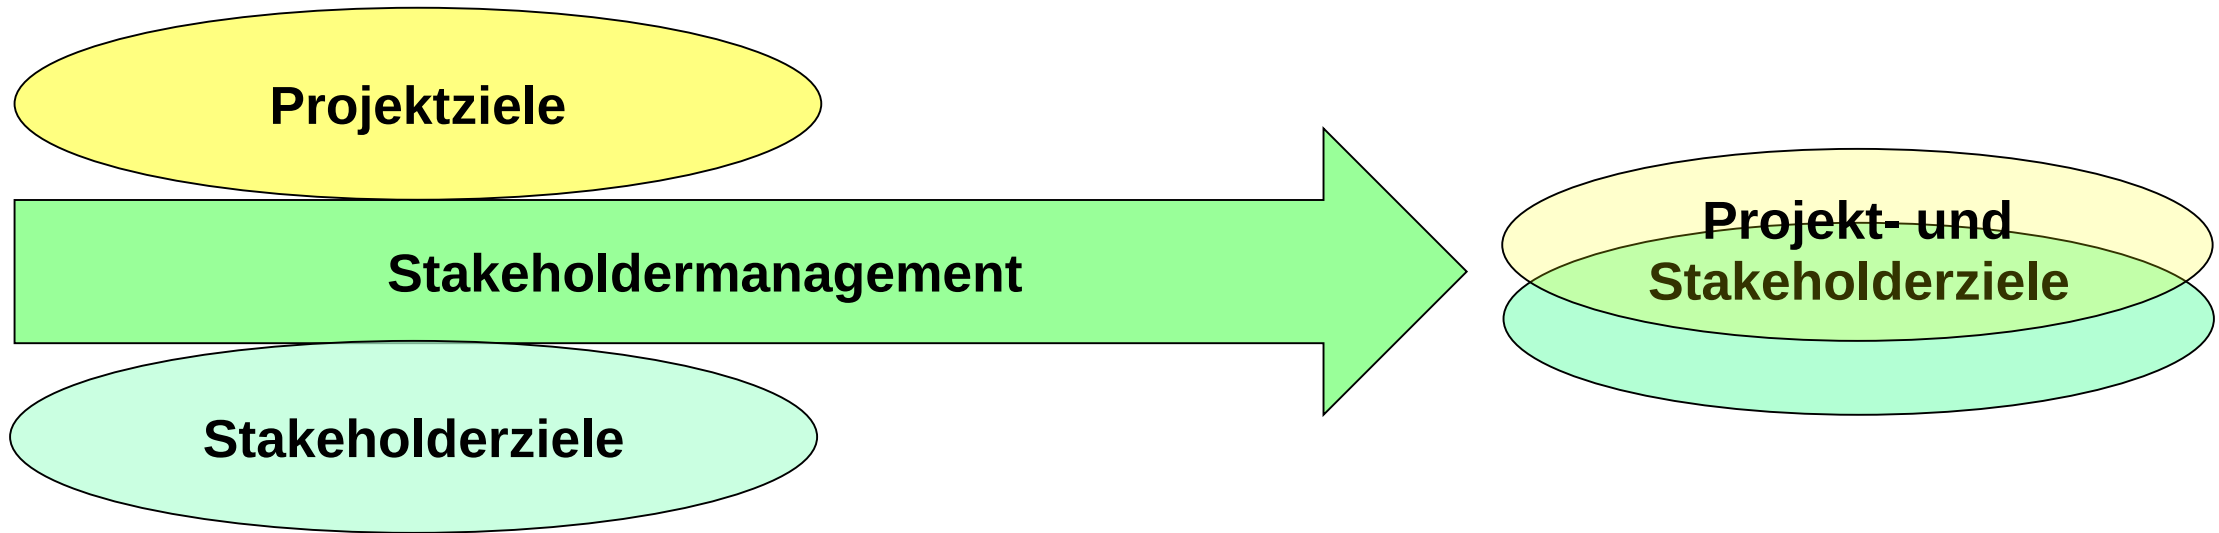

AUFGABE 6

Aufgabe 6: Projektziele, Projektumfeld, Stakeholder Management

1. Vervollständigen Sie die **Projektumfeldanalyse**

Hinweis: Auf Durchgängigkeit achten: „Projektumfeldfaktoren-Tabelle → Schnittstellenmatrix“

2. Vervollständigen Sie die **Stakeholderanalyse**

mit Maßnahmenplanung und Stakeholderportfolio sowie Darstellung der erwarteten Veränderungen des Stakeholderportfolios durch die Umsetzung der Maßnahmen

3. Führen Sie eine **Reflexion** der Projektmanagement-Prozesse und der Ergebnisse durch

Erstellen Sie eine Präsentation **Umfeld-Stakeholder-Team_x**

- Ergebnisse von 1. und 2.
- Reflexionen (jeweils eine Folie)
- Projektstatus (Sprintziel und aktuelles Taskboard)
- Nächste Schritte
- Upload auf WueCampus2 bis 06.06.2026 / 23:55: **Umfeld-Stakeholder-Team_x**

Präsentation am 08.06.2026 durch die aktuellen Product Owner der **Teams 5 und 6**

Dauer: max. 8 Minuten
