

Professionelles Projektmanagement in der Praxis - Mit digitalen Unternehmensgründungsprojekten

Prof. Dr. Harald Wehnes

Veranstaltung 8 (15.06.2026):

- **Sprint Review, Sprint Retrospective**
- **Lean Startup: Pivoting**
- **Sprint Planning 3**

Partner:

Servicezentrum
Forschung und
Technologietransfer
(SFT)


Innovations- & Gründerzentrum
WÜRZBURG

 **ZDI**
ZENTRUM
FÜR DIGITALE INNOVATIONEN
MAINFRANKEN

Lehrveranstaltungsevaluation Sommersemester 2026

- ▶ Bitte mitmachen
- ▶ Evtl. kann ich noch Vorschläge im weiteren Verlauf dieser Veranstaltung umsetzen

AI Week Mainfranken

22. bis 26. Juni 2026

Bayerns erstes dezentrales Festival mit Schwerpunkt KI in Mainfranken und online.

Warum dabei sein?

- **KOSTENLOS**
- Workshops, Vorträge und praktische Formate
- neue Unternehmen kennenlernen
- Werkstudi-Jobs, Praktikumsplätze und Abschlussarbeiten finden

Zum Programm



**Gründen@
Würzburg**

Gründen@Würzburg Start-ups Kontakt

KONTAKT

Würzburger StartUP Preis



Der Eintritt ist frei,
die Plätze sind jedoch
beschränkt! Hier gleich
ein Ticket sichern:



Dienstag 23.06.2026 | 18:00 Uhr
Live im Mainfranken Theater
Stimmt mit ab über die innovativsten Gründungsprojekte und Jungunternehmen aus Stadt und Landkreis Würzburg sowie ganz Mainfranken in den Kategorien „Global Hero“ & „Local Hero“ und entscheidet mit, wer die jeweils **10.000 € Mediabudget der Main-Post** und die jeweils **1.000 € Preisgeld von Gründen@Würzburg bzw. Wirtschaftsjunoren** erhält.

Preis. Der Preis wird in den Kategorien „Global Hero“, für innovative, skalierbare Geschäftsmodelle mit dem Potenzial, überregional erfolgreich durchzustarten, und „Local Hero“, für innovative, regional aktive Gründungsideen, verliehen. Im Rahmen eines Bewerbungsverfahrens werden pro Kategorie je drei Teams nominiert, die am Abend der Preisverleihung gegeneinander antreten und ihre Geschäftsideen in kurzen Pitches präsentieren. Die Gewinner*innen werden vom Publikum und einer Expert*innenjury gemeinsam gewählt und bekommen neben einem Preisgeld weitere wertvolle Dienstleistungs- und Sachpreise.

Für alle an Start-ups und der Gründungsszene Interessierten. Eintritt frei!

Seid dabei und meldet Euch an:

Hier gerne auf den Link klicken und bei Eventbrite gleich für das Event anmelden. Schnell sein, denn die Plätze sind begrenzt!

ANMELDUNG WÜRZBURG STARTUP PREIS

Information zu allen Vorlesungen

- **Wir starten jede Vorlesung auf die Minute pünktlich!**
- Bitte rechtzeitig einwählen.
- Videokamera bitte einschalten – Bei Gruppenarbeit immer einschalten!
- Mikrofone bitte stumm schalten, wenn vorgetragen wird
- Fragen / Anmerkungen / Rückmeldungen per Handzeichen-Symbol oder über den Chat
- Die Vorlesung wird aufgezeichnet und auf WueCampus zur Verfügung gestellt (nur für Vorlesungsteilnehmer!)
Die Aufzeichnungen beschränken sich in der Regel auf die Vorträge des Dozenten.
Studentische Vorträge werden für den Dozenten zur Benotung aufgezeichnet;
diese Vorträge werden nicht auf WueCampus gestellt.
- Bitte Bescheid geben, wenn jemand verhindert ist
- Themen der Workshops haben hohe Relevanz für die Klausur

Zeitplan

12:15 – 13:30 MVP 2 - Präsentationen (Sprint Review)

13:30 Retrospektive zu 2. Sprint

13:45 Pause



14:15 Lean Startup: Pivoting

14:30 Vorbereitungen für 3. Sprint

14:45 Sprint Planning 3. Sprint

- Aufgabe 8

15.45 Ende

Vorstellung der 2. MVP

Zeit	Team	Projekt	Wissenstransfer <i>Präsentationen aller Teams aktiv begleiten: Jeder Teilnehmer soll mindestens ein „Element“ bei einem anderen Team identifizieren, das er für geeignet findet, um es im eigenen Projekt zu übernehmen</i>
12:20 – 12:30	6	Data Digitalization	
12:30 – 12:40	5	Funeral Compass	
12:45 – 12:55	4	Patientenakte	
12:55 – 13:05	3	MindLeague	
13:10 – 13:20	2	Musikstadt Würzburg	
13:20 – 13:30	1	Mindocu	

Organisatorisches

- ▶ Nächste Vorlesungstermine
 - 22.06.2026: im ZUSE-Hörsaal
 - 29.06.2026: online
 - 06.07.2026: im ZUSE-Hörsaal
 - 13.07.2026: im ZUSE-Hörsaal (öffentliche Abschlussveranstaltung mit Jury und Preisvergabe)

- ▶ Klausurtermine am 21.07.2026 im ZUSE-Hörsaal
 - 9:00 – 10:20 Uhr: Klausur zur Vorlesung
 - 16:00 – 17:00 Uhr: Klausur zum Hochschulzertifikat „Modernes Projektmanagement“ (optionale Teilnahme)

SPRINT RETROSPEKTIVE

Chat Storm: „Cherry picking“ (Wissenstransfer)

Was fanden Sie bei anderen Teams besonders gut und könnte für Ihr Projekt übernommen werden?

Ergebnisse

- Automatisiertes Testen
- User Reviews sind etwas was sehr sinnvoll sind und früh Feedback geben können. Das sollten wir nachholen
- Prinzip von "naiver" einfacher Lösung, um eine Verkomplizierung von Funktionen zu verhindern
- Dass umfangreiche Funktionen übersichtlich dargestellt wurden
- Anschauliches Logo und Titel
- starkes backend
- übersichtlichere Task-Boards
- Nutzung von System Usability Score und Angabe von der Häufigkeit von Fehlern bei User Tests, Testing Schritt auf dem Task Board
- Role and rights management
- übersichtlicheres taskboard
- Gutes Testing
- strukturierte Tests einzelner Funktionen
- automatic testing
- Mehr Testing der Zwischenschritte

Erfolgsmessung der Retro-Maßnahmen des 1. Sprints

Breakout-Session:

- ▶ Welche Maßnahme wurde im Rahmen der Retrospective zu Sprint 1 beschlossen?
- ▶ Was war der Erfolg?


Ergebnisse werden durch den PO anschließend in den Chat geschrieben

- Realistischere Ziele setzen, regelmäßigere Gruppenupdates
Resultat: Bessere Kommunikation und Aufgabenverteilung im Team
- taskboard software verwenden -> so semi erfolgreich im kontext der vorlesung, aber erfüllt seinen zweck besser als das alte
- Implemented better design / design variations,
successful: more readable, more visually appealing
- What went bad: no Story Points during planning (Fibonacci values were added afterwards); three usability findings emerged that the team had not anticipated; the OCR progress bar stalled at around 40% on scanned PDFs; the team built ahead of scope in places, so the board did not reflect the real state of the work; and the Settings “Delete data” action still used a native browser confirm() dialog instead of an in-app dialog.
Improvements: estimate every User Story in Story Points during planning, using Planning Poker; close the three survey usability findings inside Sprint 2; and track ahead-of-scope work as real stories so that the board matches reality. In addition, the team adopted one idea from another team’s review — Team 5’s bilingual itemised PDF report export
- Aufgabeverteilung wurde frühzeitig geklärt. -> Aufgabenlast wurde besser verteilt.
- Wir wollten ein übersichtlicheres Taskboard haben --> haben dafür die User Stories in bessere Aufgaben unterteilt, mit denen die Teammitglieder mehr anfangen konnten (es war klar, wer was zu tun hatte)

Coffee
Break



Scrum Prozess im Überblick

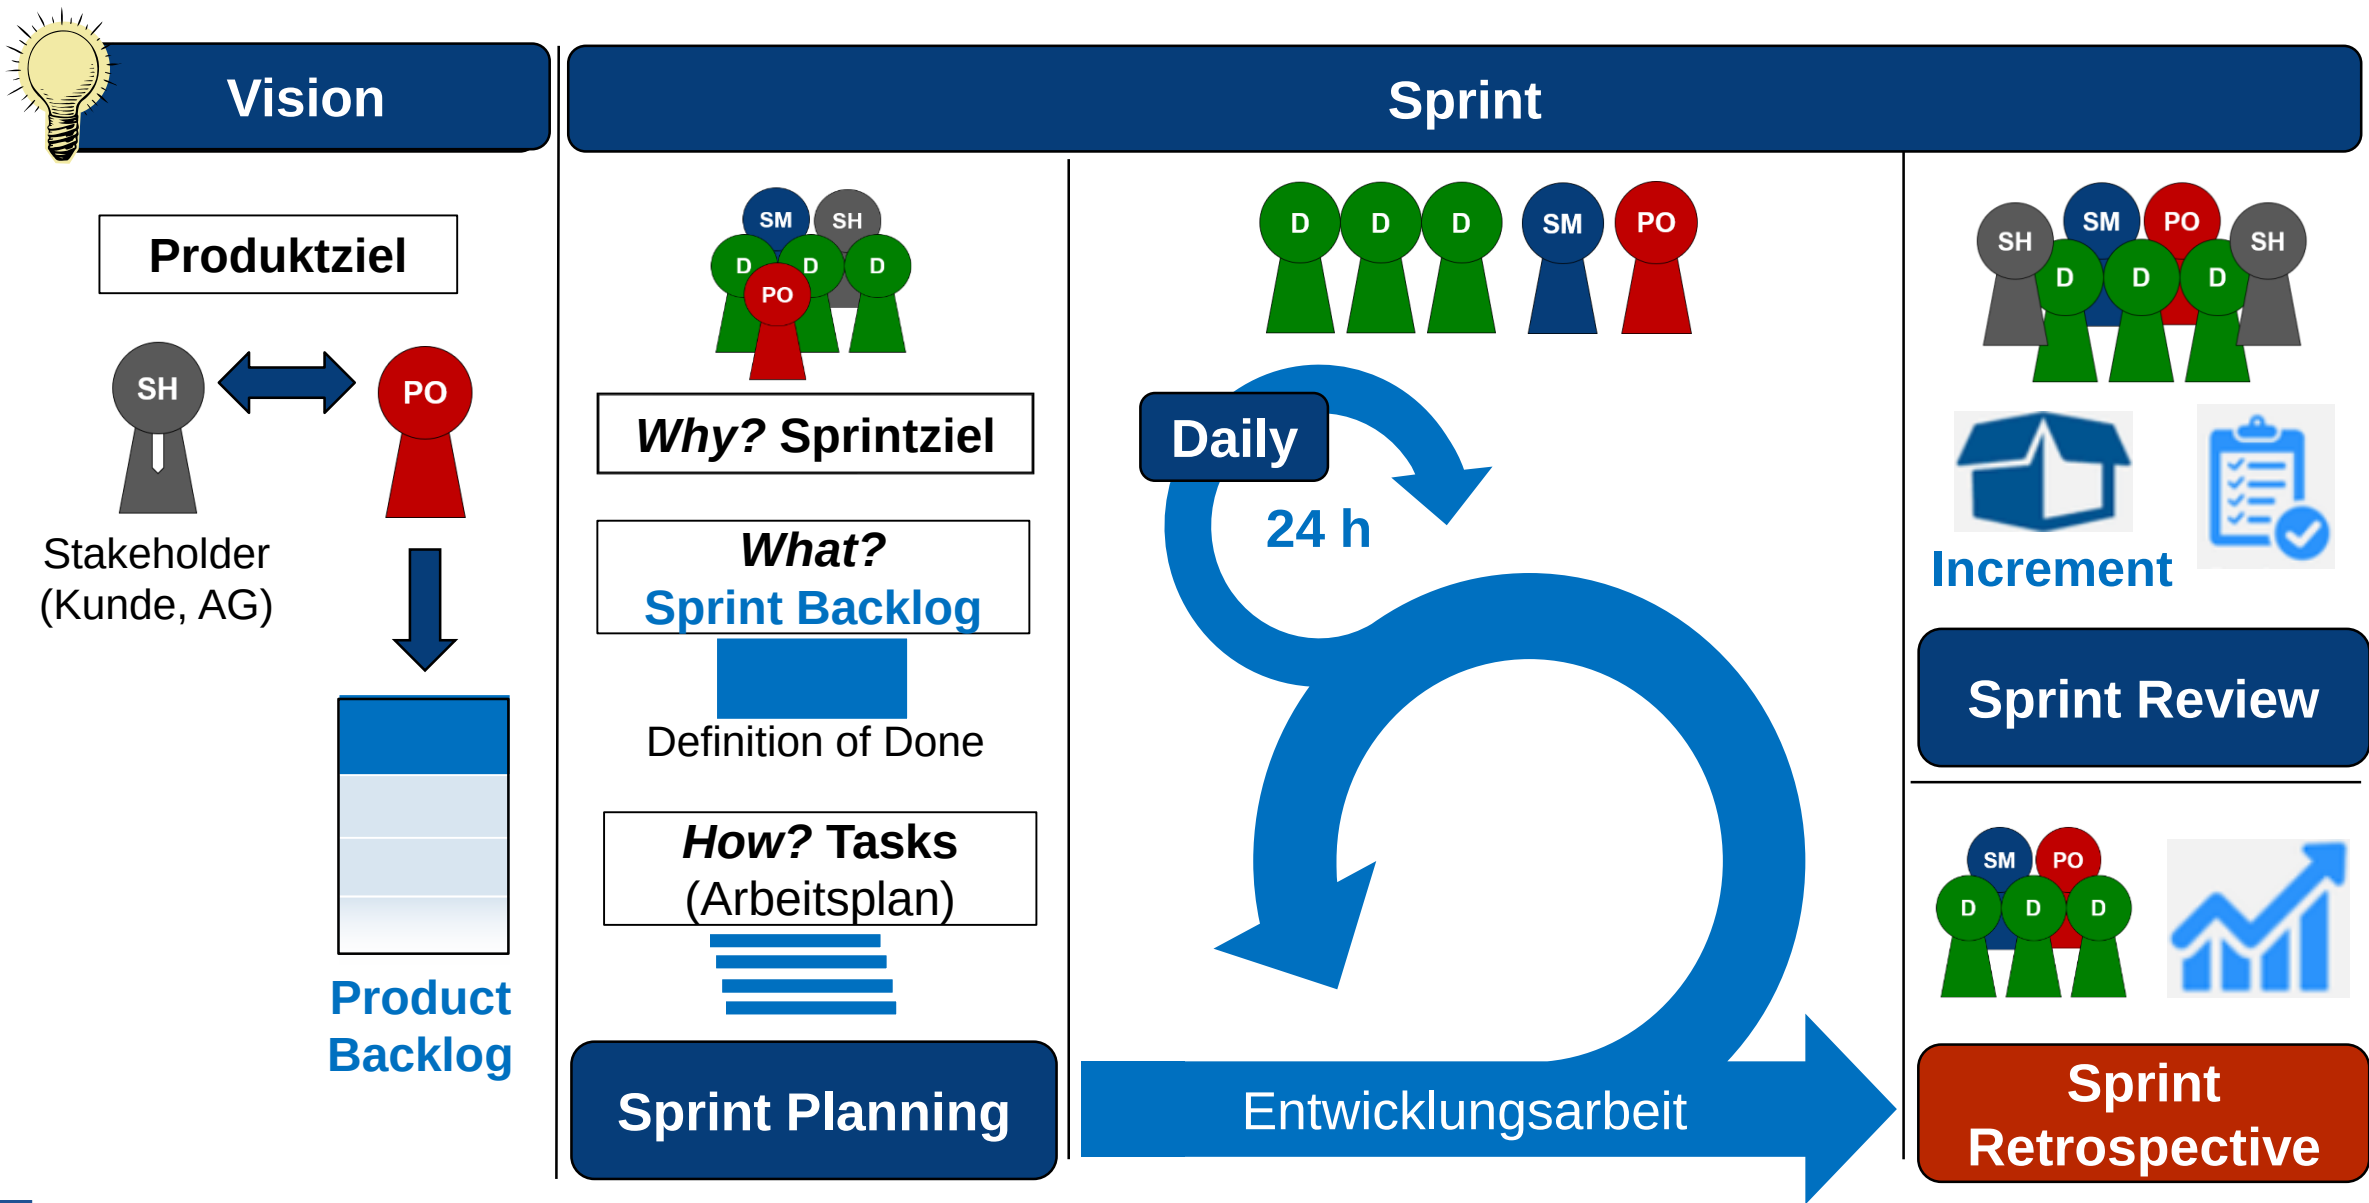

Sprint Retrospective: Wege zur Steigerung von Qualität und Effektivität planen

► Rückblick

- Scrum Team untersucht, wie der letzte Sprint in Bezug auf Personen, Interaktionen, Prozesse, Werkzeuge und seine DoD verlief
- Falsche Annahmen werden identifiziert und analysiert
- Scrum Team bespricht, was während des Sprints gut gelaufen ist, auf welche Probleme es gestoßen ist und wie diese Probleme gelöst wurden (oder auch nicht).

► Ausblick


- Scrum-Team identifiziert die hilfreichsten Änderungen, um seine Effektivität zu verbessern
- Die wirkungsvollsten Verbesserungen werden so schnell wie möglich in Angriff genommen. Sie können sogar in das Sprint Backlog für den nächsten Sprint aufgenommen werden.

► Timebox: 3 h für 1-monatigen Sprint; bei kürzeren Sprints in der Regel kürzer

► Teilnehmer: Scrum Team



Die Sprint Retrospektive schließt den Sprint ab

Was hat gut funktioniert?	Was hat nicht funktioniert?	Aktionen
		

1. Jeder benennt 1-2 Punkte, die gut gelaufen sind
2. Jeder benennt 1-2 Punkte, die er für verbesserungswürdig hält
3. Besprechung dieser Punkte im Team – mit Clusterbildung und Priorisierung
4. Verbesserungsvorschläge für die in der 2. Spalte genannten und priorisierten Punkte finden und diese in die Aktionen-Spalte aufnehmen
5. Entscheidung treffen, welche besonders wichtigen Verbesserungsvorschläge – mindestens einer! – im nächsten Sprint umgesetzt werden sollen

Weitere Formate für Retrospektiven

W

- ▶ Wie führt man spannende Retrospektiven durch? → Verschiedene Formate verwenden!
- ▶ Retromat: weit über 100 verschiedene Formate für Retrospektiven
<https://retromat.org/blog/best-retrospective-for-beginners/>
<https://agilescrumgroup.de/retrospektive-formen-mit-beispielen-und-ideen/>
- ▶ Beispiele
Start – Stop – Continue

Start: Was soll künftig neu gemacht werden?

Stop: Was soll künftig unterlassen werden?

Continue: Was soll künftig fortgesetzt werden?

More of: Was soll verstärkt werden?

Less of: Was soll reduziert werden?

Ich mochte – Ich wünsche mir



Template „Sprint Retrospektive“ auf Conceptboard

QUICK RETROSPECTIVE		TEAM:	DATE:
What was good?  	What was bad?		
Ideas	Actions		

Beispiel

QUICK RETROSPECTIVE		TEAM: #5 - Mach mit!	DATE: 30.05.2022
What was good? - Trello Board zur Organisation - Kommunikation und Abstimmung - Mehr Meetings in Kleingruppen - Fokus auf wichtigste User Storys	What was bad? - Einschätzung Arbeitsaufwand - Keine Testmöglichkeiten in Umgebung - Einteilung von irrelevanten User Tasks für MVP		
Ideas - Erstellung eines Click-Dummys (z.B. über Figma) - User Tests durchführen - Interviews über Anforderungen an die Website mit User:innen verschiedener Altersgruppen durchführen	Actions - Zugänge zum Testen bereitstellen lassen - Unterstützung bei Umsetzung eines Clickdummys einholen		

Workshop: Sprint Retrospektive


Führen Sie eine Sprint Retrospektive für den 2. Sprint durch!

1. Besprechung der persönlichen Favoriten aus den MVP-Vorstellungen → Priorisierung
 - **Ergebnis**: mindestens ein Element aus den anderen MVP-Präsentationen übernehmen
2. **Auswahl eines Formats** für die Durchführung der Sprint Retrospektive
3. Sammlung von Punkten (+ -) zum vorangegangenen Sprint und von neuen Ideen
4. Bewertung durchführen
5. **Entscheidung** treffen, welche besonders wichtigen Verbesserungsvorschläge im nächsten Sprint umgesetzt werden sollen
 - **Ergebnis**: mindestens ein **Verbesserungsvorschlag** (max. 2) für den nächsten Sprint
6. **DoD** für den nächsten Sprint erstellen (DoD ist unabhängig von den im Sprint zu erledigenden US)

Dauer: 15 Minuten


LEAN START-UP: PIVOTING

On the way to the business model

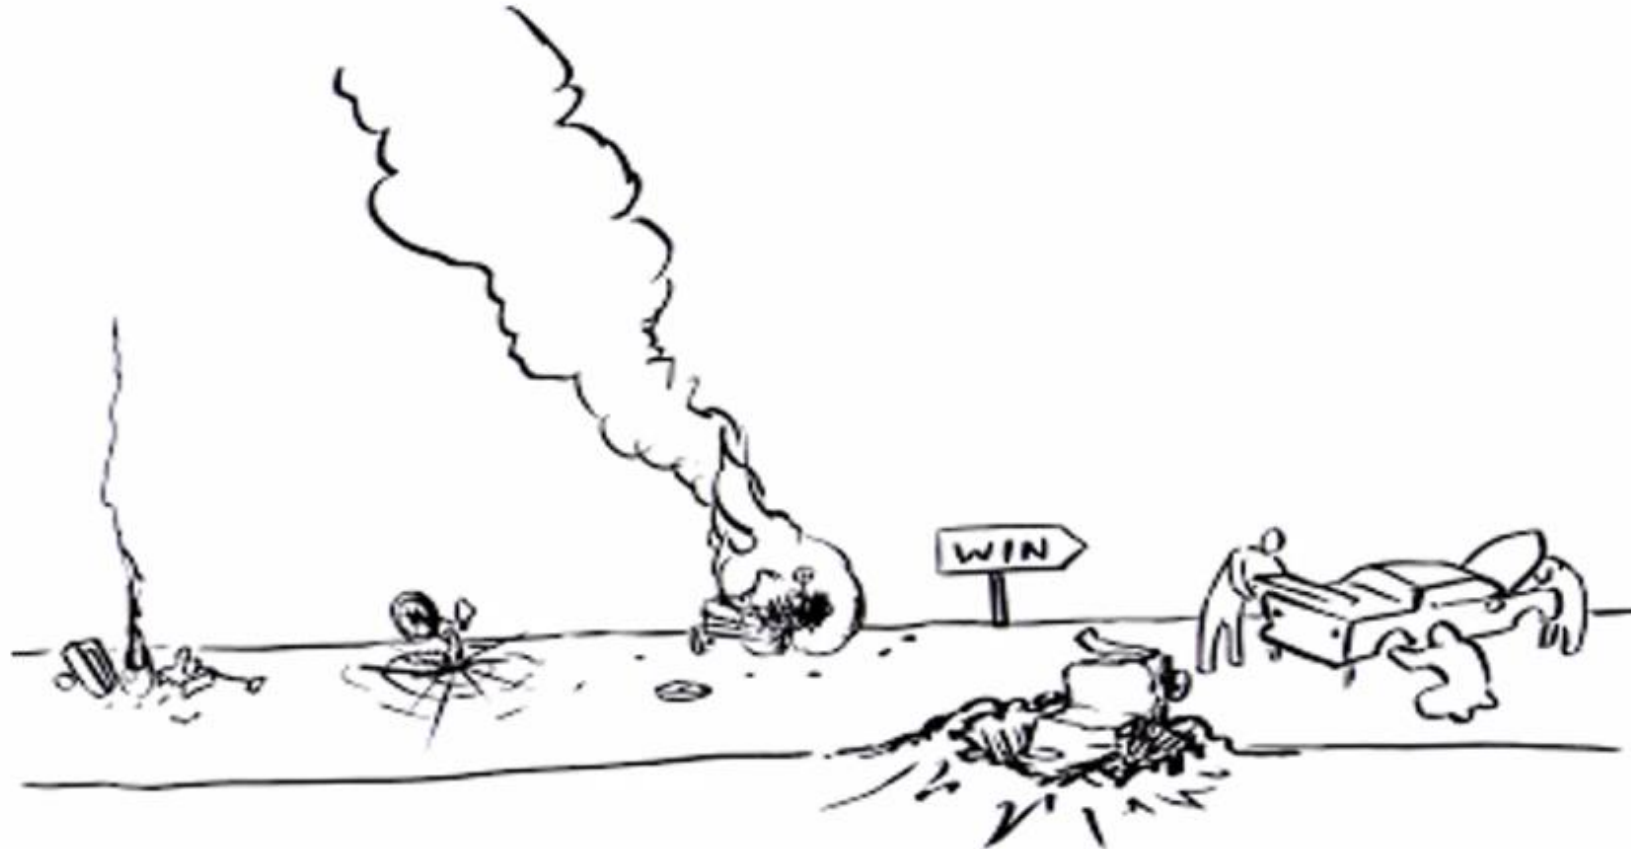

THIS HOW STARTUP ROLL.

Lean Startup Cycle: Build – Measure – Learn

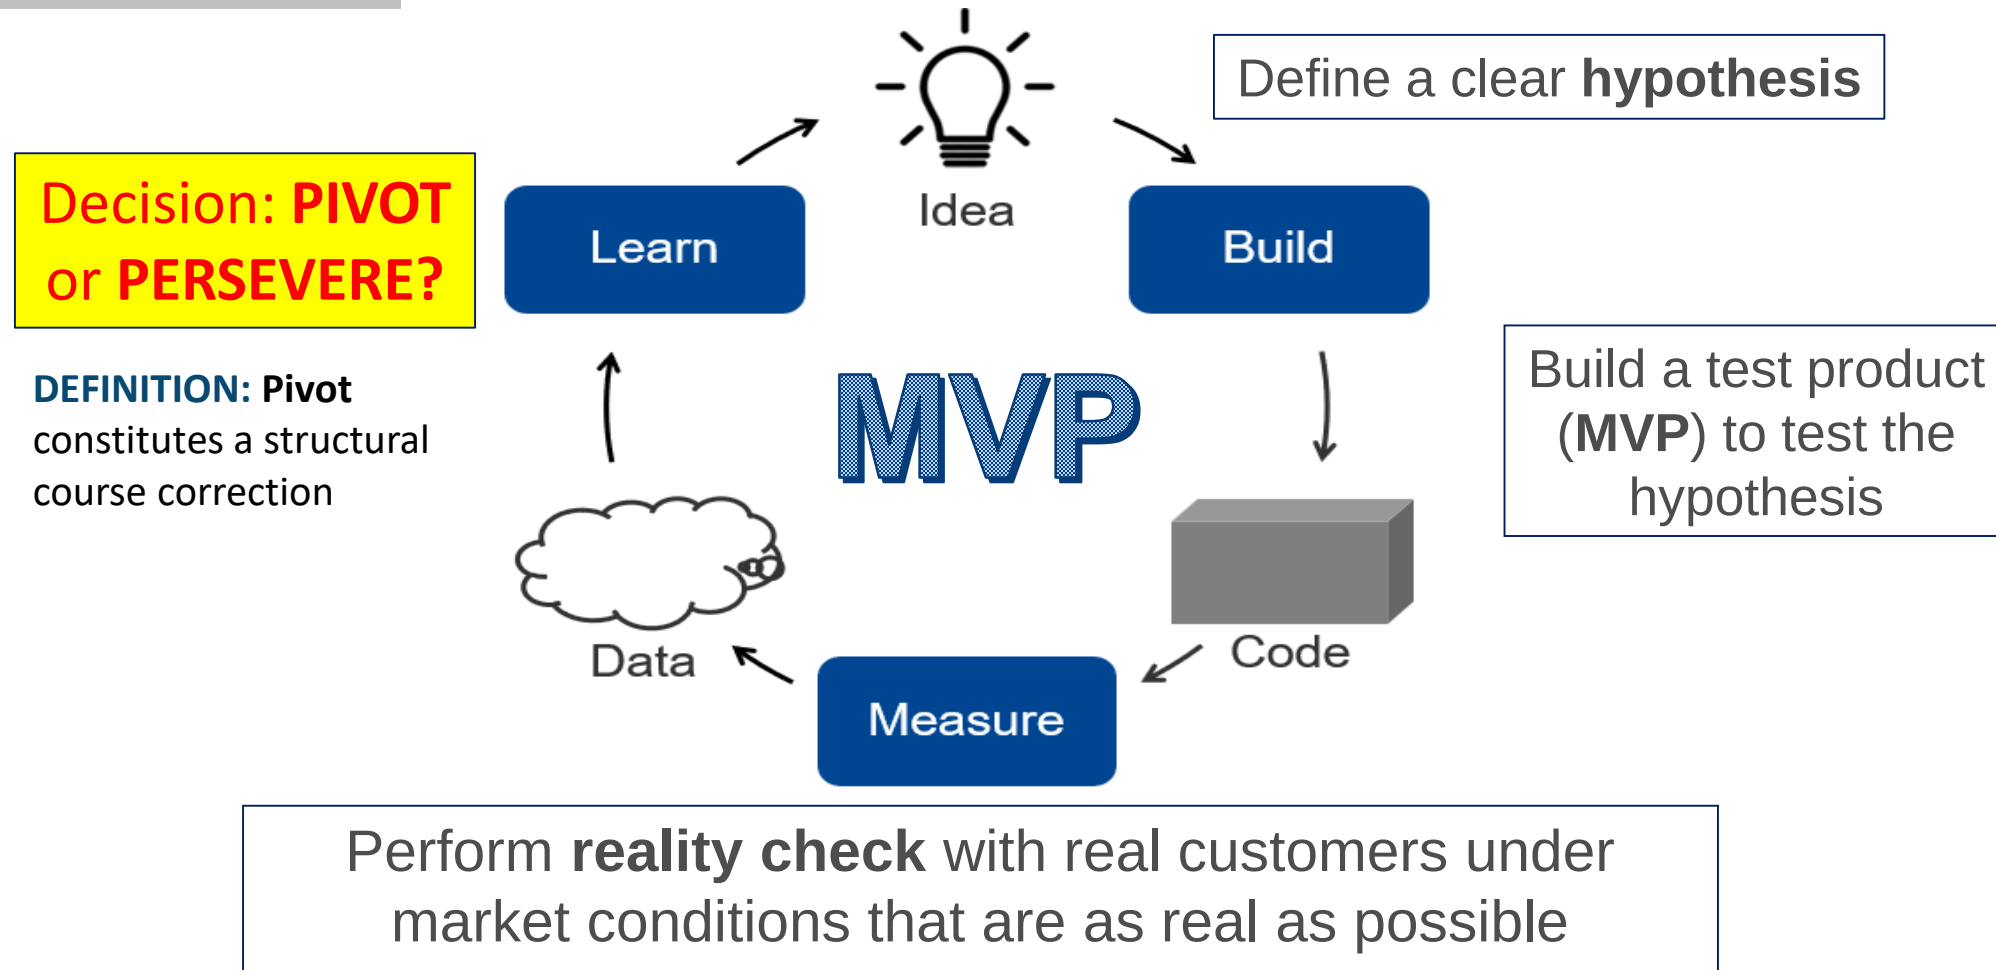

Minimize TOTAL time through the loop!

Pivot or Persevere?

- In case parts of the assumptions are wrong, we change the Business Model fundamentally (before the capital runs low): **Pivot**
- Pivot is a special kind of **structured change** designed to test a new fundamental hypothesis.
- Pivots require courage
- Recommendations
 - Don't give up too quickly
 - But don't try to ride a dead horse either. Listen to customer feedback!
 - And adding more services to the wrong idea is not the answer.

Catalog of Pivots

Zoom-in pivot – A single feature of the initial product becomes the whole product

Zoom-out pivot – The whole product becomes a single feature of an expanded product or service

Platform pivot – A change from offering an application towards a platform or vice versa

Customer Segment Pivot – The product remains the same but is now targeted to a different customer group

Customer Need Pivot – Experimentation revealed that a different need is to be solved potentially requiring a completely new product and strategy

Business Architecture Pivot – A change of architecture, for example from complex system mode targeting B2B towards a mass market on a volume operations model

Value Capture Pivot – Change of monetization or revenue model, which can have far reaching on the business, product and strategy

Engine of growth pivot – Switch from one growth engine to another (viral, sticky and paid growth)

Channel pivot – Delivering the same solution more effectively through a different sales channel

Technology pivot – Delivering the same solution with the use of a different technology

Example



- **MVP:** The founders worked first on a **Flash-based online game** called Glitch for nearly four years
- **Learning:** They should focus on another product than Glitch to solve their own communication problems (they collaborated over long distances and long periods of time)
- **Pivot:** The solution should solve their own and other company's communication problem



Examples

■ Zoom-in Pivot

- MVP: An image-saving tool for the online Game Neverending
- Pivot: The creators focused only on the photo gallery function.

■ Platform pivot

- MVP: Send workouts via email sheet
- Pivot: Change platform and build a mobile application

VORBEREITUNGEN FÜR SPRINT 3 (MIT SCRUMBAN)

- ▶ Nützliches Artefakt – nicht im Scrum Guide
- ▶ **Impediment Backlog:**
Dynamische Liste der Hindernisse, die die Entwickler bei der Bearbeitung behindern und die von diesen nicht selbst aus dem Weg geräumt werden können

- ▶ **Beispiel**

Impediment	Ersteller	Datum	Priorität	Status	Verantwortlicher
Backlog-Pflege unvollständig	CZ	04.04.2026	hoch	erledigt	Product Owner
Neue Hardware (Lautsprecher) benötigt	JF	08.04.2026	hoch	In Arbeit	SM
Fehlender Installer behindert User-Tests	AM	06.05.2026	schwach	Neu	SM

- ▶ **Verantwortung des Scrum Masters:** Dokumentation und Beseitigung der Impediments

Velocity (Entwicklungsgeschwindigkeit)

- ▶ Velocity eines Sprints = Anzahl der Story Points der abgenommenen User Stories des Sprints
- ▶ Dynamischer Wert, der von Sprint zu Sprint variieren kann;
Bei neuen Projekten und neuen Teams ist die Velocity schwierig einzuschätzen
- ▶ Nutzen der Velocity:



1. Planung des nächsten Sprints

- Beim Sprint Planning gibt die Velocity eine Orientierung für die Gesamtzahl der Story Points der für den Sprint ausgewählten User Stories
- Beispiel
 - Bisherige durchschnittliche Velocity beträgt 50 Story Points pro Sprint
 - Im Rahmen des Sprint Plannings werden User Stories ausgewählt, die einen Gesamtumfang von ca. 50+ Story Points haben

2. Schätzung der Projektdauer

- Prognose, wie schnell der Product Backlog (BP) vom Team abgearbeitet wird
 - Anzahl notwendiger Sprints = $(\text{Summe der Story Points des PB}) / (\text{Velocity})$ – aufgerundet*
 - Beispiel
 - Velocity 60 SP; Product Backlog: 195 SP
→ Anzahl Sprints = 4
 - Bei einer Sprintlänge von 2 Wochen beträgt die Projektdauer 8 Wochen
- *) Scrum-Guide kennt nur Sprints gleicher Länge, auch der letzte Sprint zählt voll dazu!

Hinweis: Die Velocity ist kein Maß, um die Produktivität von Teams zu vergleichen!

Aktualisierung des Product Backlog

- ▶ **Der Product Owner stellt sicher, dass das Product Backlog aktuell ist**
 - Neue Anforderungen sind berücksichtigt, z.B. Feedback vom Kunden
 - Nicht mehr relevante Einträge sind entfernt
 - Prioritäten im Backlog sind überprüft: Die wichtigsten Anforderungen stehen an oberster Stelle
 - Die Akzeptanzkriterien (spezifische Anforderungen, die erfüllt sein müssen, damit eine User Story als abgeschlossen betrachtet werden kann) der User Stories sind definiert
 - Die Größenordnung Product-Backlog-Einträge (BPI)* ist in Story Points geschätzt
Developer sind für die Größenbestimmung verantwortlich
- ▶ **Refinement des Product Backlogs**
 - Zu große Product-Backlog-Einträge (BPI) werden in kleinere, präzisere Elemente zerlegt
Für einen Sprint können nur solche BPIs ausgewählt werden,
die innerhalb des Sprints abgeschlossen (Done) werden können

*) Zur Erinnerung: User Stories sind spezifische Product-Backlog-Einträge (BPI). Andere PBIs können technische Aufgaben, Bugfixes oder andere Arten von Aufgaben umfassen, die für die Entwicklung des Produkts erforderlich sind.

Workshop: Voraussetzungen für Sprint 3 schaffen

Jedes Team

- a) identifiziert ein besonders wichtiges **Impediment** (Hindernis) des 1. und 2. Sprints
- b) aktualisiert seinen **Product Backlog**

Dauer: 10 Minuten

Chat Storm: Product Owner schreiben die Ergebnisse von a) in den Chat:

Team #: < größtes Impediment des 1. oder 2. Sprints oder größtes aktuelles Impediment


ERGEBNISSE

- Abhängigkeiten der Unterteams voneinander / parallele Prozesse selten möglich
- Nicht Einhaltung von zeitlichem Rahmen bei Meetings
- OCR progress bar stalls at ~40% on scanned PDFs (S1)
- Zugriffe auf MAC studio muss noch für alle anderen Entwickler eingerichtet werden
- Wenig Zeit durch Uni/Arbeit
- Wenig Zeit durch Uni / Klausuren

Beim Dozenten melden, falls es noch offene kritische Impediments gibt


SPRINT PLANNING 3

Sprints folgen direkt hintereinander

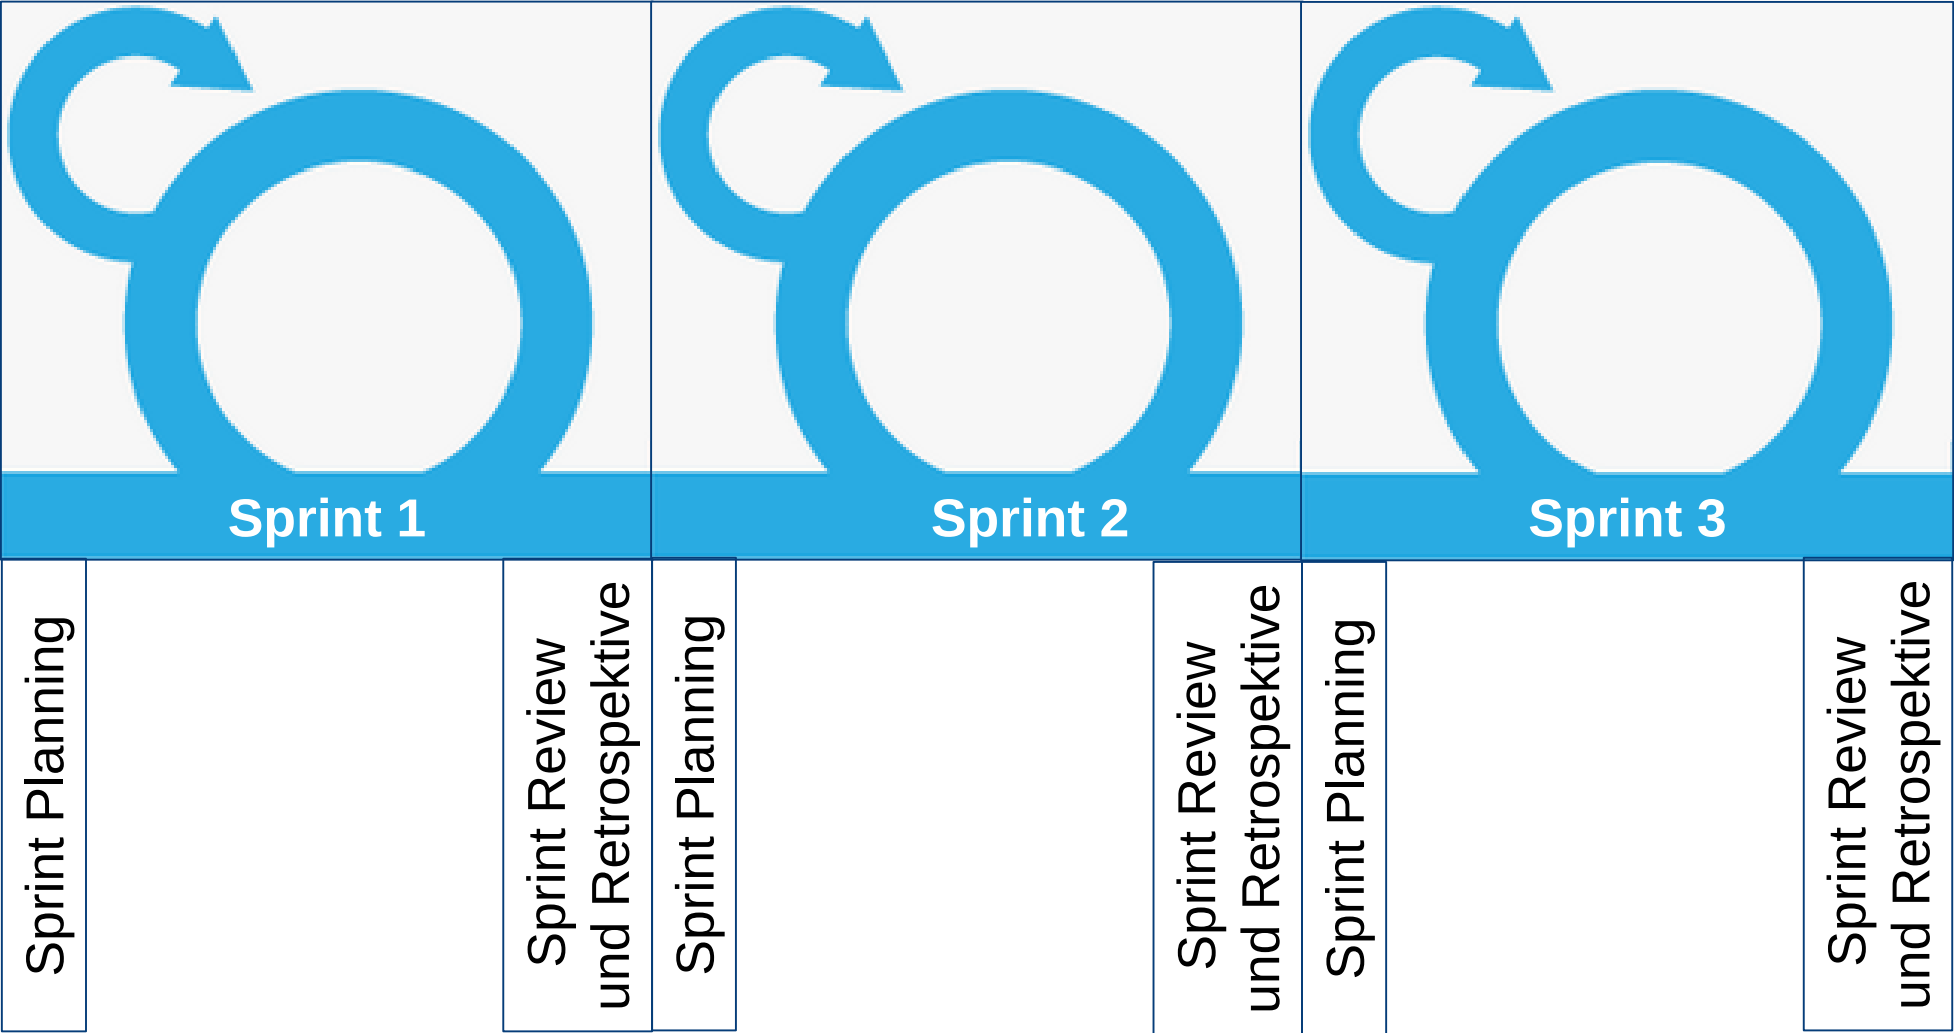

1. Warum ist dieser Sprint für die Stakeholder wertvoll?

- Product Owner macht einen Vorschlag
- Scrum Team erarbeitet ein **Sprintziel**



2. Was kann in diesem Sprint abgeschlossen werden?

- Aus dem Product Backlog wählen die Developer mit dem PO hochpriorisierte Einträge (PBI) aus, die in den aktuellen Sprint aufgenommen werden sollen
- Das Scrum Team kann diese Einträge verfeinern, um das Verständnis zu erhöhen

3. Wie wird die ausgewählte Arbeit erledigt?

- Zu jedem ausgewählten BPI planen die Developer die notwendige Arbeit, um ein Increment zu erstellen
 - Die Product Backlog-Einträge werden in **Developer-Tasks** von max. 1 Tag zerlegt
- ▶ **Das Sprint-Backlog** besteht aus Sprintziel, ausgewählten Product Backlog-Einträgen und dem Umsetzungsplan – visualisiert durch Task oder Kanban Board
 - ▶ **Timebox:** 8 h für 1-monatigen Sprint; bei kürzeren Sprints in der Regel kürzer
 - ▶ **Teilnehmer:** Scrum Team, ggf. weitere Personen

Sprint Planning 3

Vorbereitungen


- **Feedback** des Auftraggebers – möglichst auch von Anwendern – zum MVP einholen und damit **Product Backlog aktualisieren**
- **Komplexität** der BPI in **Story Points** schätzen, ggf. zu große US verfeinern
- **Priorität** der BPI nach dem **MuSCoW Prinzip** festlegen
- **Akzeptanzkriterien** für die User Stories des 2. Sprints festlegen – sofern noch nicht geschehen

Sprint Planning 3

1. **Sprintziel 3** festlegen
2. **Sprint Backlog erstellen:** Auswahl der User Stories zur Erreichung des Sprintziels (Velocity des 1. und 2. Sprints berücksichtigen)
3. **Entwickler-Tasks** zur Erledigung der User Stories des 3. Sprints ermitteln und **Kanban Bord** anlegen
4. **WiP-Limit** festlegen

SPRINTZIEL Hier wird das Ziel des Sprints festgelegt. Es sollte ein klares, messbares Ziel sein, das die Teammitglieder motiviert und den Fokus des Sprints definiert.	PRODUKTNAME Hier wird der Name des Produkts eingetragen.
HERANGEHENSWEISE Hier wird die Vorgehensweise für den Sprint beschrieben. Es sollte die Rollen der Teammitglieder und die Art der Zusammenarbeit festgelegt werden.	SPRINT Hier wird der Name des Sprints eingetragen.
ÜBERPRÜFUNG Hier wird die Überprüfung des Sprintziels und der Fortschritte des Sprints festgelegt. Es sollte die Zeitpunkte und die Verantwortlichen für die Überprüfung festgelegt werden.	

Beispiel: Kanban Board und WiP-Limit

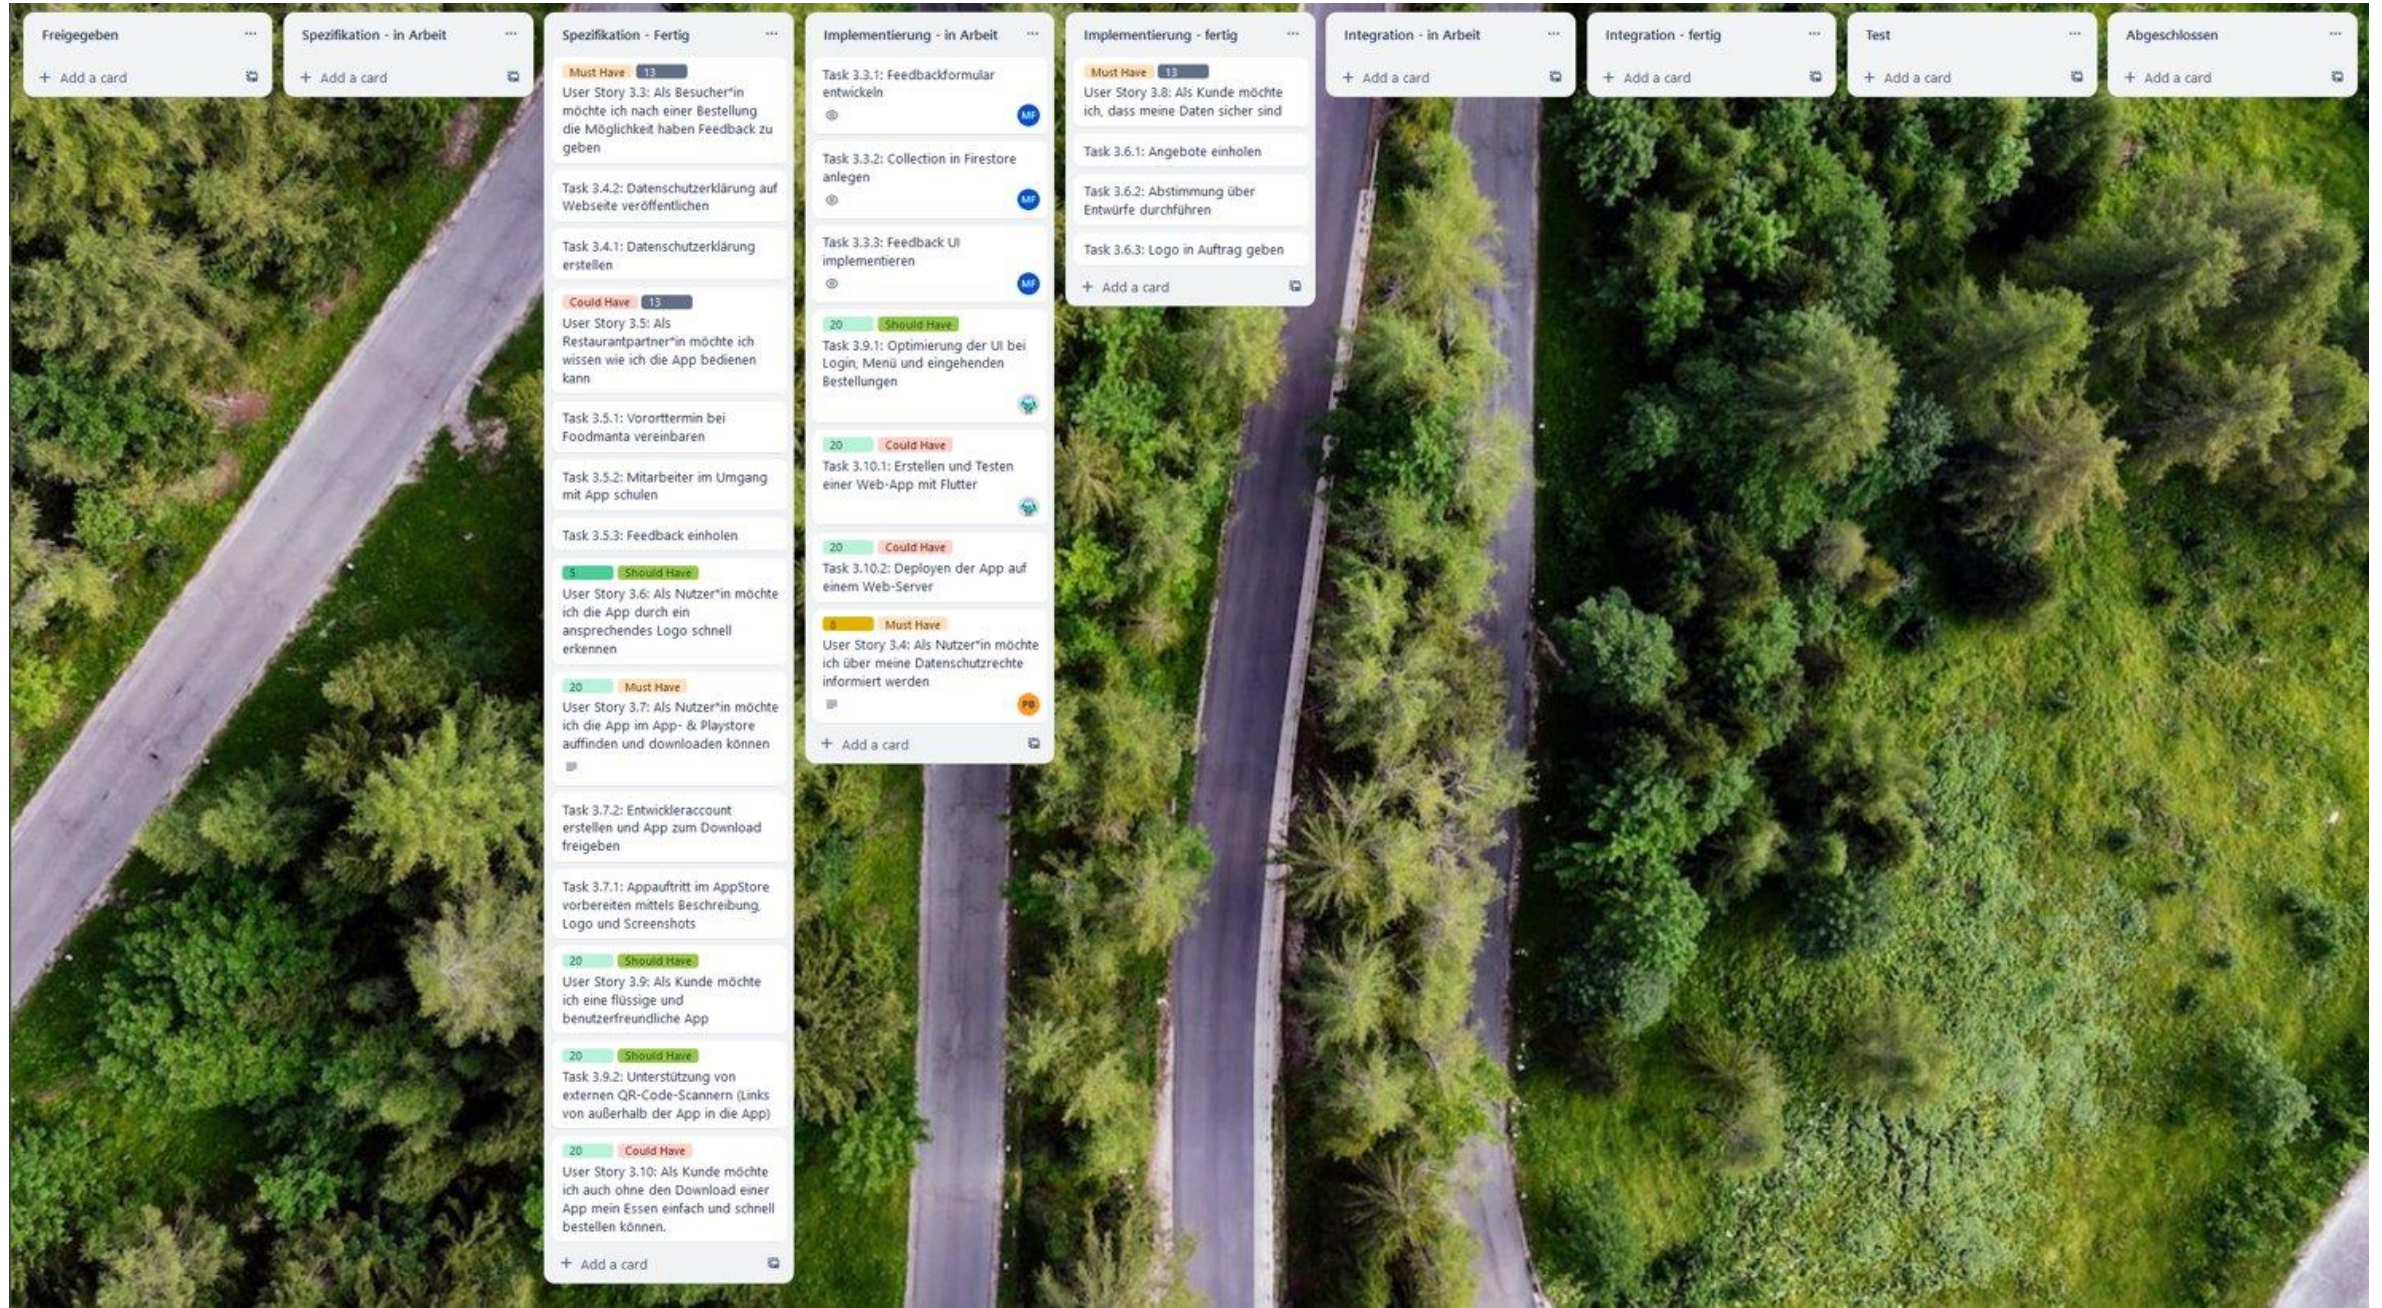

Chat Storm: Formulieren Sie ein Sprintziel für den 3. Sprint

Sprintziel: Produkt-Inkrement

Beispiele: neue Funktionalität(en), Forum, Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA), Video-Konferenzfunktion, Kalender- und Terminplanungsfunktion, weitere Benutzergruppe

ERGEBNISSE

- Feature-Completeness
- Tracking von Nutzerverhalten für Statistik
- Client <-> Proxy <-> KI Modell fertig aufgesetzt. App User können mit Ki Kommunizieren ohne API Key. Umfragen ausführen
- Ablauf umsetzbar mit echten Gegebenheiten
- Verbesserung durch Einbindung von Feedback von Nutzer*innen
- Fertiger MVP mit kompletter UI und funktionierender KI Anbindung welche gleichzeitig für Gutachter nützliche Ergebnisse liefert
- minimal veröffentlichbare Seite für echte Kunden
- Make all choices fully understandable and intuitive for end users. Add more explanation texts, accurate cost estimation, better images. Add functionality to save plans and send plans to funeral home
- externes testing
- eindeutige Struktur der Befunde
- neue Funktion: in Audiobeitrag vor/zurück spulen
- Langzeit-Usertest
- Langzeit-Test mit Profi-Athlet*innen
- Add mobile capture and ship GDPR-compliant

Workshop: Sprintziel 3

Schreiben Sie Ihr **Sprintziel** in das Template und ergänzen Sie die anderen Felder

- ▶ **Produktname:** = Ihr Projektname
- ▶ **Sprint:** Sprint 3 vom 15.06. – 13.07.2026
- ▶ **Herangehensweise** ...
- ▶ **Überprüfung** ...

Dauer: 10 Minuten

SPRINTZIEL Warum führen wir diesen Sprint durch? - z.B. Auslieferung eines Features, Optimierung, Adressierung eines Risikos, Validierung einer Annahme	 PRODUKTNAME Wie heißt das Produkt? 
	SPRINT Sprintname oder Nummer des Sprints, ggfs. Von/Bis-Datum 
HERANGEHENSWEISE Wie wollen wir das Sprintziel erreichen? Welche Artefakte werden erstellt? z.B. Click-Dummy, Produkt-Inkrement, Usability-Test, A/B-Test, User-Test (interne Stakeholder, Testkunden), etc. 	ÜBERPRÜFUNG Wie überprüfen wir, ob wir das Sprintziel erreicht haben? z.B. Performance-Messungen, 3 von 5 Test-Usern haben den Workflow komplett durchlaufen, etc. 

Beispiel

SPRINTZIEL Warum führen wir diesen Sprint durch? - z.B. Auslieferung eines Features, Optimierung, Adressierung eines Risikos, Validierung einer Annahme		PRODUKTNAME Wie heißt das Produkt? Sozialomat	
Korrekte Beantwortung eines vorgegebenen Fragenkatalogs durch den Chatbot		SPRINT Sprintname oder Nummer des Sprints, ggfs. Von/Bis-Datum	
		29.05.2024 - 16.05.2024	
HERANGEHENSWEISE Wie wollen wir das Sprintziel erreichen? Welche Artefakte werden erstellt? z.B. Click-Dummy, Produkt-Inkrement, Usability-Test, A/B-Test, User-Test (interne Stakeholder, Testkunden), etc.		ÜBERPRÜFUNG Wie überprüfen wir, ob wir das Sprintziel erreicht haben? z.B. Performance-Messungen, 3 von 5 Test-Usern haben den Workflow komplett durchlaufen, etc.	
- Erstellung eines Fragenkatalogs mit korrekten Antworten - Einpfelegen der Informationen in die Wissensbasis des Bots - Trainieren des Chatbots - Validierung der Eingaben		Die Fragen werden dem Chatbot gestellt und es wird manuell überprüft, ob diese richtig beantwortet werden.	

© 2018, Lutz Müller, aus dem Buch „Scrum erfolgreich anwenden“, <https://www.scrum-erfolgreich-anwenden.de>

Sprint Backlog und geplante Velocity

MUST HAVE	
User Story #4: Projektbeiträge verfassen und suchen	5
User Story #9: Barrierefreiheit	13
User Story #10: Hybride Veranstaltungen	5
User Story #11: FAQ Sektion	5
Geplante Minimale Velocity	28
SHOULD HAVE	
User Story #12: Feedback Kanal	13
User Story #14: Notification System mit Opt-In Option	20
	61

Sprint #2: Sprint Backlog nach MuSCow-Prinzip

User Story #4: Projektbeiträge verfassen und suchen Als <u>Bürger:in</u> möchte ich einfach Projektbeiträge finden und mit ihnen interagieren können, um mitentscheiden und diskutieren zu können.	5
User Story #9: Barrierefreiheit Als <u>Bürger:in</u> möchte ich barrierefrei auf die Webseite zugreifen können, um mich in jeder Situation einfach und unabhängig von Beeinträchtigungen über die Projekte informieren zu können.	13
User Story #10: Hybride Veranstaltungen Als <u>Bürger:in</u> möchte ich Versammlungen per Stream verfolgen, sowie online bei diesen mit diskutieren und abstimmen können, um auch von zu Hause an den Versammlungen vollumfänglich teilnehmen zu können.	5
User Story #11: FAQ Sektion Als <u>Bürger:in</u> möchte ich erklärt bekommen, wie ich die Webseite und die Diskussionsplattform nutzen kann, um mich beteiligen zu können und einfach auf der Webseite zurecht finden kann.	5
User Story #12: Feedback Kanal Als <u>Bürger:in</u> möchte ich meine Meinung zur Webseite und Umsetzung der digitalen Bürgerbeteiligung teilen, um stetig zur Verbesserung der Webseite beizutragen, damit Bürgerbeteiligung möglichst einfach im digitalen Raum geschehen kann.	13
User Story #14: Notification System mit Opt-In Option Als <u>Bürger:in</u> möchte ich ein <u>Notification</u> System mit <u>Opt-In</u> Option haben, um die Möglichkeit zu haben, für ausgewählte Projekte eine Benachrichtigung zu neuen Projektergebnissen zu erhalten.	20

User Tasks – Must Have

User Story #4: Projektbeiträge verfassen und suchen	User Story #9: Barrierefreiheit
User Story #4 Task #1 - User Surface   27. Jun.   1	User Story #9 Task #1 - Button für leichte Sprache  27. Jun.
User Story #4 Task #2 - Filter Möglichkeiten   27. Jun.   2	User Story #9 Task #2 - Erklärung von Optionen in leichter Sprache
User Story #4 Task #3 Maske für Diskussionsbeitrag  27. Jun. 	User Story #9 Task #3 - Vorlesefunktionoption einfügen
User Story #4 Task #4 Verlinkung von Projekt zu Diskussionsbeitrag   27. Jun.  1	User Story #9 Task #4 - (Bei Terminkalender auf Barrierefreiheit achten (Rahmenbedingungen, Karten, Zusammenfassung von Veranstaltungen))
- Verständliche und einfache Gestaltung - Filter: Ort, Projektart etc. - Fehlertoleranz bei der Suche	- Recherche nach Einbindung leichter Sprache - Einbindung Vorlesefunktion - Barrierefreiheit nicht nur bei Projektbeschreibungen ermöglichen, sondern auch im Termin-Kalender, FAQ etc.

AUFGABE 8

Aufgabe 8: Vorbereitungen

1. Prüfen Sie, ob Sie ein Element eines anderen Teams aus dem heutigen Sprint Review für Ihr Projekt adaptieren wollen
2. Führen Sie eine **Retrospektive** des 2. Sprints durch
Ergebnisse: Verbesserungsmaßnahme + DoD für 3. Sprint
3. Holen Sie **Feedback von Nutzern Ihres Produktes** ein und verwenden Sie dieses für Sprint 3
4. Aktualisieren Sie Ihren **Product Backlog** – in Vorbereitung auf Sprint Planning 2
5. Führen Sie **Sprint Planning 3** durch

Aufgabe 8: Retrospektive, Backlog-Aktualisierung, Sprint Planning 3

Erstellen Sie eine **Präsentation Sprint3-Team_x** mit folgenden Inhalten:

- 1. Ergebnisse Retrospektive des 2. Sprints** (incl. Verbesserungsvorschlag und DoD für Sprint 3)
- 2. Aktualisiertes Product Backlog** – in Vorbereitung auf Sprint Planning 3
 - User Stories des Product Backlog sind nach dem **MuSCoW Prinzip** priorisiert
 - Komplexität der User Stories des Product Backlog sind in **Story Points** geschätzt
- 3. Ergebnisse vom Sprint Planning 3**
 - Sprintziel 3 - mit Vorgehen und Überprüfung
 - Sprint Backlog: User Stories zur Erreichung des Sprintziels (Velocity von Sprint 1 und 2 berücksichtigen!)
 - Akzeptanzkriterien für alle User Stories des neuen Sprint Backlog – mindestens 2 AK pro US
 - **Kanban-Board für Sprint 3 mit WiP-Limit von 2 Tasks pro Teammitglied (zum Start)**
- 4. Reflexion der Prozesse und Ergebnisse**
- 5. Nächste Schritte**

Upload auf WueCampus bis 20.06.2026 / 23:55: **Sprint3-Team_x**

Präsentation am 22.06.2026 durch die aktuellen Product Owner von Team 3 und 4

Dauer: max. 8 Minuten
